




















标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	月16日	2020年3月23日							
	①							三	四	五	六	日	一	二	三	四
1	✓	🚀	启动	6 个工作日	2020年3月19日	2020年3月26日										
2	✓	🚀	任命项目经理	1 个工作日	2020年3月19日	2020年3月19日										
3	✓	🚀	组建核心团队	1 个工作日	2020年3月19日	2020年3月19日										
4	✓	🚀	制定里程碑计划	1 个工作日	2020年3月19日	2020年3月19日										
5	✓	🚀	分析干系人	1 个工作日	2020年3月20日	2020年3月20日										
6	✓	🚀	制定项目章程	1 个工作日	2020年3月22日	2020年3月22日	2, 3, 4, 5									
7	✓	🚀	项目启动大会	1 个工作日	2020年3月24日	2020年3月24日										
8	✓	🚀	规划	15 个工作日	2020年3月24日	2020年4月13日										
9	✓	🚀	规划范围	4 个工作日	2020年3月24日	2020年3月27日										
10	✓	🚀	制定需求说明书	1 个工作日	2020年3月24日	2020年3月24日	7									
11	✓	🚀	界面设计	1 个工作日	2020年3月25日	2020年3月25日										
12	✓	🚀	详细设计说明书	1 个工作日	2020年3月25日	2020年3月25日	10									
13	✓	🚀	范围说明书	1 个工作日	2020年3月25日	2020年3月25日	10									
14	✓	🚀	创建WBS	1 个工作日	2020年3月26日	2020年3月26日	11, 12, 13									
15	✓	🚀	形成范围基准	1 个工作日	2020年3月27日	2020年3月27日										
16	✓	🚀	规划时间	5 个工作日	2020年3月28日	2020年4月2日										
17	✓	🚀	排列工作包顺序	1 个工作日	2020年3月28日	2020年3月28日	15									
18	✓	🚀	估算资源	1 个工作日	2020年3月30日	2020年3月30日	17									
19	✓	🚀	估算持续时间	1 个工作日	2020年3月31日	2020年3月31日	18									
20	✓	🚀	制定进度计划	1 个工作日	2020年4月1日	2020年4月1日	19									
21	✓	🚀	形成进度基准	1 个工作日	2020年4月2日	2020年4月2日	20									
22	✓	🚀	规划成本	3 个工作日	2020年4月3日	2020年4月7日										
23	✓	🚀	项目成本估算	0 个工作日	2020年4月3日	2020年4月3日	21									
24	✓	🚀	项目预算	1 个工作日	2020年4月6日	2020年4月6日	23									
25	✓	🚀	形成范围基准	1 个工作日	2020年4月7日	2020年4月7日	24									
26	✓	🚀	规划质量	2 个工作日	2020年3月30日	2020年3月31日										
27	✓	🚀	制定测试计划	1 个工作日	2020年3月30日	2020年3月30日	15									
28	✓	🚀	制定测试用例	1 个工作日	2020年3月31日	2020年3月31日	27									
29	✓	🚀	规划人力资源	2 个工作日	2020年3月31日	2020年4月1日										
30	✓	🚀	制定人力资源计划	1 个工作日	2020年3月31日	2020年3月31日	18									
31	✓	🚀	制定人员配备管理计	1 个工作日	2020年4月1日	2020年4月1日	30									
32	✓	🚀	规划沟通	1 个工作日	2020年4月2日	2020年4月2日										
33	✓	🚀	制定沟通管理计划	1 个工作日	2020年4月2日	2020年4月2日	31									

项目：项目规划 日期：2020年4月8日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	月16日 三 四 五 六 日	2020年3月23日 一 二 三 四
67	✓		干系人沟通	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日	40	项目经理		
68	✓		团队建设	2 个工作日	2020年4月15日	2020年4月16日				
69	✓		培训	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日	40	UI专家, 测试员1, 测试		
70	✓		娱乐活动	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日	40	UI专家, 测试员1, 测试		
71	✓		沟通	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日	40	UI专家, 测试员1, 测试		
72	✓		项目验收	1 个工作日	2020年4月27日	2020年4月27日	41	UI专家, 产品经理, 测试		
73	✓		收尾	1 个工作日	2020年4月28日	2020年4月28日				
74	✓		项目终检	1 个工作日	2020年4月28日	2020年4月28日	72	UI专家, 产品经理, , 项		
75	✓		项目内部收尾	1 个工作日	2020年4月28日	2020年4月28日	72	UI专家, 测试员1, 产品		



项目：项目规划

日期：2020年4月8日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要
















非活动任务


非活动里程碑 


非活动摘要 


手动任务 


仅工期 


手动摘要总成 


手动摘要 


仅开始时间 


仅完成时间 


外部任务 


外部里程碑 







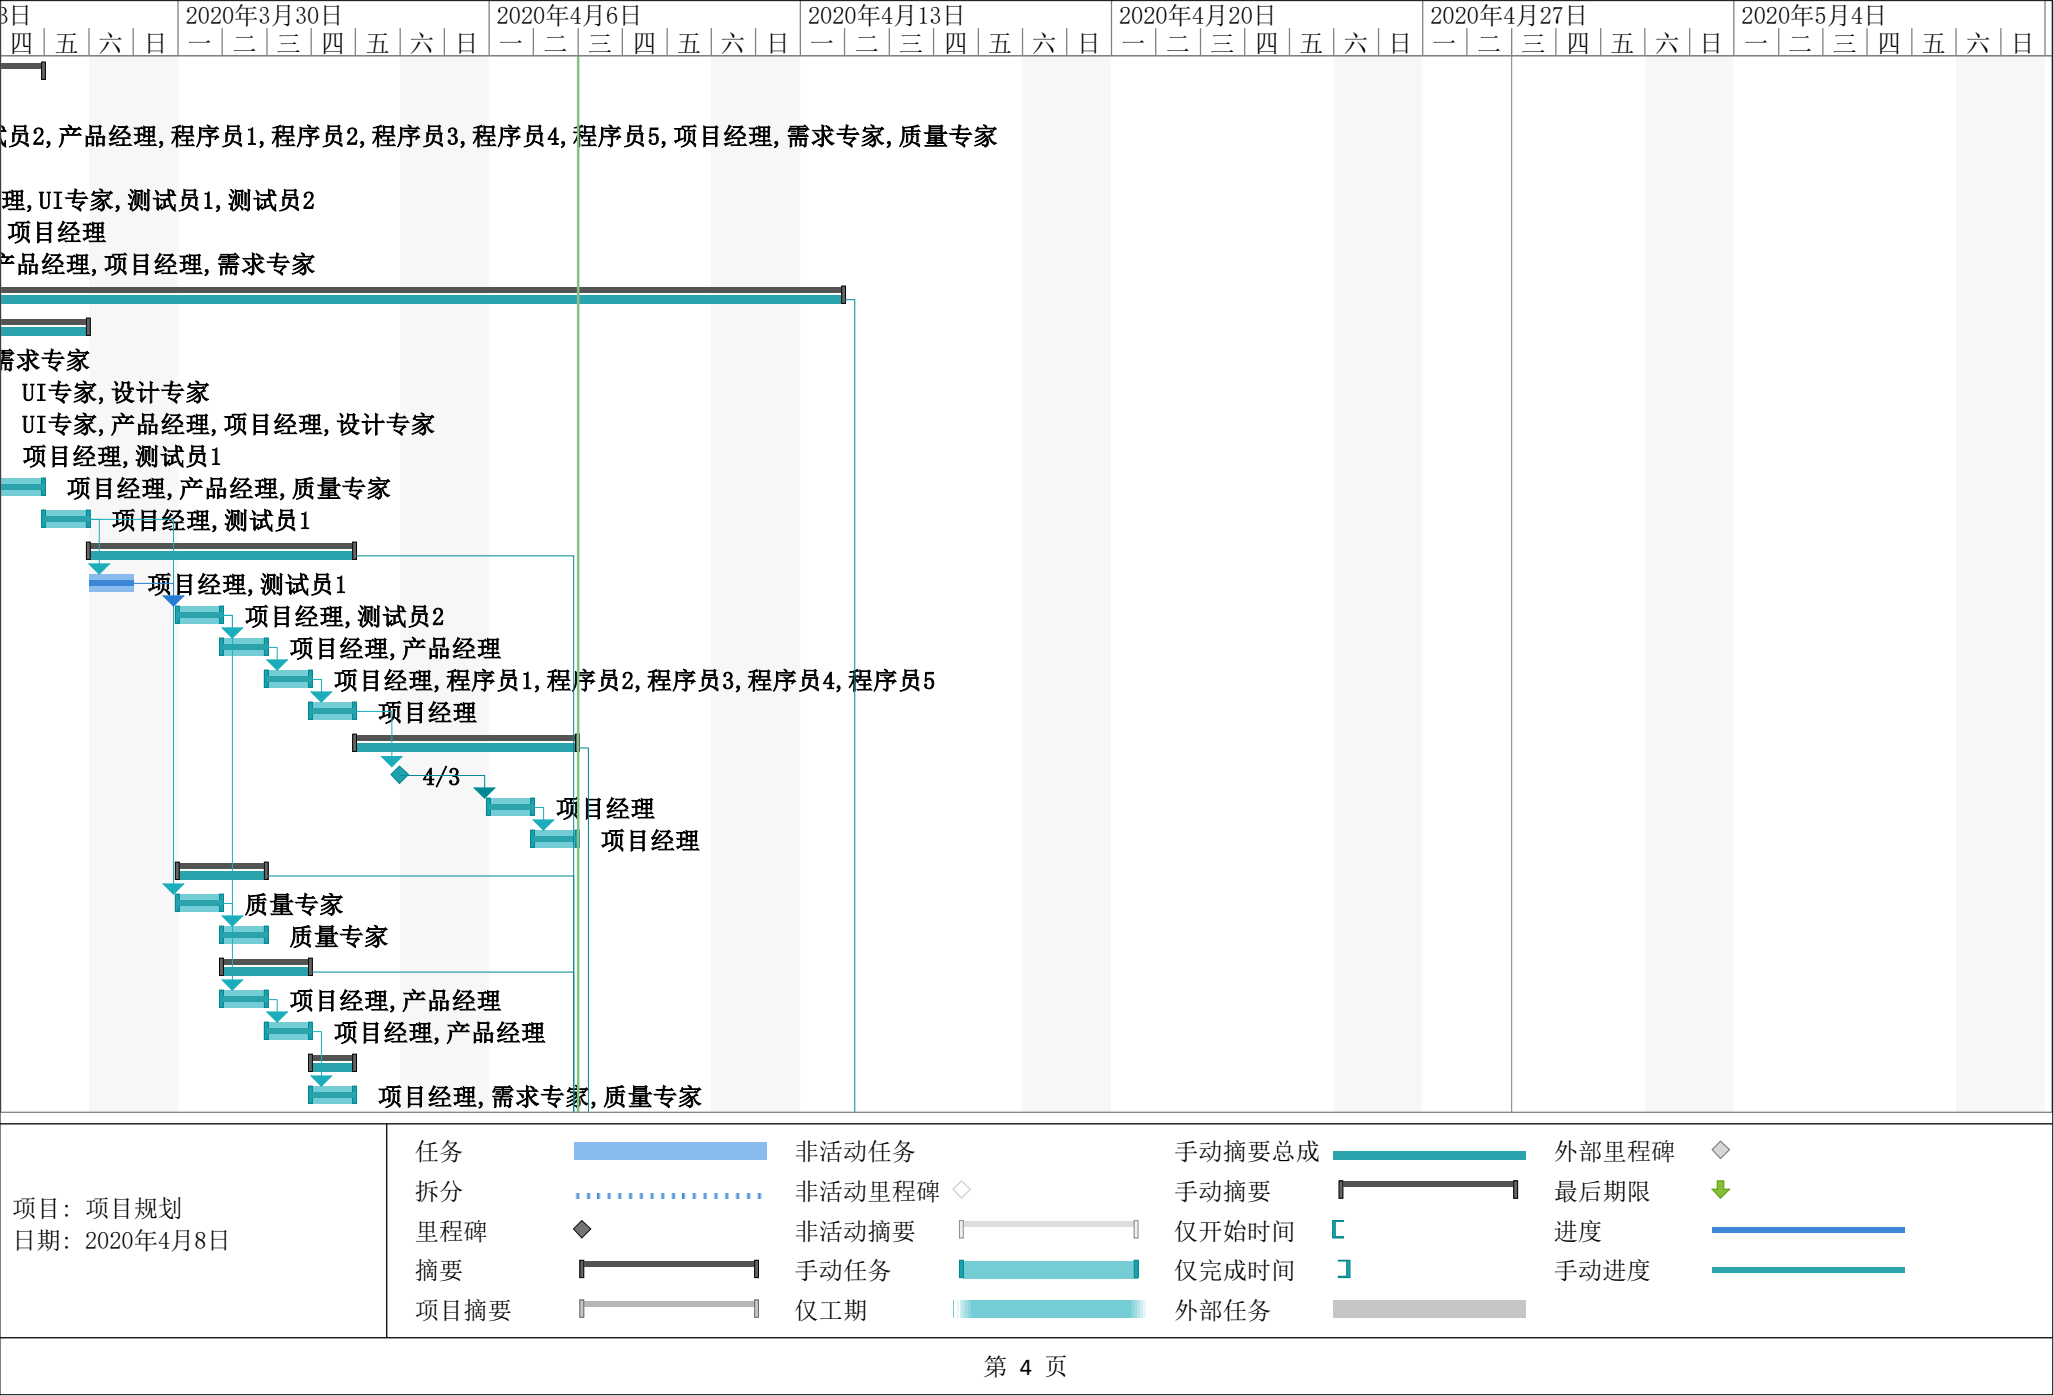

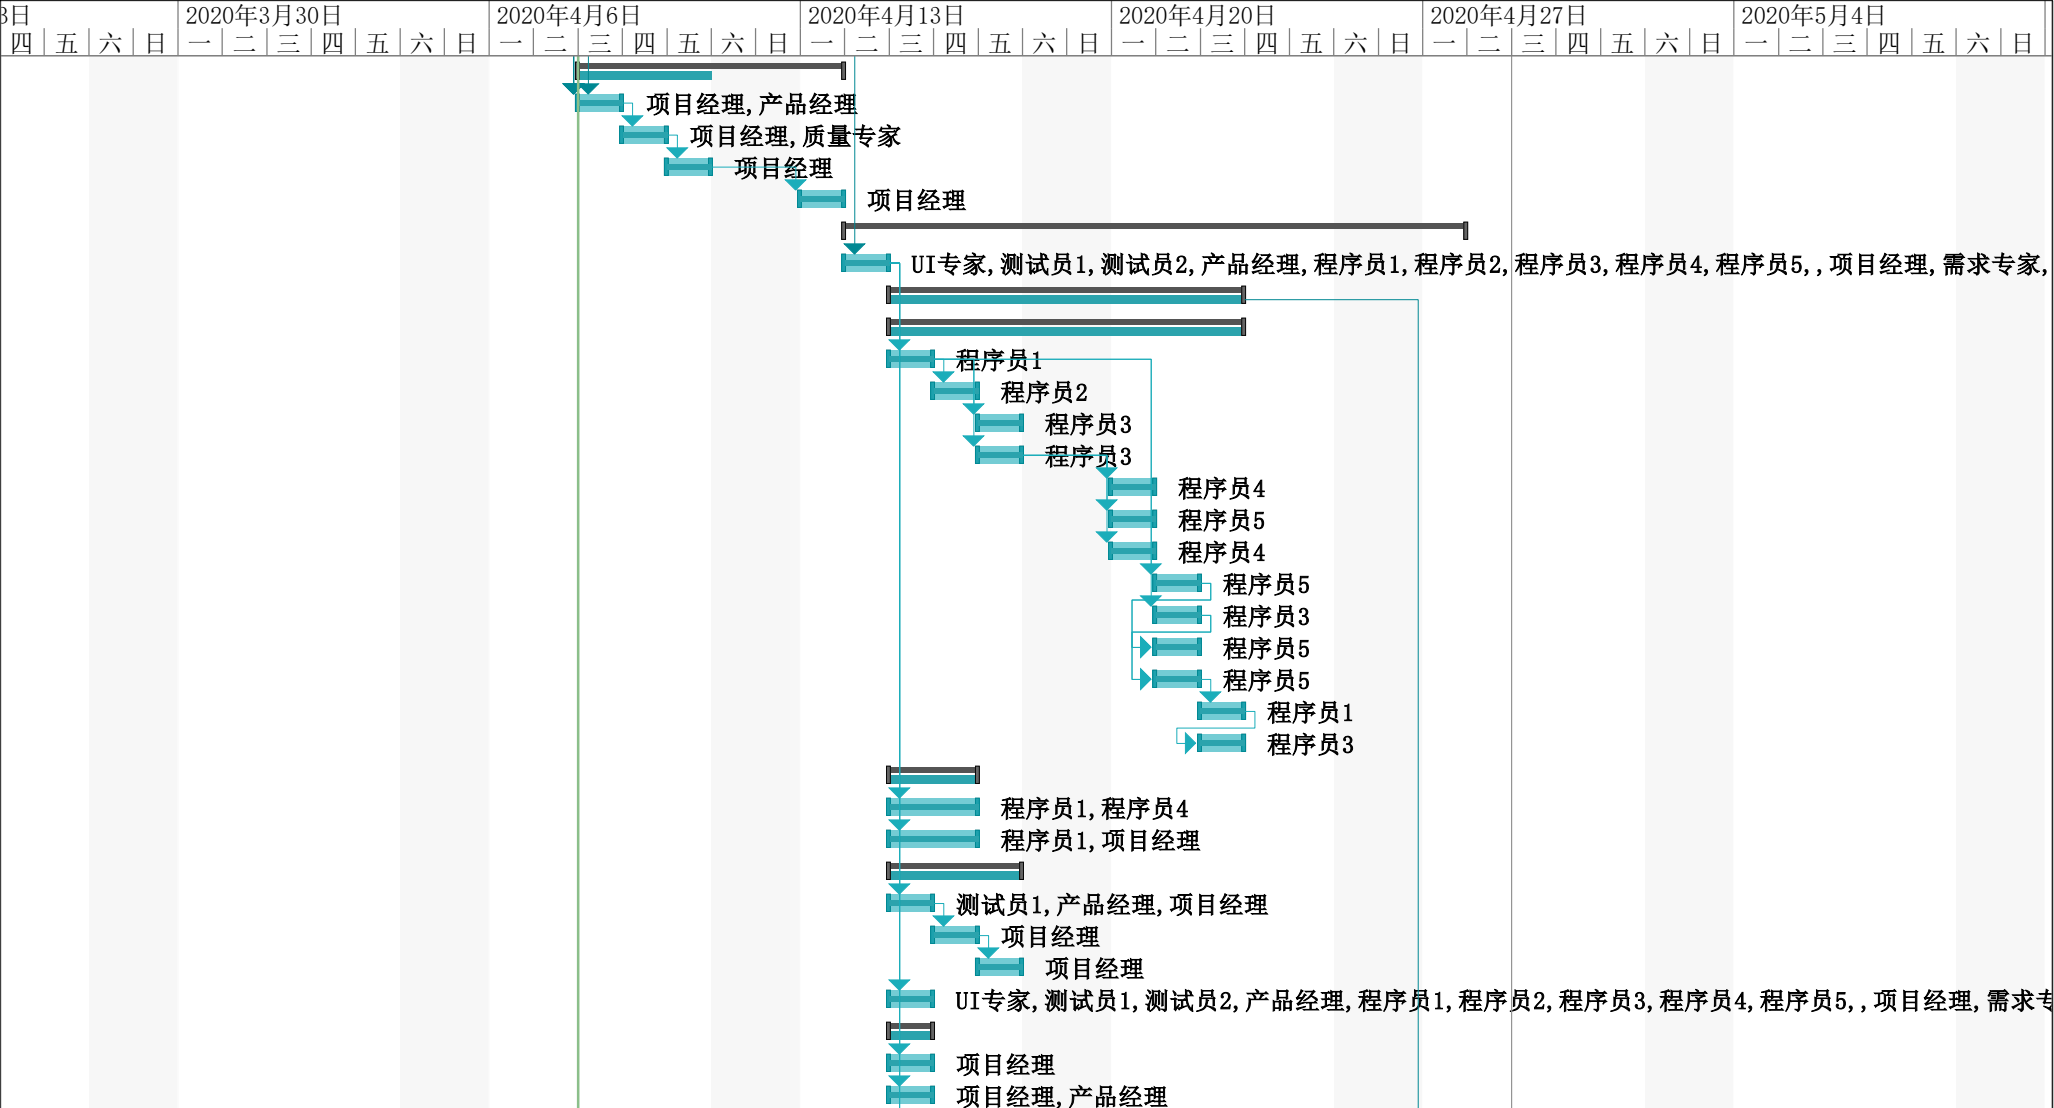









最后期限 

进度 

手动进度 





项目：项目规划 日期：2020年4月8日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务	
