


标识号	0	任务模式自	E务名称	工期 开 完成 前置任务 始 时间	资源名称	20年2月24	·日 日   四	2020年3月		2020年3月23    六   三   日		2020年4月6日 一   五   二	2020年
1		*					<del>-</del>   H		<u>.                                      </u>	/		11.	- / /   _
2	i	<b>→</b>	任命项目经理	1 个 202 2020	项目经理								
3	i	<b>*</b>		1 个 202 2020	项目经理,UI专								
4	i	<b>→</b>		1 个 202 2020	项目经理								
5	i	<b>→</b>		1 个 202 2020	项目经理								
6	i	<b>*</b>		1 个 202 2020 2, 3, 4,									
7	i	<b>→</b>	项目启动大会	1 个 2022020 6	项目经理,UI专								
8	_	À 3	规划		7, 1, 22, 2, 02								
9		**	规划范围										
10	i	<b>→</b>	制定需求说明书	1 个 202 2020 7	需求专家								
11	•	<b>*</b>	界面设计	1 个 2022020 10	UI专家								
12		<b>→</b>		1 个 202 2020 10	设计专家								
13		<b>*</b>		1 个 2022020 10	项目经理								
14		-		1 个 2022020 11, 12,									
15		-	形成范围基准	1 个 2022020 14	项目经理								
16		*	规划时间	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	N II VE								
17		<b>→</b>	排列工作包顺序	1 个 202 2020 15	项目经理								
18		<b>*</b>		1 个 202 2020 17	项目经理								
19	i	<b>*</b>		1 个 2022020 18	项目经理								
20	i	*		1 个 202 2020 19	项目经理								
21	i	<u> </u>	形成进度基准	1 个 202 2020 20	项目经理								
22	•	*	规划成本	- ,	N II VE								
23		<b>→</b>	项目成本估算	1 个 202 2020 21	项目经理								
24		<b>*</b>		1 个 202 2020 23	项目经理								
25		<b>→</b>	形成范围基准	1 个 2022020 24	项目经理								
26		*	规划质量	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	N II VE								
27		*	制定测试计划	1 个 202 2020 15	质量专家								
28		<b>→</b>		1 个 2022020 27	质量专家								
29		*	规划人力资源	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1							
30	i	*	制定人力资源计划	11 个 2022020 18	项目经理								
31	i	*	制定人员配置管理		项目经理	1							
32	•	*	规划沟通		NH-T-T	1							
33	ŧ	*	制定沟通管理计划	」1 个 202 2020 31	项目经理								
			任务	非	舌动任务		手动摘	要总成 🕳			程碑 ◇		
项目: 3.1一研为定WBS 日期: 2020年4月1日			拆分		舌动里程碑 ◇		手动摘			━ 最后期限			
						п							
			里程碑		舌动摘要 『	1	仅开始			进度	_		
			摘要		<b>小任务</b> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		仅完成I			手动进度	<u> </u>		
			项目摘要	[ 仅]	<b>工期</b>		外部任	务 🗆					
					第 1	页							

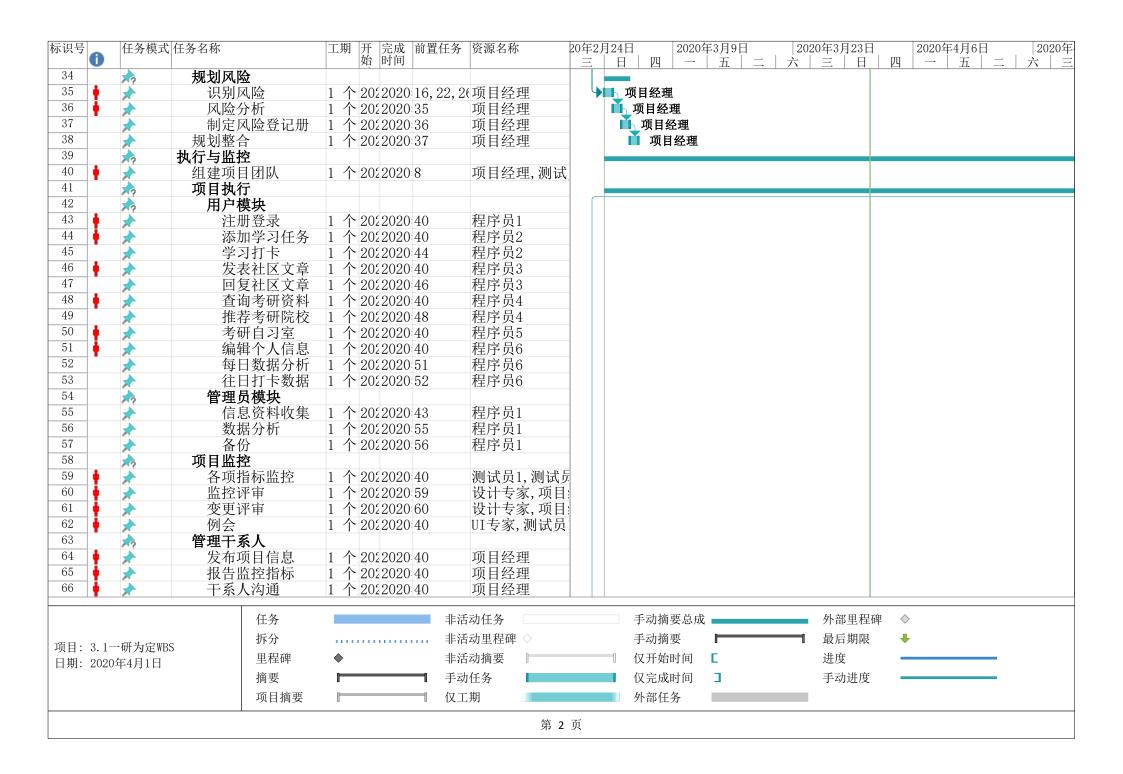

标识号	任务模式任务名称	-	工期 开 完成	前置任务 资源名	称	20年2月24日 三 日		年3月9日   五   二	2020年3月23日   六   三   日	2020年4月6	
67	★ 团队建设		<u>XÚ</u> 10 10			三日	四一	五二	六   三   日	四   一   五	二   六   三
68	☆ 培训		1 个 2022020	40 田寿	家,测试员						
69	娱乐活		1 个 2022020	40 UI专家	家,测试员						
70	→ 沟通		1 个 2022020	40 UI专家	家,测试员						
71	→ 项目验收		1 个 202 2020		全理,UI专	→■项	目经理,UI专	家,设计专家,	需求专家,质量专	₹	
72	☆ 收尾					•				_	
73	项目终检		1 个 202 2020	71 UI专	家,设计专				里,需求专家,质量专		
74		収尾	1 个 202 2020	71 UI专》	家,测试员	U U	I专家,测试」	员1,测试员2,	程序员1,程序员2,	星序员3,程序员4,程	上序员5,程序员6,该
		任务		非活动任务			手动摘要总成	ì	外部里程码		
		拆分			碑◇		, 37	`	最后期限	•	
项目: 3.1-		里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要			又开始时间	Г	进度	<b>V</b>	
日期: 2020年	)年4月1日		<b>*</b>		И			E .			
		摘要		手动任务			又完成时间	]	手动进度		
		项目摘要		■ 仅工期		5	小部任务				
					第 3	页					

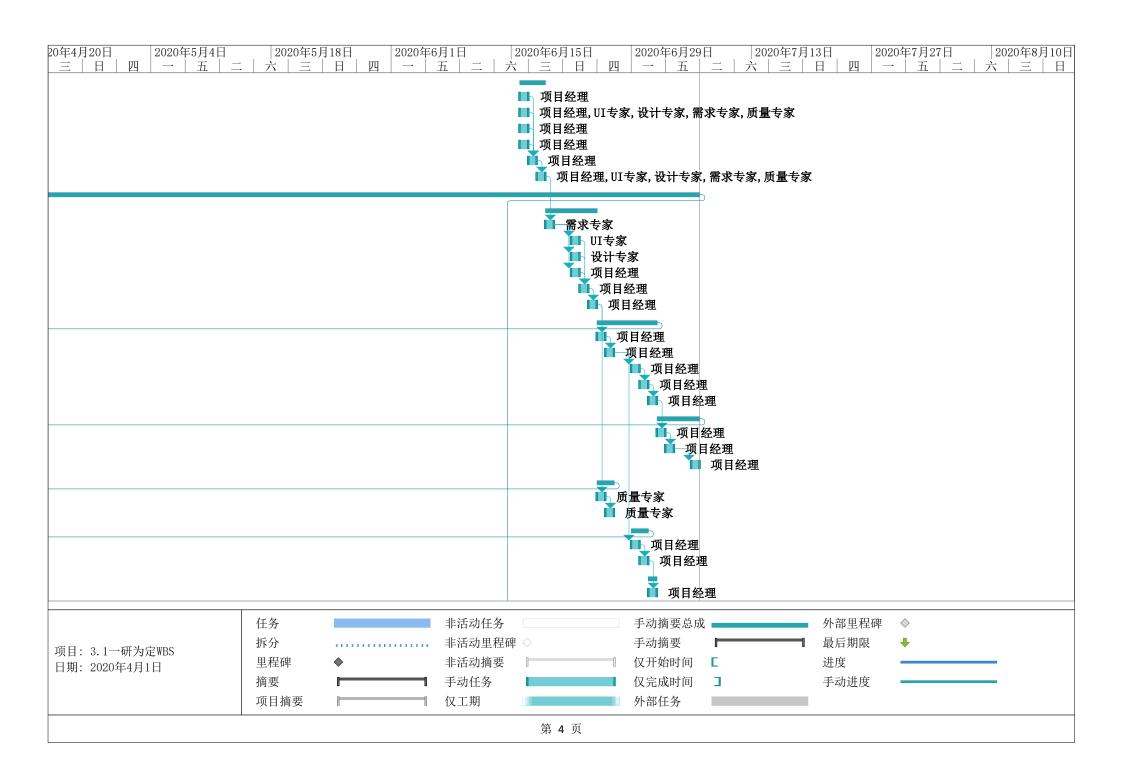

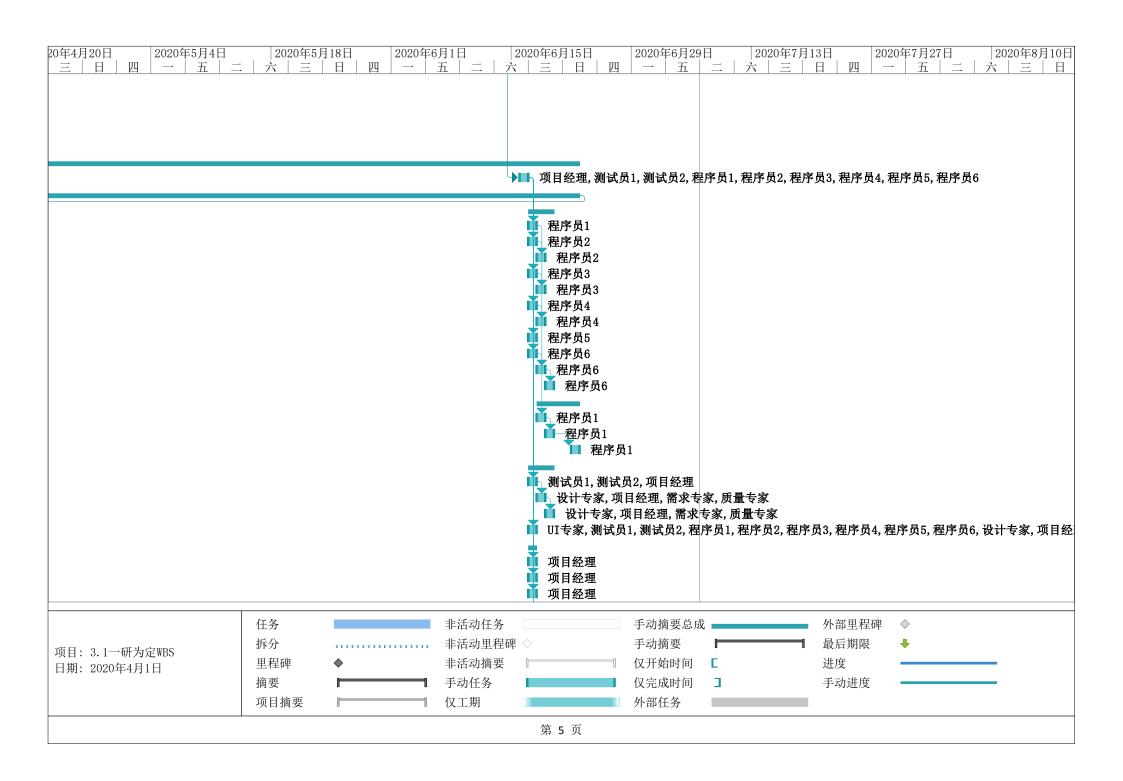

20年4月20日	2020年5月 一   ∃		2020年	F5月18日 三   日	四   202	0年6月1日   五	二一六		F6月15日 E   日		2020年6月2				7月13日   日		2020年7月 一   j	月27日 ī   二		E8月10日 E   日
								<u>II</u>	UI专家,	测试员:	1, 测试员2, 和 1, 测试员2, 和 1, 测试员2, 和	星序员	1,程序	员2, 程	序员3,	程序员	4,程序员	5,程序员6	,设计专家	、项目经
员6, 设计专家, 项目组	交班 電水	去家 质量	去家																	
до, <b>к</b> и <i>та</i> к, ж ц з	工产,而小	· マ <b>か</b> ,灰 里	720																	
			 狂务			非活	 品动任务				手动摘要总	成 🕳				·部里程	連 ◇			
项目: 3.1一研为定	WBS	1	斥分			非活	动里程碑	d 🔷			手动摘要	1			<b>司</b> 最	:后期限	•			
日期: 2020年4月11			<b>里程碑</b>	<b>♦</b>			动摘要				仅开始时间					度				
			商要 5日協再				]任务 · #II				仅完成时间 外部4.8	]			手 <b>一</b>	动进度				
			页目摘要			一 仅工	- 朔				外部任务									
								身	<b>6</b> 页											

