







































标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	3月16日					
									三	四	五	六	日	
1	🚀	启动	6 个工作日	2020年3月19日	2020年3月26日			¥7,040.00						
2	🚀	任命项目经理	1 个工作日	2020年3月19日	2020年3月19日		产品经理	¥320.00						
3	🚀	组建核心团队	1 个工作日	2020年3月19日	2020年3月19日		UI专家, 测试员1, 测试	¥3,800.00						
4	🚀	制定里程碑计划	1 个工作日	2020年3月19日	2020年3月19日		产品经理, 项目经理	¥640.00						
5	🚀	分析干系人	1 个工作日	2020年3月20日	2020年3月20日		产品经理, 项目经理, U	¥640.00						
6	🚀	制定项目章程	1 个工作日	2020年3月22日	2020年3月22日	2, 3, 4, 5	产品经理, 项目经理	¥640.00						
7	🚀	项目启动大会	1 个工作日	2020年3月24日	2020年3月24日		产品经理, 项目经理, 需	¥1,000.00						
8	🚀	规划	15 个工作日	2020年3月24日	2020年4月13日			¥7,640.00						
9	🚀	规划范围	4 个工作日	2020年3月24日	2020年3月27日			¥2,520.00						
10	🚀	制定需求说明书	1 个工作日	2020年3月24日	2020年3月24日	7	需求专家	¥360.00						
11	🚀	界面设计	1 个工作日	2020年3月25日	2020年3月25日		UI专家, 设计专家	¥280.00						
12	🚀	详细设计说明书	1 个工作日	2020年3月25日	2020年3月25日	10	UI专家, 产品经理, 项目	¥920.00						
13	🚀	范围说明书	1 个工作日	2020年3月25日	2020年3月25日	10	项目经理, 测试员1	¥320.00						
14	🚀	创建WBS	1 个工作日	2020年3月26日	2020年3月26日	11, 12, 13	项目经理, 产品经理, 质	¥320.00						
15	🚀	形成范围基准	1 个工作日	2020年3月27日	2020年3月27日		项目经理, 测试员1	¥320.00						
16	🚀	规划时间	5 个工作日	2020年3月28日	2020年4月2日			¥1,600.00						
17	🚀	排列工作包顺序	1 个工作日	2020年3月28日	2020年3月28日	15	项目经理, 测试员1	¥320.00						
18	🚀	估算资源	1 个工作日	2020年3月30日	2020年3月30日	17	项目经理, 测试员2	¥320.00						
19	🚀	估算持续时间	1 个工作日	2020年3月31日	2020年3月31日	18	项目经理, 产品经理	¥320.00						
20	🚀	制定进度计划	1 个工作日	2020年4月1日	2020年4月1日	19	项目经理, 程序员1, 程	¥320.00						
21	🚀	形成进度基准	1 个工作日	2020年4月2日	2020年4月2日	20	项目经理	¥320.00						
22	🚀	规划成本	3 个工作日	2020年4月3日	2020年4月7日			¥640.00						
23	🚀	项目成本估算	0 个工作日	2020年4月3日	2020年4月3日	21	项目经理	¥0.00						
24	🚀	项目预算	1 个工作日	2020年4月6日	2020年4月6日	23	项目经理	¥320.00						
25	🚀	形成范围基准	1 个工作日	2020年4月7日	2020年4月7日	24	项目经理	¥320.00						
26	🚀	规划质量	2 个工作日	2020年3月30日	2020年3月31日			¥640.00						
27	🚀	制定测试计划	1 个工作日	2020年3月30日	2020年3月30日	15	质量专家	¥320.00						
28	🚀	制定测试用例	1 个工作日	2020年3月31日	2020年3月31日	27	质量专家	¥320.00						
29	🚀	规划人力资源	2 个工作日	2020年3月31日	2020年4月1日			¥640.00						
30	🚀	制定人力资源计划	1 个工作日	2020年3月31日	2020年3月31日	18	项目经理, 产品经理	¥320.00						
31	🚀	制定人员配备管理计	1 个工作日	2020年4月1日	2020年4月1日	30	项目经理, 产品经理	¥320.00						
32	🚀	规划沟通	1 个工作日	2020年4月2日	2020年4月2日			¥320.00						
33	🚀	制定沟通管理计划	1 个工作日	2020年4月2日	2020年4月2日	31	项目经理, 需求专家, 质	¥320.00						


项目：项目规划 日期：2020年4月8日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			









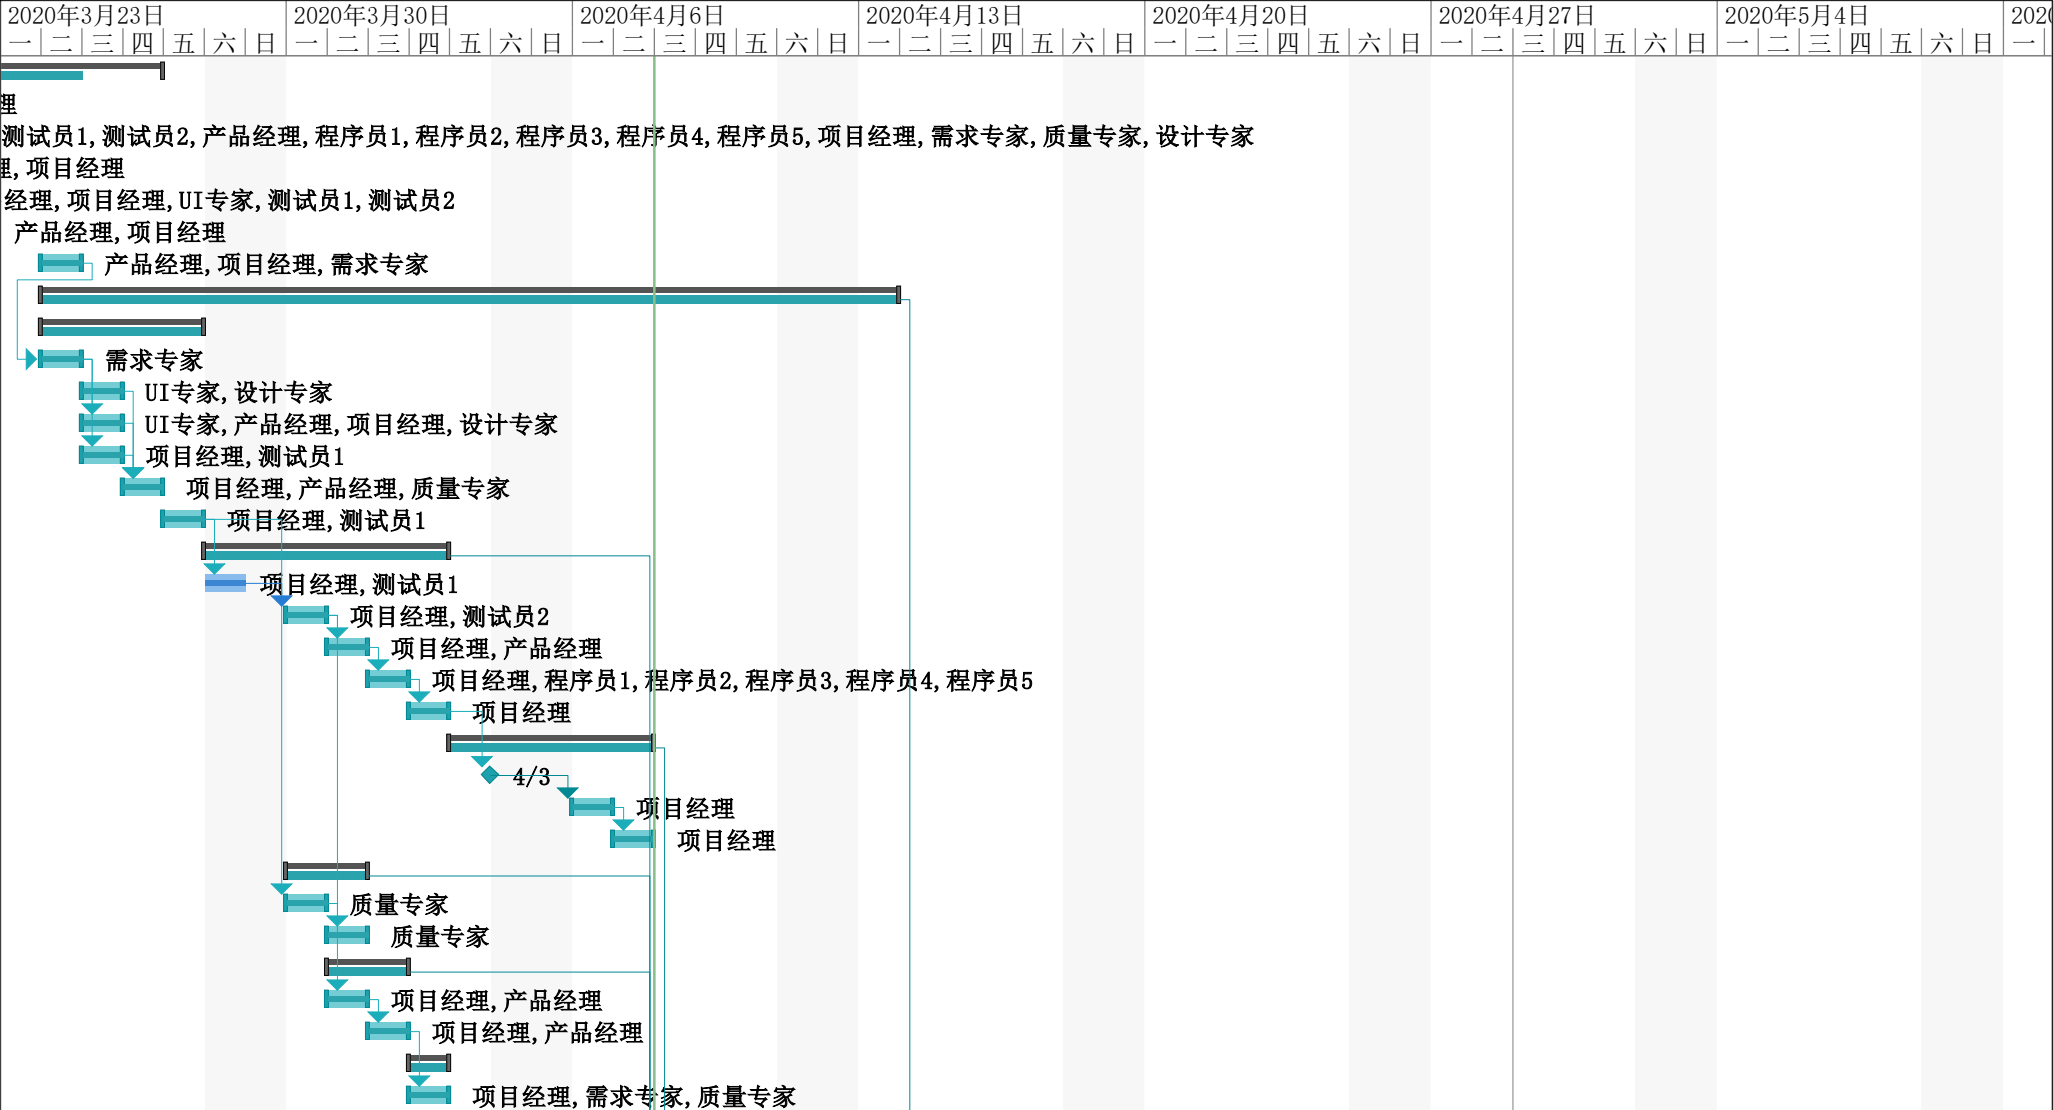










标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	3月16日					
									三	四	五	六	日	
34	🚀	规划风险	4 个工作日	2020年4月8日	2020年4月13日			¥960.00						
35	🚀	识别风险	1 个工作日	2020年4月8日	2020年4月8日	16, 22, 26	项目经理, 产品经理	¥320.00						
36	🚀	风险分析	1 个工作日	2020年4月9日	2020年4月9日	35	项目经理, 质量专家	¥320.00						
37	🚀	制定风险登记册	1 个工作日	2020年4月10日	2020年4月10日	36	项目经理	¥320.00						
38	🚀	规划整合	1 个工作日	2020年4月13日	2020年4月13日	37	项目经理	¥320.00						
39	🚀	执行与监控	10 个工作日	2020年4月14日	2020年4月27日			¥27,600.00						
40	🚀	组建项目团队	1 个工作日	2020年4月14日	2020年4月14日	8	UI专家, 测试员1, 测试	¥3,800.00						
41	🚀	项目执行	6 个工作日	2020年4月15日	2020年4月22日			¥5,480.00						
42	🚀	用户模块	6 个工作日	2020年4月15日	2020年4月22日			¥4,200.00						
43	🚀	注册登录	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日	40	程序员1	¥320.00						
44	🚀	院校专业查询	1 个工作日	2020年4月16日	2020年4月16日	43	程序员2	¥360.00						
45	🚀	每日打卡	1 个工作日	2020年4月17日	2020年4月17日	43	程序员3	¥320.00						
46	🚀	考研自习室	1 个工作日	2020年4月17日	2020年4月17日	43	程序员3	¥320.00						
47	🚀	考研资料库	1 个工作日	2020年4月20日	2020年4月20日	46	程序员4	¥320.00						
48	🚀	用户答疑	1 个工作日	2020年4月20日	2020年4月20日	46	程序员5	¥320.00						
49	🚀	网课学习	1 个工作日	2020年4月20日	2020年4月20日	46	程序员4	¥320.00						
50	🚀	社区文章	1 个工作日	2020年4月21日	2020年4月21日	43	程序员5	¥320.00						
51	🚀	社区问答	1 个工作日	2020年4月21日	2020年4月21日	43	程序员3	¥320.00						
52	🚀	添加文章问答	1 个工作日	2020年4月21日	2020年4月21日	50, 51	程序员5	¥320.00						
53	🚀	文章问答回复	1 个工作日	2020年4月21日	2020年4月21日	50, 51	程序员5	¥320.00						
54	🚀	个人中心信息	1 个工作日	2020年4月22日	2020年4月22日	53	程序员1	¥320.00						
55	🚀	个人数据	1 个工作日	2020年4月22日	2020年4月22日	54	程序员3	¥320.00						
56	🚀	管理员模块	2 个工作日	2020年4月15日	2020年4月16日			¥1,280.00						
57	🚀	数据分析	2 个工作日	2020年4月15日	2020年4月16日	40	程序员1, 程序员4	¥640.00						
58	🚀	信息资料收集	2 个工作日	2020年4月15日	2020年4月16日	40	程序员1, 项目经理	¥640.00						
59	🚀	项目监控	3 个工作日	2020年4月15日	2020年4月17日			¥5,320.00						
60	🚀	各项指标监控	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日	40	测试员1, 产品经理, 项	¥880.00						
61	🚀	监控评审	1 个工作日	2020年4月16日	2020年4月16日	60	项目经理	¥320.00						
62	🚀	变更评审	1 个工作日	2020年4月17日	2020年4月17日	61	项目经理	¥320.00						
63	🚀	例会	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日	40	UI专家, 测试员1, 测试	¥3,800.00						
64	🚀	管理干系人	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日			¥960.00						
65	🚀	发布项目信息	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日	40	项目经理	¥320.00						
66	🚀	报告监控指标	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日	40	项目经理, 产品经理	¥320.00						

项目：项目规划 日期：2020年4月8日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



















标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	3月16日	三	四	五	六	日
67		干系人沟通	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日	40	项目经理	¥320.00						
68		团队建设	2 个工作日	2020年4月15日	2020年4月16日			¥10,440.00						
69		培训	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日	40	UI专家, 测试员1, 测试	¥3,160.00						
70		娱乐活动	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日	40	UI专家, 测试员1, 测试	¥3,480.00						
71		沟通	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日	40	UI专家, 测试员1, 测试	¥3,800.00						
72		项目验收	1 个工作日	2020年4月27日	2020年4月27日	41	UI专家, 产品经理, 测试	¥1,600.00						
73		收尾	1 个工作日	2020年4月28日	2020年4月28日			¥3,440.00						
74		项目终检	1 个工作日	2020年4月28日	2020年4月28日	72	UI专家, 产品经理, , 项	¥1,600.00						
75		项目内部收尾	1 个工作日	2020年4月28日	2020年4月28日	72	UI专家, 测试员1, 产品	¥1,840.00						

项目：项目规划 日期：2020年4月8日	任务		非活动任务		手动摘要		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：项目规划 日期：2020年4月8日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：项目规划 日期：2020年4月8日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务	
