


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	16日		
1	<b>*</b>	 启动	7 个工作日	2020年3月19日	2020年3月27日					
2	3	任命项目经理	1 个工作日	2020年3月19日	2020年3月19日		产品经理	产品经理		
3	<u> </u>	组建核心团队	1 个工作日	2020年3月19日	2020年3月10日		UI专家,测试员1,	UI专家,测		
4	<u> </u>	制定里程碑计划	1 个工作日	2020年3月19日	2020年3月23日		产品经理,项目经			
5		分析干系人	1 个工作日	2020年3月19日	2020年3月24日		产品经理,项目经			
6	- 2	制定项目章程	1 个工作日	2020年3月13日	2020年3月25日	2, 3, 4, 5	产品经理,项目经			
7	- 2	项目启动大会	2 个工作日	2020年3月20日	2020年3月25日	6	产品经理,项目经			
8	- 2	规划	23 个工作日	2020年3月24日	2020年4月23日	U	) 朋红柱, 次日红			
9		规划范围	5 个工作日	2020年3月24日	2020年3月30日					
10		制定需求说明书	1 个工作日	2020年3月24日	2020年3月36日	7	需求专家			
11	- 2	界面设计	1 个工作日	2020年3月25日	2020年3月27日	10	UI专家,设计专家			
12	- 2	详细设计说明书	1 个工作日	2020年3月25日	2020年3月26日	10	设计专家			
13		范围说明书	1 个工作日	2020年3月25日	2020年3月26日	10	项目经理			
14		创建WBS	1 个工作日	2020年3月25日	2020年3月20日		项目经理			
15		形成范围基准	1 个工作日	2020年3月20日	2020年3月27日	14	项目经理			
16		规划时间	17 个工作日	2020年3月27日	2020年3月30日 2020年4月21日	14	<b>坝口红垤</b>			
17		排列工作包顺序	2 个工作日	2020年3月31日	2020年4月21日	15	项目经理			
18		在算资源 估算资源	1 个工作日	2020年3月31日	2020年4月6日 2020年4月1日	17	项目经理			
19			1 个工作日	2020年3月30日 2020年3月31日	2020年4月1日 2020年4月2日	18	项目经理			
20	<u> </u>	制定进度计划	1 个工作日	2020年3月31日 2020年4月1日	2020年4月2日 2020年4月7日	19	项目经理			
21	<u> </u>	形成进度基准	1 个工作日	2020年4月1日 2020年4月2日	2020年4月7日 2020年4月21日	20	项目经理			
22	<u> </u>	<b>规划成本</b>	14 个工作日		2020年4月21日 2020年4月22日	20	坝日红埕			
23	<u> </u>	<b>观观风</b> 项目成本估算	0 个工作日	<b>2020年4月3日</b> 2020年4月3日	2020年4月22日 2020年4月3日	21	项目经理			
24		项目预算	1 个工作日	2020年4月3日	2020年4月3日 2020年4月9日	23	项目经理			
25		形成范围基准	1 个工作日	2020年4月6日 2020年4月7日	2020年4月9日	24	项目经理			
26		规划质量 规划质量	4 个工作日		2020年4月22日	24	坝日红垤			
27		制定测试计划	1 个工作日	<b>2020年3月30日</b> 2020年3月30日	2020年4月2日	15	质量专家			
28		制定测试用例	1 个工作日	2020年3月30日	2020年4月1日 2020年4月2日	27	质量专家			
29		规划人力资源	7 个工作日	2020年3月31日	2020年4月2日	41	<b>灰里々</b>			
30						18	项目经理			
31	<u> </u>	制定人力资源计划 制定人员配备管理计	1 个工作日	2020年3月31日 2020年4月1日	2020年4月3日 2020年4月8日	30	项目经理			
32	<u> </u>			2020年4月1日 2020年4月2日		30	<b>坝</b> 日 红 生			
33	<u> </u>	<b>规划沟通</b> 制定沟通管理计划	12 个工作日	2020年4月2日	<b>2020年4月17日</b> 2020年4月17日	31	项目经理			
34	<u> </u>	规划风险 规划风险	1 个工作日	2020年4月2日 2020年4月8日	2020年4月17日 2020年4月14日	91	<b>炒</b> 目红埋			
04	<b>*</b>		5 个工作日							
		任务		活动任务	手动摘要总成		外部里程碑 ◇			
	٠١ . <del>٢٠</del>	拆分	非	=活动里程碑 ◇	手动摘要	1	最后期限    ◆			
项目:一研		里程碑 ◆	非	活动摘要 『	『 仅开始时间 □		进度 ——			
日期: 2020	年4月22日	摘要		动任务	【 仅完成时间 】		手动进度 ——			
		项目摘要 ■		工期	外部任务					
			1.7	(上対)	71.时任分					
第 1 页										


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	16日	五 六 日
35	<b>*</b>	识别风险	1 个工作日	2020年4月8日	2020年4月10日	16, 22, 26,	· 而日经理	<u> </u>	
36	4	风险分析	1 个工作日	2020年4月9日	2020年4月13日	35	项目经理		
37	- 3	制定风险登记册	1 个工作日	2020年4月10日	2020年4月14日	36	项目经理		
38	- 4	规划整合	1 个工作日	2020年4月13日	2020年4月13日	37	项目经理		
39	<u>~</u>	执行与监控	22 个工作日	2020年4月14日	2020年5月13日	01	火日红柱		
40	3	组建项目团队	1 个工作日	2020年4月14日	2020年4月15日	8	UI专家,测试员1,		
41	<u>_</u>	项目执行	21 个工作日	2020年4月15日	2020年5月13日	O			
42	-5	用户模块	21 个工作日	2020年4月15日	2020年5月13日				
43	*	注册登录	13 个工作日	2020年4月15日	2020年5月12日	40	程序员1		
44	<u>_</u>	浏览院校专业	1 个工作日	2020年4月15日	2020年5月13日	43	程序员2		
45	*	查询院校专业	1 个工作日	2020年4月16日	2020年4月20日	43	程序员2		
46	<u>_</u>	发表文章	1 个工作日	2020年4月17日	2020年4月21日	45	程序员3		
47	*	回复文章	1 个工作日	2020年4月17日	2020年4月20日	45	程序员3		
48	<u>_</u>	毎日打卡	1 个工作日	2020年4月20日	2020年4月21日	47	程序员4		
49	*	添加学习任务	1 个工作日	2020年4月20日	2020年4月22日	47	程序员4		
50	*	考研自习室	1 个工作日	2020年4月23日	2020年4月27日	49	程序员4		
51	-5	考研真题资料	1 个工作日	2020年4月21日	2020年4月23日	49	程序员5		
52	*	考研网课	1 个工作日	2020年4月21日	2020年4月27日	49	程序员5		
53	*	考研答疑	1 个工作日	2020年4月21日	2020年4月24日	49	程序员5		
54	-3	个人中心	1 个工作日	2020年4月22日	2020年4月27日	53	程序员1		
55	*	管理员模块	6 个工作日	2020年4月15日	2020年4月22日		, , , , , ,		
56	-3	数据分析	2 个工作日	2020年4月21日	2020年4月22日	40	需求专家		
57	*	信息资料收集	2 个工作日	2020年4月15日	2020年4月22日	40	程序员1		
58	*	项目监控	15 个工作日	2020年4月15日	2020年5月5日				
59	*	各项指标监控	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月16日	40	测试员1,产品经理		
60	*	监控评审	2 个工作日	2020年4月16日	2020年4月20日	59	设计专家,项目经		
61	*	变更评审	2 个工作日	2020年4月17日	2020年5月5日	60	设计专家,项目经		
62	5	例会	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月16日	40	UI专家,测试员1,		
63	*	管理干系人	12 个工作日	2020年4月15日	2020年4月30日				
64	-5	发布项目信息	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月27日	40	项目经理		
65	-5	报告监控指标	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月29日	40	项目经理		
66	-5	干系人沟通	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月30日	40	项目经理		
67	*	团队建设	15 个工作日	2020年4月15日	2020年5月5日				
68	*	培训	1 个工作日	2020年5月5日	2020年5月5日	40	UI专家,测试员1,		
		任务	非活动	 任务	手动摘要总成		外部里程碑 ◇		
		拆分		里程碑 ◇	手动摘要		最后期限   ◆		
   项目: 一項	开为定								
	0年4月22日	里程碑	◆非活动		□ 仅开始时间 □		进度		_
		摘要	手动任	务	■ 仅完成时间 3		手动进度 ———		_
		项目摘要	【 仅工期		外部任务 二二二				
				71. 21					


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	16日 2
U								<u>  二   四   五   六   日    </u>
69	*	娱乐活动	2 个工作日	2020年4月15日	2020年4月17日	40	UI专家,测试员1,	
70	*	沟通	2 个工作日	2020年4月15日	2020年4月17日	40	UI专家,测试员1,	
71	*	项目验收	1 个工作日	2020年4月27日	2020年4月28日	41	UI专家,产品经理	
72	*	收尾	8 个工作日	2020年4月28日	2020年5月7日			
73	-5	项目终检	1 个工作日	2020年4月28日	2020年5月6日	71	UI专家,产品经理	
74	*	项目内部收尾	3 个工作日	2020年4月28日	2020年5月7日	71	UI专家,测试员1,	




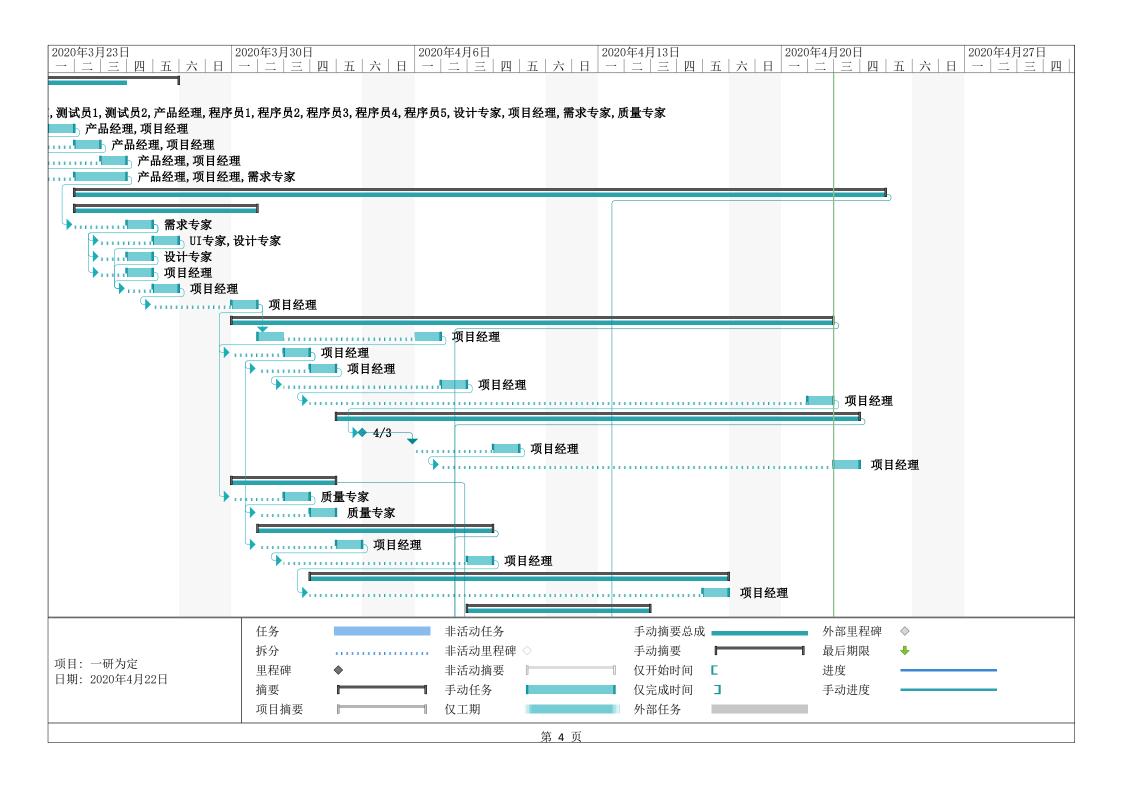

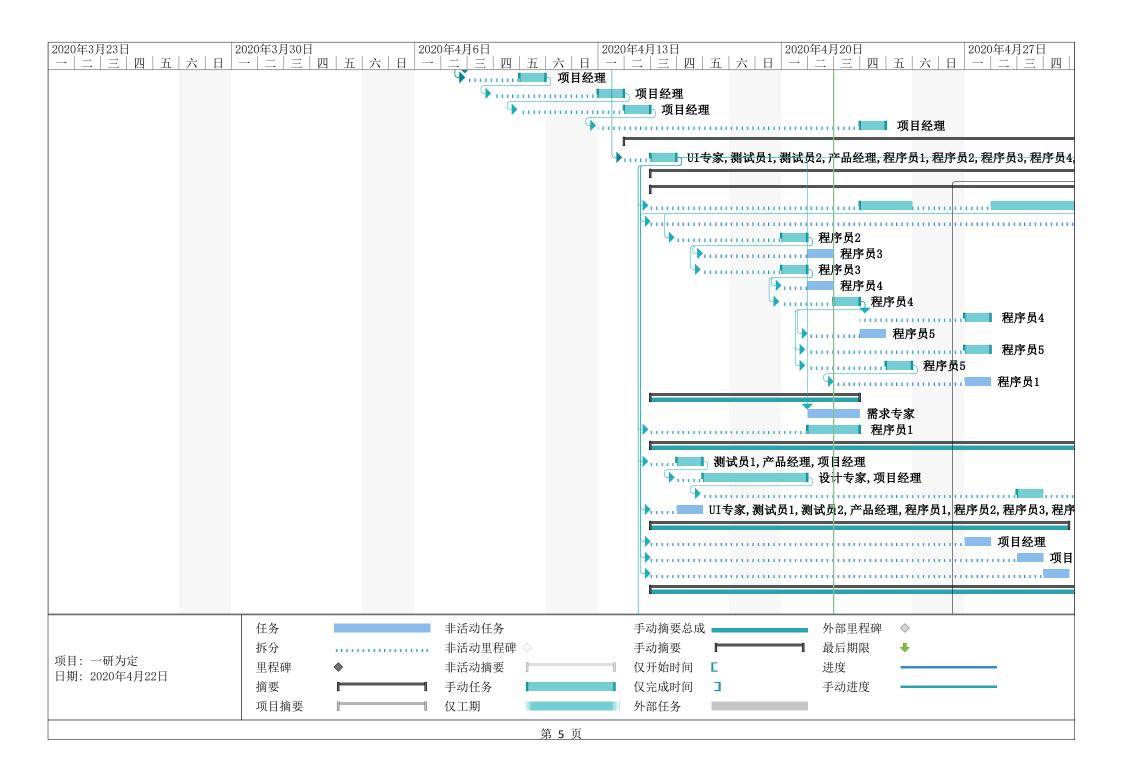

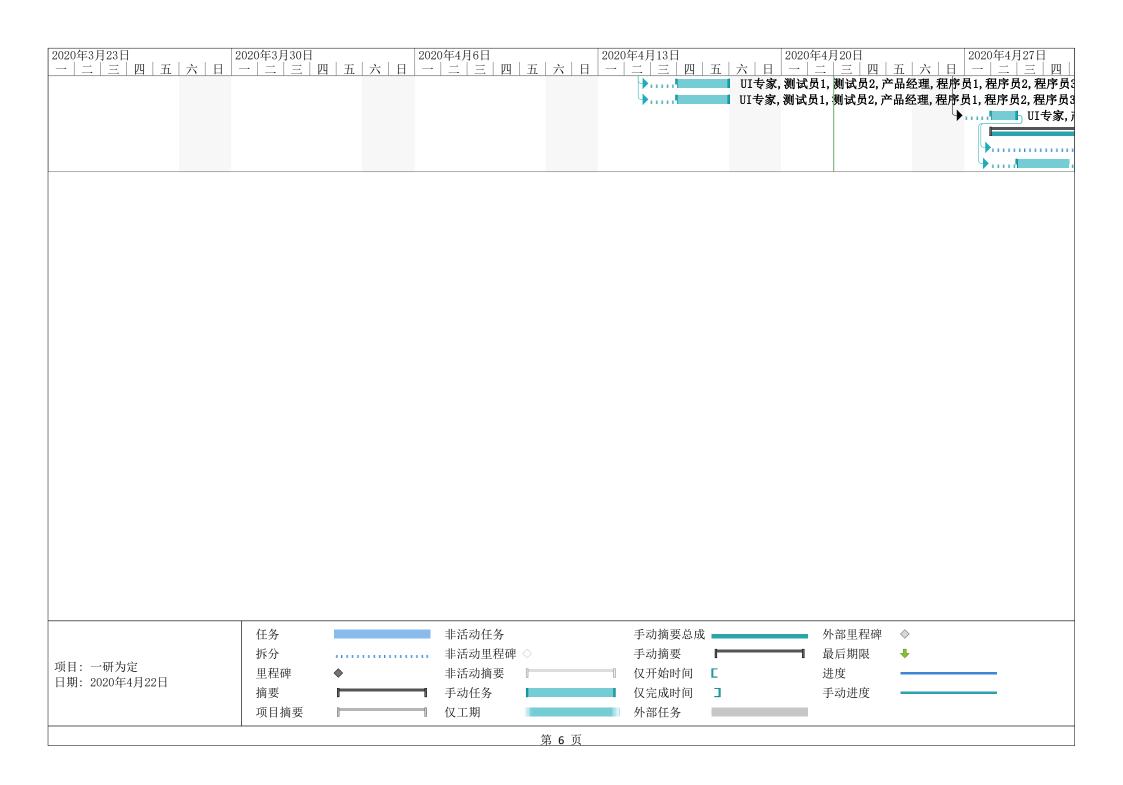

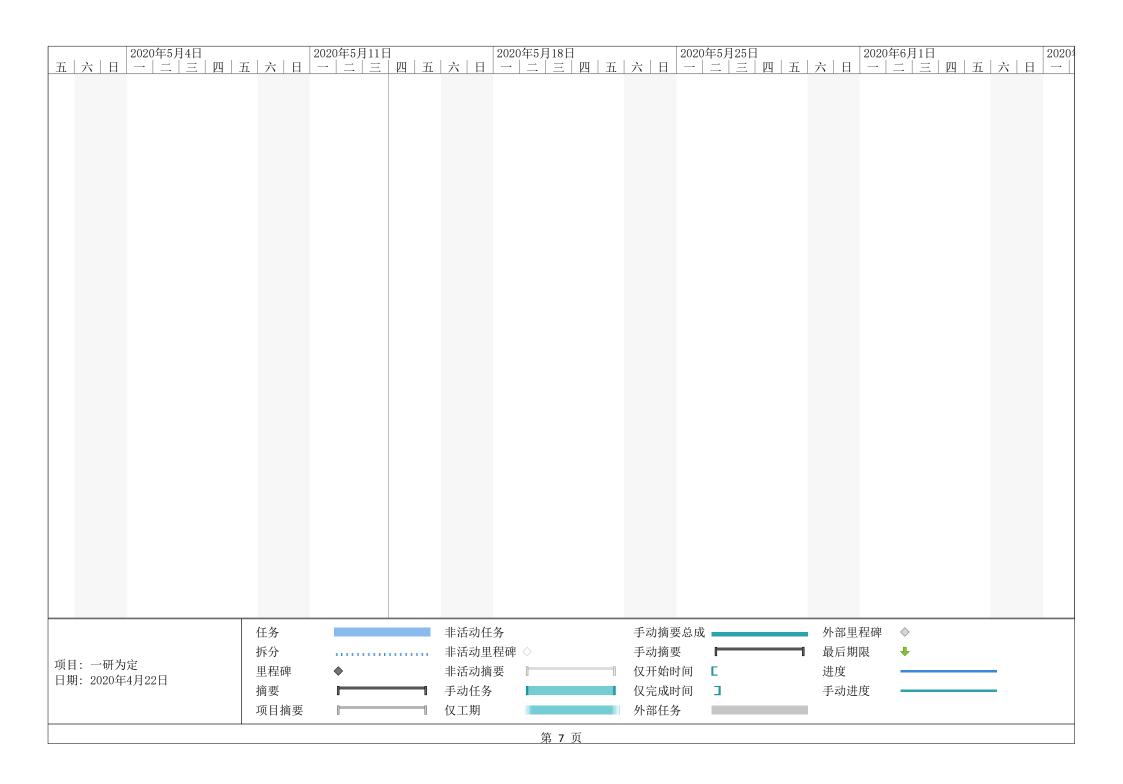

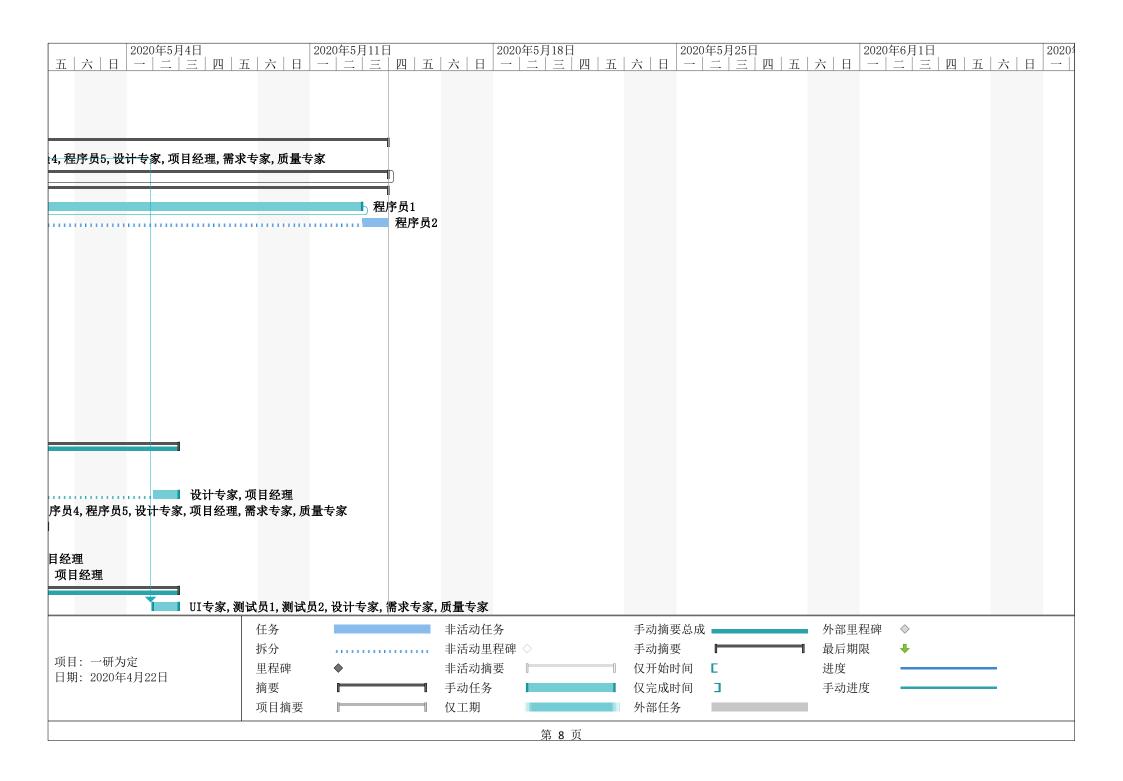

	五 六 日 求专家, 质量专家 经理, 需求专家, :专家, 质量专家 5/7 3, 产品经理, 设记	,质量专家	六   日   一   <b>六   日   一</b>		六 日 一	0年5月25日   二   三   四   五	六 日 一	年6月1日 二 三 四	五 六 日	20204
项目:一研为定 日期: 2020年4月22日	任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要	<b>+</b>	非活动任务 非活动里程碑 非活动摘要 手动任务 仅工期		手动摘要总成 手动摘要 仅开始时间 仅完成时间 外部任务		外部里程碑 最后期限 进度 手动进度	♦		
第 9 页										
