


标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	}	月16日 2020年3月23日 三 四 五 六 日 一 二 三 四
1	~	*	启动	6 个工作日	2020年3月	192020年3月2	3 6			
	√	*	任命项目经理			192020年3月1		产品经理		产品经理
3	√	*	组建核心团队			192020年3月1		UI专家,测试员1,测	则试员2,	UI专家,测试员1,测试员2
	√	*	制定里程碑计划	1 个工作日	2020年3月	192020年3月1	9	产品经理,项目经理	里	产品经理, 项目经理
5	√	*	分析干系人	1 个工作日	2020年3月	192020年3月1	9	一产品经理,项目经理	浬	产品经理, 项目经理
	✓	*	制定项目章程			202020年3月2		一产品经理,项目经理	浬	产品经理,项目经理
	✓	*	项目启动大会			232020年3月2		产品经理,项目经理	理, 需求も	产品经理
	✓	*	规划			242020年4月1				
	✓	*	规划范围			242020年3月2				
	✓	*	制定需求说明书			242020年3月2		需求专家		需求
	✓	*	界面设计			252020年3月2		UI专家,设计专家		Ų Ų
	✓	*	详细设计说明书			252020年3月2		设计专家		,
	✓	*	范围说明书			252020年3月2		项目经理		
	✓	*	创建WBS			262020年3月2		项目经理		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	✓	*	形成范围基准			272020年3月2		项目经理		
	✓	-5	规划时间			282020年4月2				
	✓	*	排列工作包顺序			282020年3月2		项目经理		
	✓	*	估算资源			302020年3月3		项目经理		
	✓	*	估算持续时间			312020年3月3		项目经理		
	✓	*	制定进度计划			112020年4月1		项目经理		
	√	*	形成进度基准			2 [2020年4月2		项目经理		
	✓	*	规划成本			3 2020年4月7				
	✓	*	项目成本估算			3 [2020年4月3		项目经理		
	√	*	项目预算			6[2020年4月6		项目经理		
	√	*	形成范围基准			7[2020年4月7		项目经理		
	√	*	规划质量			302020年3月3				
	✓	*	制定测试计划			302020年3月3		质量专家		
28	√	*	制定测试用例			312020年3月3		质量专家		
	✓	*	规划人力资源			312020年4月1		-T 17		
	✓	*	制定人力资源计划	1 个工作日	2020年3月	312020年3月3	118	项目经理		
	✓	*	制定人员配备管理计	划1 个工作日	2020年4月	112020年4月1	130	项目经理		
	<u> </u>	*	规划沟通			2 2020年4月2		~T [] /7 ~m		
	√	*	制定沟通管理计划			212020年4月2		项目经理		
34	<u> </u>	*	规划风险	4 个工作日	2020年4月	8 2020年4月1	<u>.</u>			
			任务		非活动任务		手动摘要总成	ž	卜部里程碑	\Diamond
			15.0		非活动里程码	₽ ♦	手动摘要		是后期限	+
项目:	项目: 3.1一研		里程碑 ◆		非活动摘要		仅开始时间		捷度	
日期:	2020年	4月7日				d				
			摘要		手动任务		1 仅完成时间] 手	三动进度	
			项目摘要		仅工期		外部任务			ļ
			1			第 1 页				

标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		月16日 三 四 五 六	2020年3月23日 日 - 二 三 四
35	~	*	识别风险	1 个工作日	2020年4月	8 2020年4月	8[16, 22, 26,	29 项目经理			
36	V	*	风险分析			9 2020年4月		项目经理			
37	V	*	制定风险登记册			102020年4月		项目经理			
38	V	*	规划整合			132020年4月		项目经理			
39	√	*	执行与监控	1 个工作日	2020年4月	142020年4月	14				
40	✓	*	组建项目团队	1 个工作日	2020年4月	142020年4月	148	UI专家,测试员1,	测试员2,		
41	✓	*	项目执行	6 个工作日	2020年4月	152020年4月	22				
42	✓	*	用户模块	6 个工作日	2020年4月]152020年4月	22				
43	✓	*	注册登录	1 个工作日	2020年4月	152020年4月	1540	程序员1			
44	\checkmark	*	浏览院校专业]162020年4月		程序员2			
45	✓	*	查询院校专业]162020年4月		程序员2			
46	✓	*	发表文章			1172020年4月		程序员3			
47	✓	*	回复文章			1172020年4月		程序员3			
48	✓	*	每日打卡			1202020年4月		程序员4			
49	√	*	添加学习任务			202020年4月		程序员4			
50	√	*	考研自习室			212020年4月		程序员5			
51	√	*	考研真题资料			212020年4月		程序员5			
52	√	*	考研网课			212020年4月		程序员5			
53	√	*	考研答疑			212020年4月		程序员5			
54	√	*	个人中心			222020年4月		程序员1			
55	✓	*	管理员模块			152020年4月					
56	✓	*	数据分析			152020年4月		程序员1			
57	✓	*	信息资料收集			152020年4月		程序员1			
58	√	*	项目监控			152020年4月					
59	✓_	*	各项指标监控			152020年4月		测试员1,产品经3			
60	✓_	*	监控评审			162020年4月		设计专家,项目经			
61	√	*	变更评审			172020年4月		设计专家,项目经			
62	✓	*	例会			152020年4月		UI专家,测试员1,	测试员2,		
63	√	*	管理干系人			152020年4月		Z 12 /2 .md			
64	√	*	发布项目信息			152020年4月		项目经理			
65	√	*	报告监控指标			152020年4月		项目经理			
66	~	*	干系人沟通			152020年4月		项目经理			
67	√	*	团队建设			152020年4月		1	\H \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
68	√	*	培训	1 个工作日	2020年4月	152020年4月	15 40	UI专家,测试员1,	测试员2,	;	
			任务		非活动任务		手动摘罗	要总成	外部里程碑	\Diamond	
	项目: 3.1一研为定WBS		拆分		非活动里程码	埤 ◇	手动摘要	Е	最后期限	•	
			里程碑	♦	非活动摘要		工 仅开始时		进度		
日期:	2020)年4月7日	摘要		手动任务		■ 仅完成b		手动进度		
									丁纠延浸		
			项目摘要		仅工期		外部任务	分			
						第 2 页					

标识号	4条模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	3月16日	2020年3月23日
	b EARA		1.791) I YU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1)[]/X[F] [F]	加重压力	贝伽 1 彻		五 六 日 一 二 三 四
69	/ ★	娱乐活动	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月	1540	UI专家,测试员1,测试员	12,	
70	/ ★	沟通	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月	1540	UI专家,测试员1,测试员	¹ 2,	
71	/ 🖈	项目验收	1 个工作日	2020年4月27	2020年4月	2741	UI专家,产品经理,设计	专家	
72	/ 🖈	收尾	1 个工作日	2020年4月28	2020年4月	28			
73	/ 🖈	项目终检	1 个工作日	2020年4月28	2020年4月	2871	UI专家,产品经理,设计	专家	
74	/ ★	项目内部收尾	1 个工作日	2020年4月28	2020年4月	2871	UI专家,测试员1,产品经	2理	



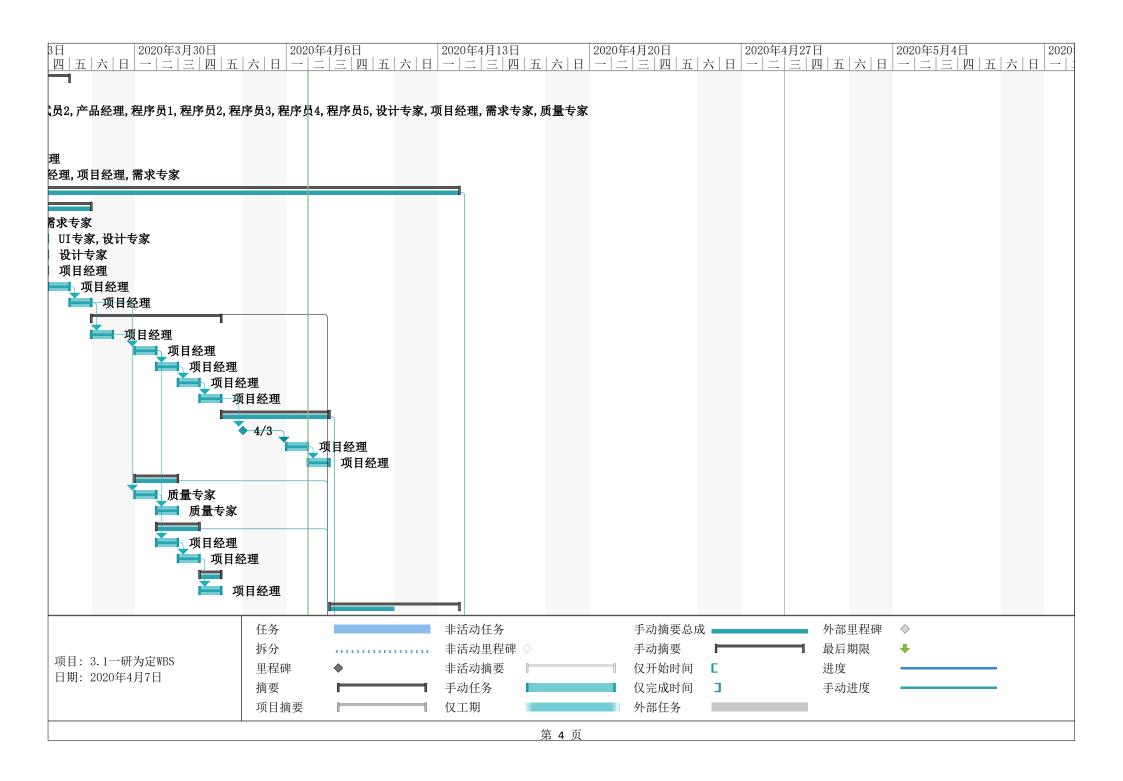

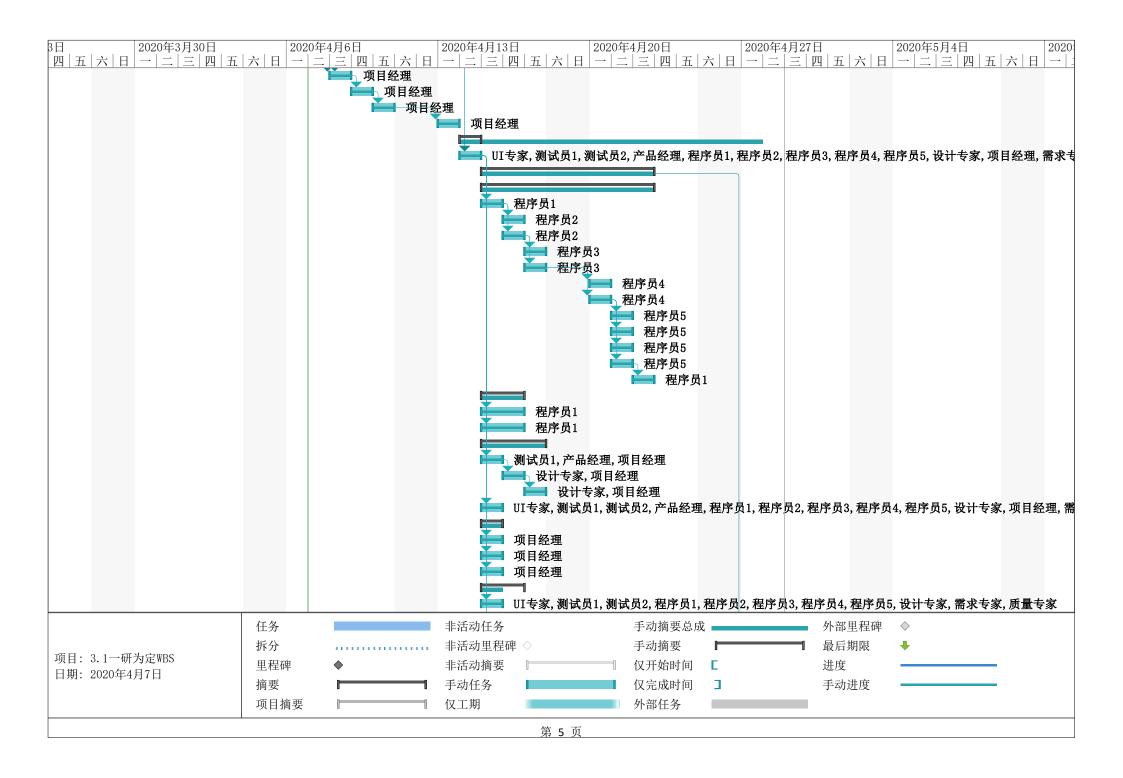

3日	2020年3月30日 一 二 三 四 五	202	20年4月6日 二 三 四 五 六 日	2020年4月13日	202	0年4月20日	2020年	4月27日	2020年5月4日 一 二 三 四 五 <i>j</i>	2020
四五六日	一 二 四 五	六 日 一				<u> 二 四 五 </u> M试员2 产品经用	<u> </u>	二 四 五 <u>六 日</u> 5 日 2 程序日3 程序日	<u> </u>	
									4,程序员5,设计专家, ¹	
					(20, 00 = 0, 1 =)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			专家,项目经理,需求专	
								•		
							•		设计专家,项目经理,需	
								▮ UI专家,测试员1,7	产品经理,设计专家,项	目经理, 需求
		lr b		JL 17 -1. 1- 1-		7-1 by 7-1	D.	LI AR ET TE TO	^	
		任务		非活动任务		手动摘要总成	X -	外部里程碑	♦	
 项目: 3.1一研 <i>判</i>	a完WBS	拆分		非活动里程碑〈		手动摘要		最后期限	•	
项目: 3.1一研 <i>月</i> 日期: 2020年4月		里程碑	♦	非活动摘要		1 仅开始时间	Е	进度		
H /y] · 2020-P4/	ı. H	摘要		手动任务		仅完成时间	3	手动进度		
		项目摘要		仅工期		外部任务				
					第 6 页					
					 					
