


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	16日 三 四 五 六 日
1	→	启动	7 个工作日	2020年3月1	192020年3月2	7		¥8, 8	40.00
2	→	任命项目经理			92020年3月1		产品经理		00.00 产品经理
3	*	组建核心团队			92020年3月2		UI专家,测试员1		00.00 UI专家,
4	*	制定里程碑计划			92020年3月2		产品经理,项目组		20. 00
5	*	分析干系人	1 个工作日	2020年3月1	92020年3月2	4	产品经理,项目约		20. 00
6	*	制定项目章程			2020年3月2		产品经理,项目组		20. 00
7	*	项目启动大会			232020年3月2		产品经理,项目组		80.00
8	*	规划			242020年4月2		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		00. 00
9	*	规划范围			242020年3月3				<mark>20. 00</mark>
10	*	制定需求说明书			242020年3月2		需求专家		40.00
11	*	界面设计	1 个工作日	2020年3月2	252020年3月2	710	UI专家,设计专家	¥4	80.00
12	*	详细设计说明书	1 个工作日	2020年3月2	252020年3月2	610	设计专家	¥2	40.00
13	*	范围说明书	1 个工作日	2020年3月2	252020年3月2	610	项目经理		20. 00
14	*	创建WBS			262020年3月2		项目经理	¥3	20. 00
15	*	形成范围基准	1 个工作日	2020年3月2	272020年3月3	014	项目经理	¥3	<mark>20. 00</mark>
16	*	规划时间	17 个工作日	12020年3月3	3(2020年4月2	1		¥1, 9	<mark>20. 00</mark>
17	*	排列工作包顺序			312020年4月6		项目经理	¥6	40.00
18	*	估算资源	1 个工作日	2020年3月3	802020年4月1	F 17	项目经理	¥3	<mark>20. 00</mark>
19	*	估算持续时间	1 个工作日	2020年3月3	312020年4月2	F 18	项目经理	¥3	<mark>20. 00</mark>
20	*	制定进度计划	1 个工作日	2020年4月1	[2020年4月7	E 19	项目经理	¥3	<mark>20. 00</mark>
21	*	形成进度基准	1 个工作日	2020年4月2	2[2020年4月2	120	项目经理	¥3	<mark>20. 00</mark>
22	*	规划成本			3 2020年4月2				<mark>40. 00</mark>
23	✓ 🖈	项目成本估算			3 [2020年4月3		项目经理		¥0.00
24	*	项目预算	1 个工作日	2020年4月6	5[2020年4月9	E23	项目经理	¥3	<mark>20. 00</mark>
25	*	形成范围基准	1 个工作日	2020年4月7	[2020年4月2	224	项目经理	¥3	<mark>20. 00</mark>
26	*	规划质量			3(2020年4月2			¥4	<mark>80. 00</mark>
27	*	制定测试计划	1 个工作日	2020年3月3	802020年4月1	£15	质量专家	¥2	40.00
28	*	制定测试用例			312020年4月2		质量专家	¥2	40.00
29	*	规划人力资源	7 个工作日	2020年3月3	312020年4月8	1		¥6.	<mark>40. 00</mark>
30	*	制定人力资源计划	1 个工作日	2020年3月3	312020年4月3	E 18	项目经理	¥3	<mark>20. 00</mark>
31	*	制定人员配备管理计划	划1 个工作日	2020年4月1	[2020年4月8	E30	项目经理	¥3	<mark>20. 00</mark>
32	*	规划沟通	12 个工作日	12020年4月2	212020年4月1	7			<mark>20. 00</mark>
33	*	制定沟通管理计划			2[2020年4月1		项目经理	¥3	<mark>20. 00</mark>
34	*	规划风险	5 个工作日	2020年4月8	3 2020年4月1	4			<mark>60. 00</mark>
		任务		非活动任务		手动摘要总成	<u> </u>	外部里程碑	>
		I 11		非活动里程碑	\Diamond	手动摘要		最后期限	
项目:	一研为定	里程碑 ◆		非活动摘要		一 仅开始时间		进度 -	_
日期:	2020年4月8日				И				
		摘要		手动任务		Q 完成时间	3	手动进度	
		项目摘要 🏲		仅工期		外部任务			
		1			第 1 页				


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	16E	
35	*	识别风险	1 个丁作日	2020年4月	8 2020年4月10	6 22 26 29	项目经理		¥320.00	
36	→	风险分析	1 个工作日	2020年4月	9 2020年4月133	85	项目经理		¥320.00	
37	→	制定风险登记册			102020年4月143		项目经理		¥320.00	
38	*	规划整合			132020年4月233		项目经理		¥320.00	
39	-5	执行与监控			142020年5月13		NH2E.E		, 400. 00	
40	*	组建项目团队			142020年4月158	}	UI专家,测试员1		,800.00	
41	<u></u>	项目执行			152020年5月13		(>3) () () () ()		, 760. 00	
42	-3	用户模块	21 个工作日	2020年4月	152020年5月13				,720.00	
43	*	注册登录			152020年5月124	10	程序员1		, 640. 00	
44	-3	浏览院校专业			152020年5月134		程序员2		¥280.00	
45	*	查询院校专业			162020年4月204		程序员2		¥280.00	
46	-3	发表文章			172020年4月214		程序员3		¥280.00	
47	*	回复文章	1 个工作日	2020年4月	172020年4月204	5	程序员3		¥280.00	
48	-3	每日打卡	1 个工作日	2020年4月	202020年4月214	7	程序员4		¥280.00	
49	*	添加学习任务	1 个工作日	2020年4月	202020年4月224	7	程序员4		¥280.00	
50	*	考研自习室	1 个工作日	2020年4月	232020年4月274	19	程序员4		¥280.00	
51	-5	考研真题资料	1 个工作日	2020年4月	212020年4月234	19	程序员5		¥280.00	
52	*	考研网课	1 个工作日	2020年4月	212020年4月274	19	程序员5		¥280.00	
53	*	考研答疑	1 个工作日	2020年4月	212020年4月244	19	程序员5		¥280.00	
54	-5	个人中心	1 个工作日	2020年4月	222020年4月275	53	程序员1		¥280.00	
55	*	管理员模块	6 个工作日	2020年4月	152020年4月22			¥1	,040.00	
56	-5	数据分析	2 个工作日	2020年4月	212020年4月224	-0	需求专家		¥480.00	
57	*	信息资料收集			152020年4月224		程序员1		¥560.00	
58	*	项目监控			152020年5月5			¥6	, 200. 00	
59	*	各项指标监控	1 个工作日	2020年4月	152020年4月164	-0	测试员1,产品经	¥1	, 280. 00	
60	*	监控评审	2 个工作日	2020年4月	162020年4月205	59	设计专家,项目组		¥560.00	
61	*	变更评审	2 个工作日	2020年4月	172020年5月5 6	60	设计专家,项目组		¥560.00	
62	-5	例会	1 个工作日	2020年4月	152020年4月164	10	UI专家,测试员1	¥3	,800.00	
63	*	管理干系人	12 个工作日	12020年4月	152020年4月30				¥960.00	
64	-5	发布项目信息	1 个工作日	2020年4月	152020年4月27年		项目经理		¥320.00	
65		报告监控指标	1 个工作日	2020年4月	152020年4月294	10	项目经理		¥320.00	
66	-5	干系人沟通			152020年4月304	10	项目经理		¥320.00	
67	*	团队建设	15 个工作日	32020年4月	152020年5月5				, 600. 00	
68	*	培训	1 个工作日	2020年5月	5 2020年5月5 4	10	UI专家,测试员1	¥1	, 280. 00	
		任务		非活动任务		手动摘要总质	- \(\frac{1}{2}\)	外部里程碑	♦	
		拆分			始 <	手动摘要			•	
 项目: 一研	开为定			非活动里程码	许、		ı I	最后期限	•	
日期: 2020		里程碑	♦	非活动摘要		仅开始时间	Е	进度		
	, -/ •	摘要		手动任务		仅完成时间	3	手动进度		
		项目摘要		仅工期		外部任务				
					第 2 页					
					<u> </u>					


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	16日 三 四 五 六 日
69	*	娱乐活动	2 个工作日	2020年4月1	52020年4月	1740	UI专家,测试员1	¥3, 520. 0	
70	*	沟通	2 个工作日	2020年4月1	52020年4月	1740	UI专家,测试员1	¥3,800.0	00
71	*	项目验收	1 个工作日	2020年4月2	72020年4月	2841	UI专家,产品经理	¥2,080.0	00
72	*	收尾	8 个工作日	2020年4月2	82020年5月	71		¥4, 320. 0	00
73	5	项目终检		2020年4月2			UI专家,产品经理		00
74	*	项目内部收尾	3 个工作日	2020年4月2	82020年5月	7 [71	UI专家,测试员1	¥2, 240. 0	<mark>)O</mark>




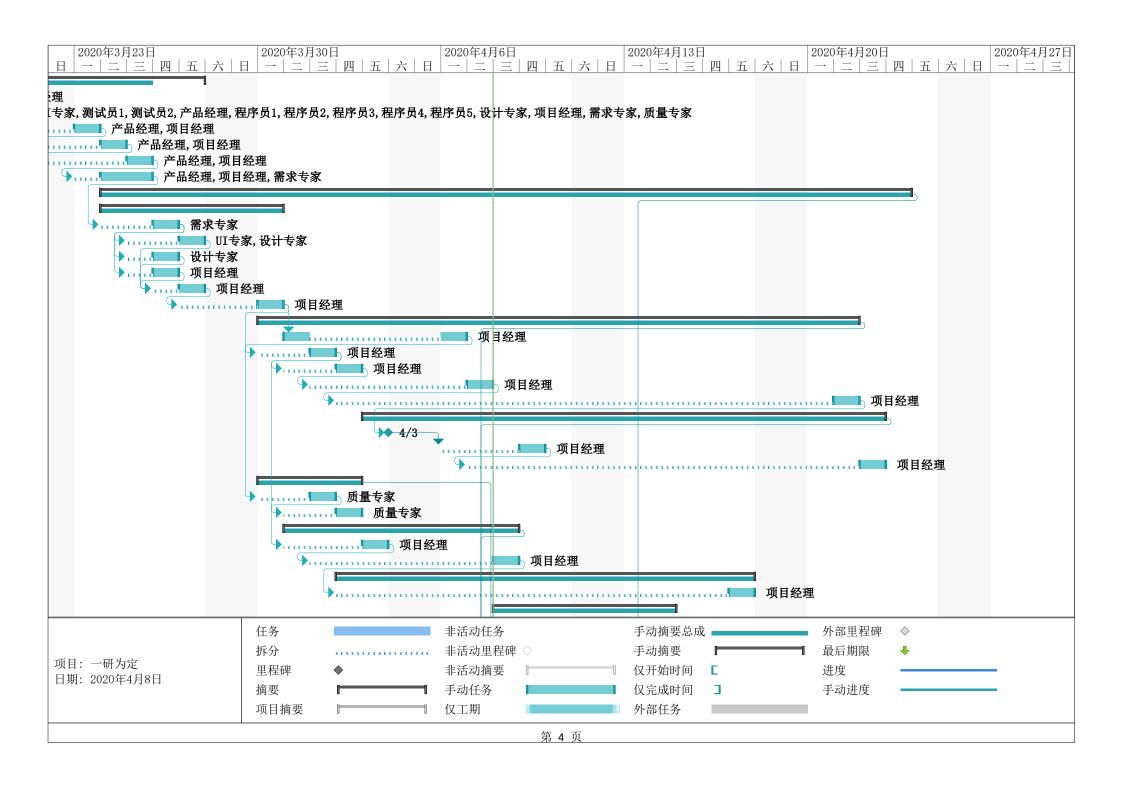

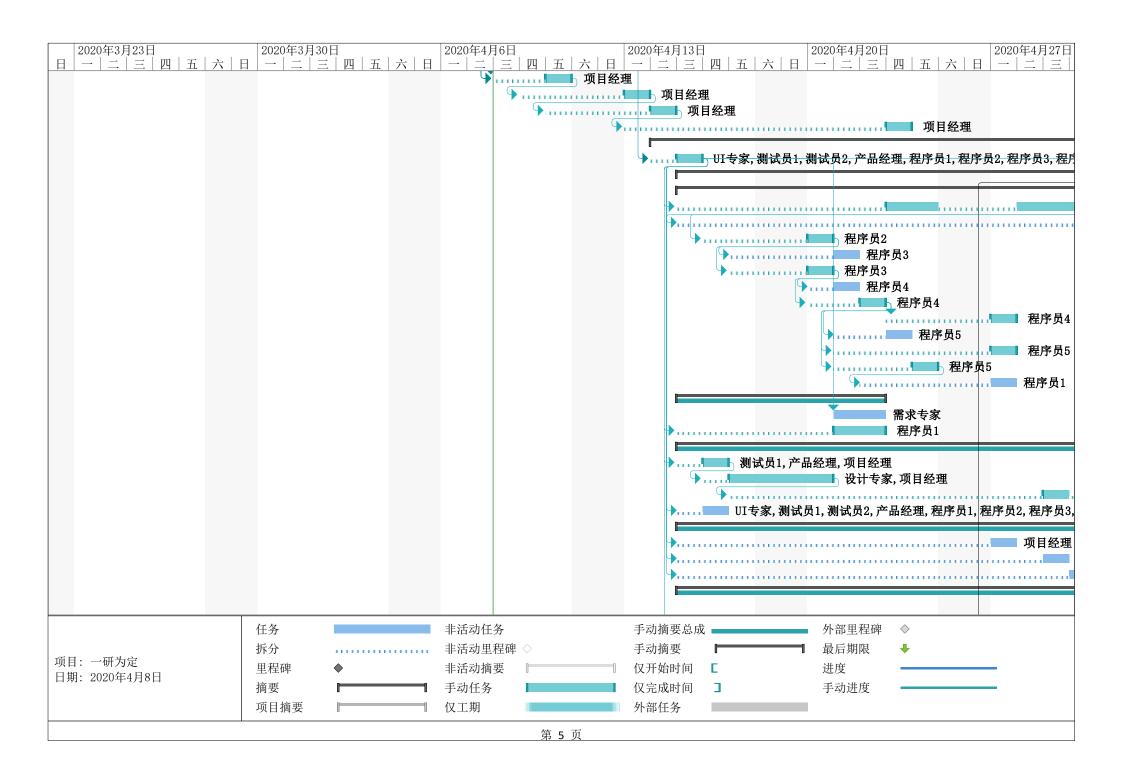

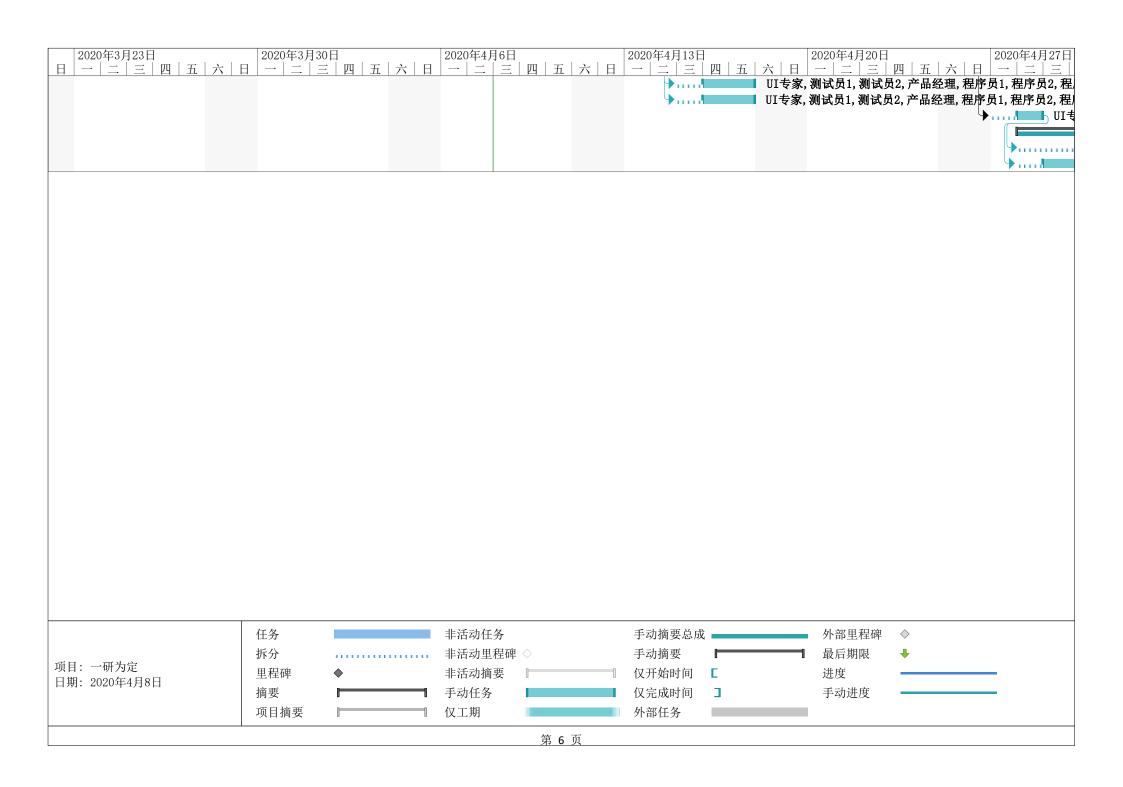

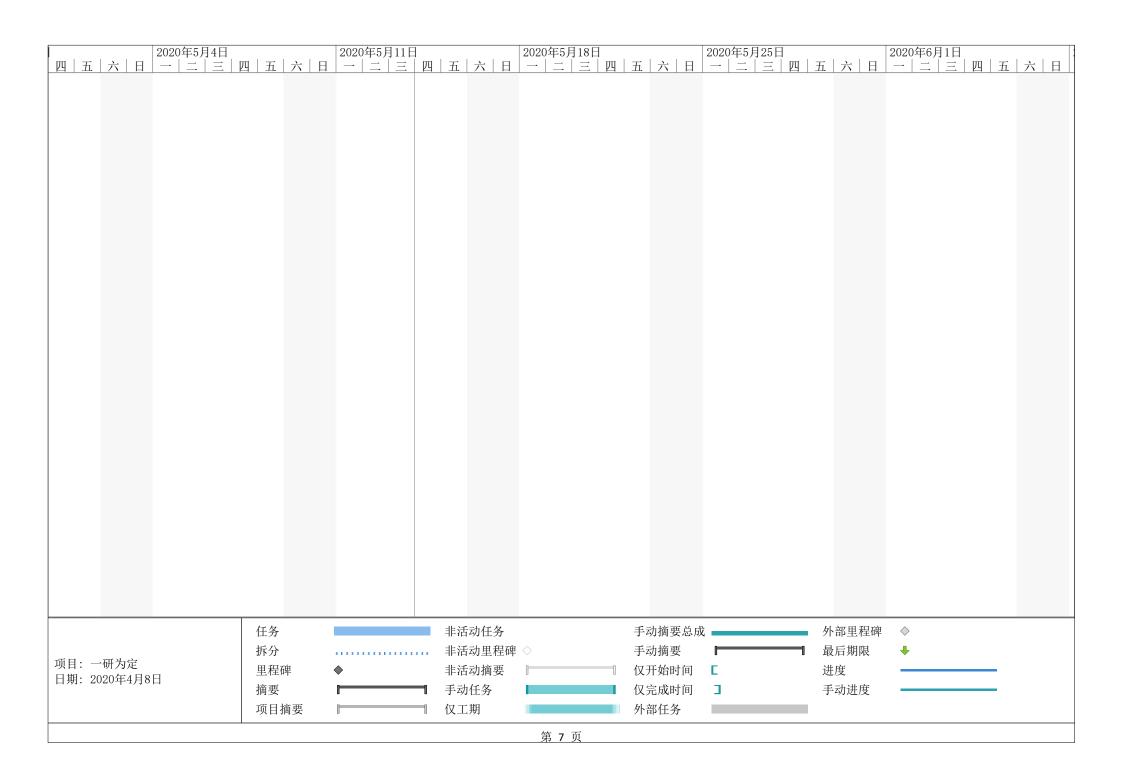

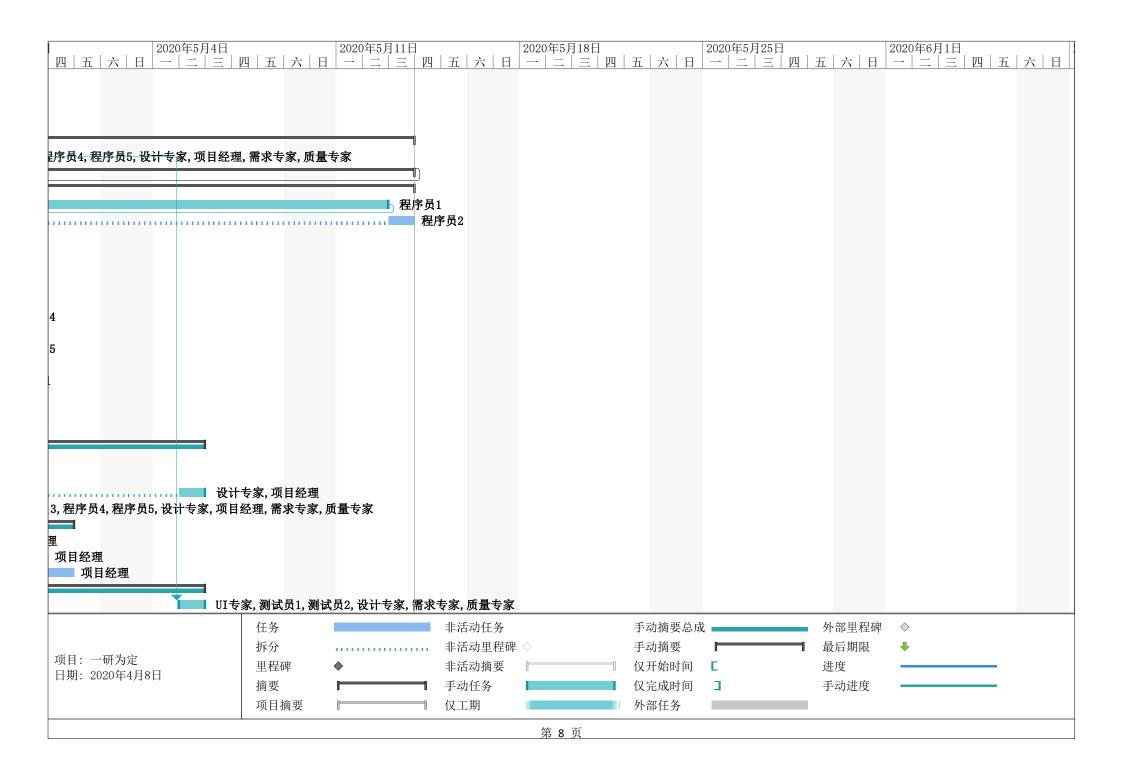

程序员3,程序员5,设计专家,项目经程序员3,程序员4,程序员5,设计专家专家,产品经理,设计专家,项目经理	7, 项目经理, 需求 1, 需求专家, 质量 ━━♪ 5/7 UI专家, 产品经理	量专家 专家,质量专家		量专家	四 五 六 日	2020年5月25 一 二 三	日 <u>: 四 五</u>		2020年6月1日 一 二 三	四 五	六 日
	01 Y 201, 10g	(M, M, Σ, Σ, M, Σ, Σ, M,	《分,外日社社	;	4 4 204						
项目: 一研为定 日期: 2020年4月8日	任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要	*	非活动任务 非活动里程碑 非活动摘要 手动任务 仅工期		手动摘要总成 手动摘要 【一】 仅开始时间 【1】 仅完成时间 【2】 外部任务	戊 []	———	下部里程碑 设后期限 注度 上动进度	♦		
