


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	
1	<u>→</u>	启动	7 个工作日	2020年3月1	192020年3月2			¥8, 840. 00	¥3, 890. 00	
2	→	任命项目经理			92020年3月19		产品经理	¥800.00		
3	*	组建核心团队			92020年3月20		UI专家,测试			
4	*	制定里程碑计划	1 个工作日	2020年3月1	92020年3月2		产品经理,项			
5	*	分析干系人			92020年3月24		产品经理,项)
6	*	制定项目章程	1 个工作日	2020年3月2	2020年3月25	2, 3, 4, 5	产品经理,项		¥720.00) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
7	*	项目启动大会	2 个工作日	2020年3月2	232020年3月25	6	产品经理,项			
8	*	规划	23 个工作日	2020年3月2	242020年4月2			¥7, 200. 00	¥7, 200. 00)
9	*	规划范围			242020年3月3			¥1, 920. 00	¥1, 920. 00)
10	*	制定需求说明书	1 个工作日	2020年3月2	242020年3月26	7	需求专家	¥240.00	¥240.00)
11	*	界面设计			252020年3月2		UI专家,设计	¥480.00	¥480.00)
12	*	详细设计说明书	1 个工作日	2020年3月2	252020年3月26	10	设计专家	¥240.00	¥240.00)
13	*	范围说明书			252020年3月26		项目经理	¥320.00		
14	*	创建WBS			262020年3月2		项目经理	¥320.00		
15	*	形成范围基准			272020年3月30		项目经理	¥320.00	¥320.00)
16	*	规划时间			3(2020年4月2			¥1, 920. 00	¥1, 920. 00)
17	*	排列工作包顺序	2 个工作日	2020年3月3	312020年4月6	15	项目经理	¥640.00	¥640.00)
18	*	估算资源			802020年4月1		项目经理	¥320.00		
19	*	估算持续时间	1 个工作日	2020年3月3	312020年4月2	18	项目经理	¥320.00		
20	*	制定进度计划	1 个工作日	2020年4月1	[2020年4月7	19	项目经理	¥320.00		
21	*	形成进度基准			2[2020年4月2]		项目经理	¥320.00	¥320.00	<mark>)</mark>
22	*	规划成本	14 个工作日	12020年4月3	3 2020年4月2			¥640.00		
	√ 🖈	项目成本估算	0 个工作日	2020年4月3	3 [2020年4月3		项目经理	¥0.00		
24	*	项目预算			5月2020年4月9		项目经理	¥320.00		
25	*	形成范围基准			7 [2020年4月22		项目经理	¥320.00		
26	*	规划质量			3(2020年4月2			¥480.00		
27	*	制定测试计划			802020年4月1		质量专家	¥240.00		
28	*	制定测试用例			312020年4月2		质量专家	¥240.00	¥240.00	<mark>)</mark>
29	*	规划人力资源			312020年4月8			¥640.00		
30	*	制定人力资源计划			312020年4月3		项目经理	¥320.00		
31	*	制定人员配备管理计划					项目经理	¥320.00		
32	*	规划沟通			2 2020年4月1			¥320.00		
33	*	制定沟通管理计划			2 [2020年4月1]		项目经理	¥320.00		
34	*	规划风险	5 个工作日	2020年4月8	3 2020年4月1			¥960.00	¥960.00)
		任务		非活动任务		手动摘罗	要总成	外部里科		
		15.0			\wedge	手动摘				
项目:	一研为定			非活动里程碑				最后期降	X •	
	2020年4月8日	里程碑 ◆		非活动摘要		□ 仅开始□		进度		
	, -/ • -	摘要		手动任务		【 仅完成日	寸间 📘	手动进展	度	
		项目摘要 『		仅工期		外部任务	为			
		I			第 1 页					


40 ★ 组建项目团队 1 个工作日 2020年4月142020年4月158 UI专家,测试 ¥3,800.00 41 馬 項目执行 21 个工作日2020年4月152020年5月15 ¥7,760.00 42 用户模块 21 个工作日2020年4月152020年5月15 ¥6,720.00	¥320. 00 ¥320. 00 ¥320. 00 ¥320. 00 ¥37, 000. 00 ¥3, 400. 00 ¥7, 760. 00 ¥6, 720. 00 ¥3, 640. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00	四一五一方
36	¥320. 00 ¥320. 00 ¥320. 00 £27, 000. 00 ¥3, 400. 00 ¥6, 720. 00 ¥3, 640. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00	
割定风险登记册	¥320. 00 ¥320. 00 £27, 000. 00 ¥3, 400. 00 ¥7, 760. 00 ¥6, 720. 00 ¥3, 640. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00	
規划整合	¥320. 00 £27, 000. 00 ¥3, 400. 00 ¥7, 760. 00 ¥6, 720. 00 ¥3, 640. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00	
39	\$27,000.00 \$\\ \pma_3,400.00\$ \$\\ \pma_7,760.00\$ \$\\ \pma_6,720.00\$ \$\\ \pma_3,640.00\$ \$\\ \pma_280.00\$ \$\\ \pma_280.00\$ \$\\ \pma_280.00\$ \$\\ \pma_280.00\$ \$\\ \pma_280.00\$	
40	¥3, 400. 00 ¥7, 760. 00 ¥6, 720. 00 ¥3, 640. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00	
42 用户模块 21 个工作日2020年4月152020年5月15 ¥6,720.00 43 注册登录 13 个工作日2020年4月152020年5月1240 程序员1 ¥3,640.00 44 浏览院校专业 1 个工作日 2020年4月152020年5月1343 程序员2 ¥280.00 45 查询院校专业 1 个工作日 2020年4月162020年4月2043 程序员2 ¥280.00 46 发表文章 1 个工作日 2020年4月172020年4月2145 程序员3 ¥280.00 47 回复文章 1 个工作日 2020年4月172020年4月2045 程序员3 ¥280.00	¥6, 720. 00 ¥3, 640. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00	
43 注册登录 13 个工作日 2020年4月152020年5月1240 程序员1 ¥3,640.00 44 浏览院校专业 1 个工作日 2020年4月152020年5月1343 程序员2 ¥280.00 45 查询院校专业 1 个工作日 2020年4月162020年4月2043 程序员2 ¥280.00 46 发表文章 1 个工作日 2020年4月172020年4月2145 程序员3 ¥280.00 47 回复文章 1 个工作日 2020年4月172020年4月2045 程序员3 ¥280.00	¥3, 640. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00	
44 浏览院校专业 1 个工作日 2020年4月152020年5月1343 程序员2 ¥280.00 45 查询院校专业 1 个工作日 2020年4月162020年4月2043 程序员2 ¥280.00 46 发表文章 1 个工作日 2020年4月172020年4月2145 程序员3 ¥280.00 47 回复文章 1 个工作日 2020年4月172020年4月2045 程序员3 ¥280.00	¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00	
45 查询院校专业 1 个工作日 2020年4月162020年4月2043 程序员2 ¥280.00 46 发表文章 1 个工作日 2020年4月172020年4月2145 程序员3 ¥280.00 47 回复文章 1 个工作日 2020年4月172020年4月2045 程序员3 ¥280.00	¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00	
46	¥280. 00 ¥280. 00 ¥280. 00	
47 ■ 回复文章 1 个工作日 2020年4月172020年4月2045 程序员3 ¥280.00	¥280. 00 ¥280. 00	
	¥280.00	
48 □ ■ 毎日打卡 1 个工作日 2020年4月202020年4月2147 程序员4 ¥280.00		
	¥280_00	
49 ★ 添加学习任务 1 个工作日 2020年4月202020年4月2247 程序员4 ¥280.00		
50 ★ 考研自习室 1 个工作日 2020年4月232020年4月2749 程序员4 ¥280.00	¥280.00	
51 考 研真题资料 1 个工作日 2020年4月212020年4月2349 程序员5 ¥280.00	¥280.00	
52 ★ 考研网课 1 个工作日 2020年4月212020年4月2749 程序员5 ¥280.00	¥280.00	
53 ★ 考研答疑 1 个工作日 2020年4月212020年4月2449 程序员5 ¥280.00	¥280.00	
54 一 个人中心 1 个工作日 2020年4月222020年4月2753 程序员1 ¥280.00	¥280.00	
	¥1,040.00	
56 ■ 数据分析 2 个工作日 2020年4月212020年4月2240 需求专家 ¥480.00	¥480.00	
57	¥560.00	
	¥5, 400.00	
59 ★ 各项指标监控 1 个工作日 2020年4月152020年4月1640 测试员1,产品 ¥1,280.00	¥880.00	
60 ★ 监控评审 2 个工作日 2020年4月162020年4月2059 设计专家,项 ▼ ¥560.00	¥560.00	
61	¥560.00	
	¥3, 400.00	
63 管理干系人 12 个工作日2020年4月152020年4月30 ¥960.00	¥960.00	
64 □ 	¥320.00	
65	¥320.00	
66 ───────────────────────────────────	¥320.00	
	¥7,800.00	
68 ★ 培训 1 个工作日 2020年5月5 [2020年5月5 [40 UI专家,测试 ¥1,280.00	¥1, 280. 00	
任务 非活动任务 手动摘要总成 ———— 外部里程碑	\Diamond	
	•	
项目, ,	•	
日期: 2020年4月8日		_
摘要 ■ ■ 手动任务 ■ 【		_
项目摘要		
第 2 页		


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	16日 三 四 五 六
69	*	娱乐活动	2 个工作日	2020年4月1	2020年4月	1740	UI专家,测试	¥3, 520. 00	¥3, 120. 00	
70	*	沟通	2 个工作日	2020年4月1	52020年4月	1740	UI专家,测试	¥3,800.00	¥3, 400.00	
71	*	项目验收	1 个工作日	2020年4月27	72020年4月	2841	UI专家,产品	₹2,080.00	¥1,680.00	
72	*	收尾	8 个工作日	2020年4月2	82020年5月	[7]		¥4, 320. 00	¥3, 520. 00	
73	-5	项目终检	1 个工作日	2020年4月28	82020年5月	6[71	UI专家,产品	₹2,080.00	¥1,680.00	
74	*	项目内部收尾	3 个工作日	2020年4月28	82020年5月	7 [71	UI专家,测试	¥2, 240. 00	¥1,840.00	




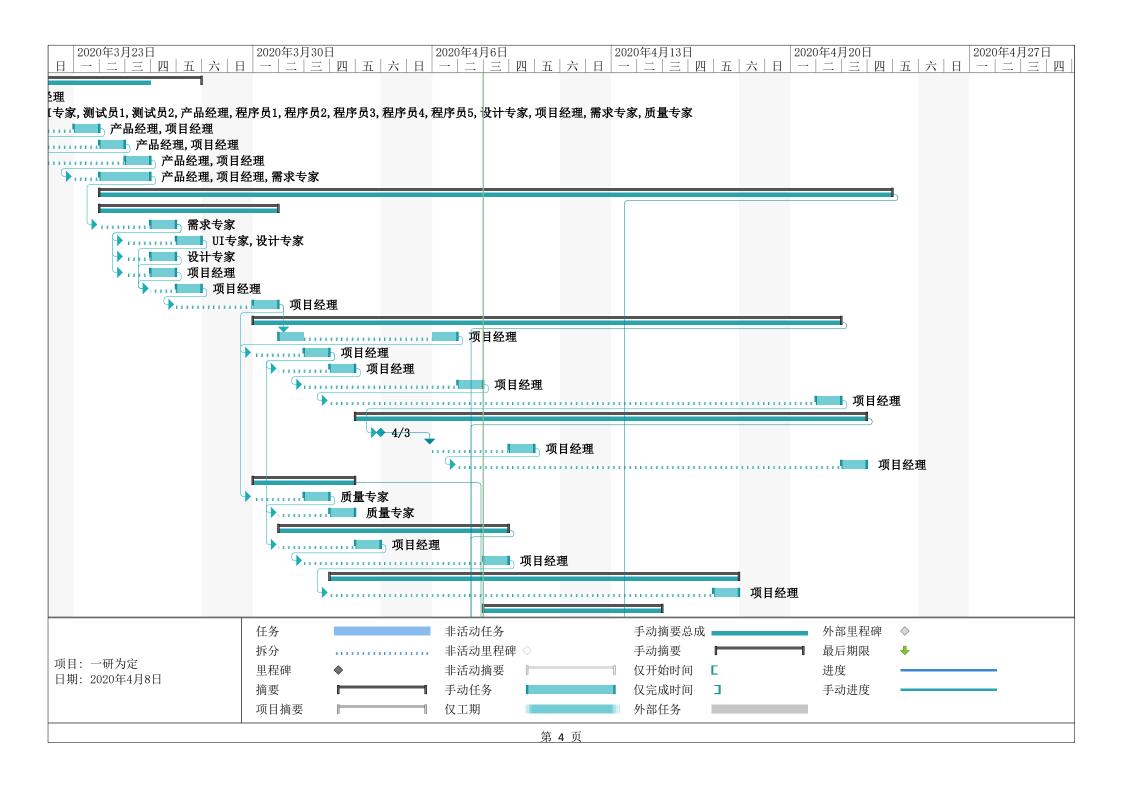

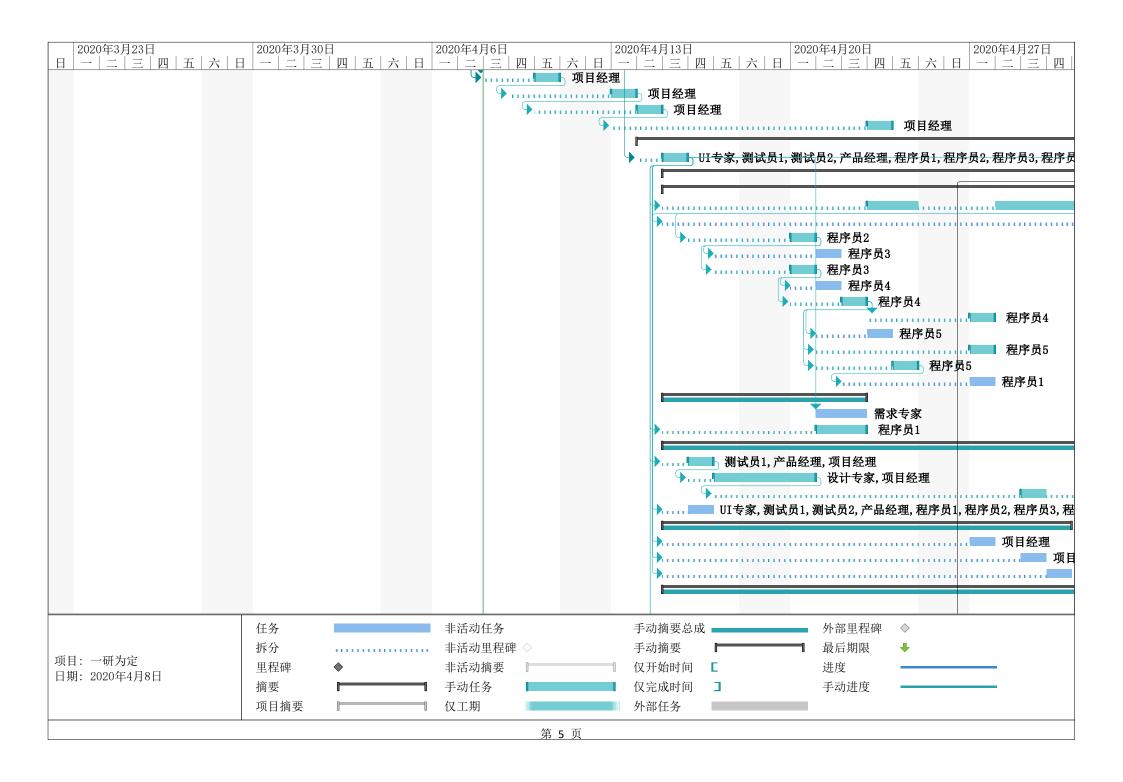

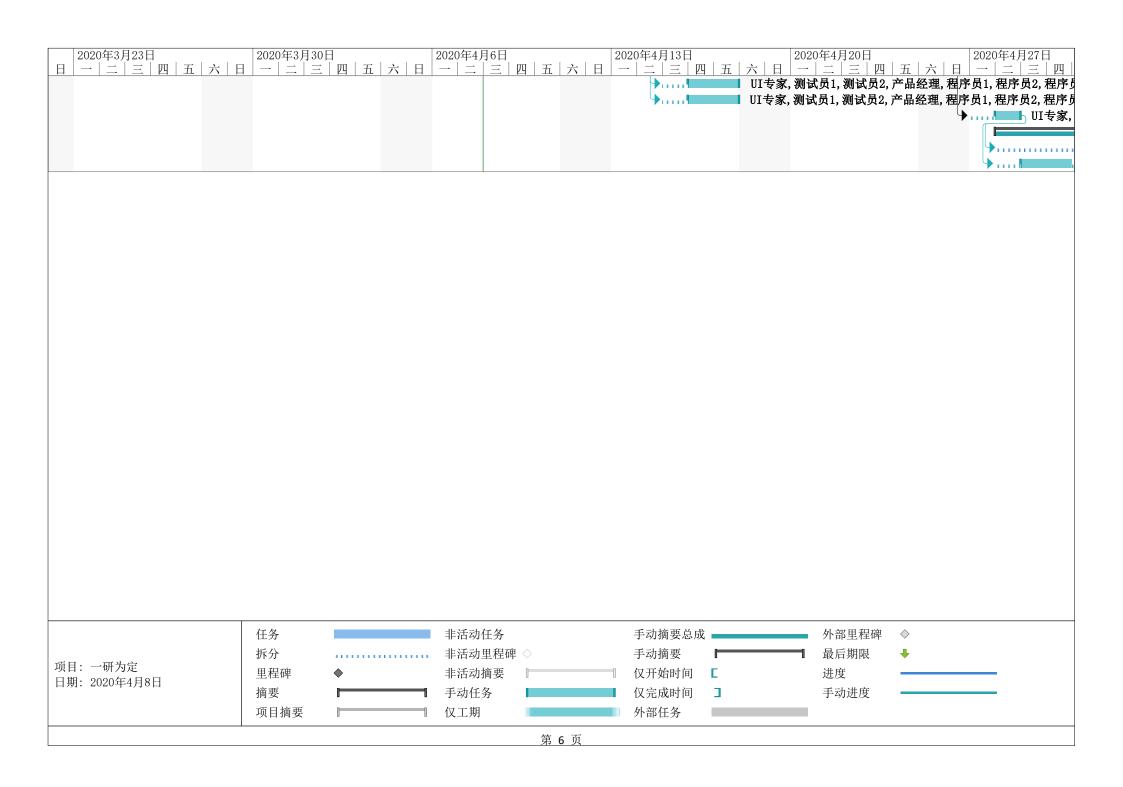

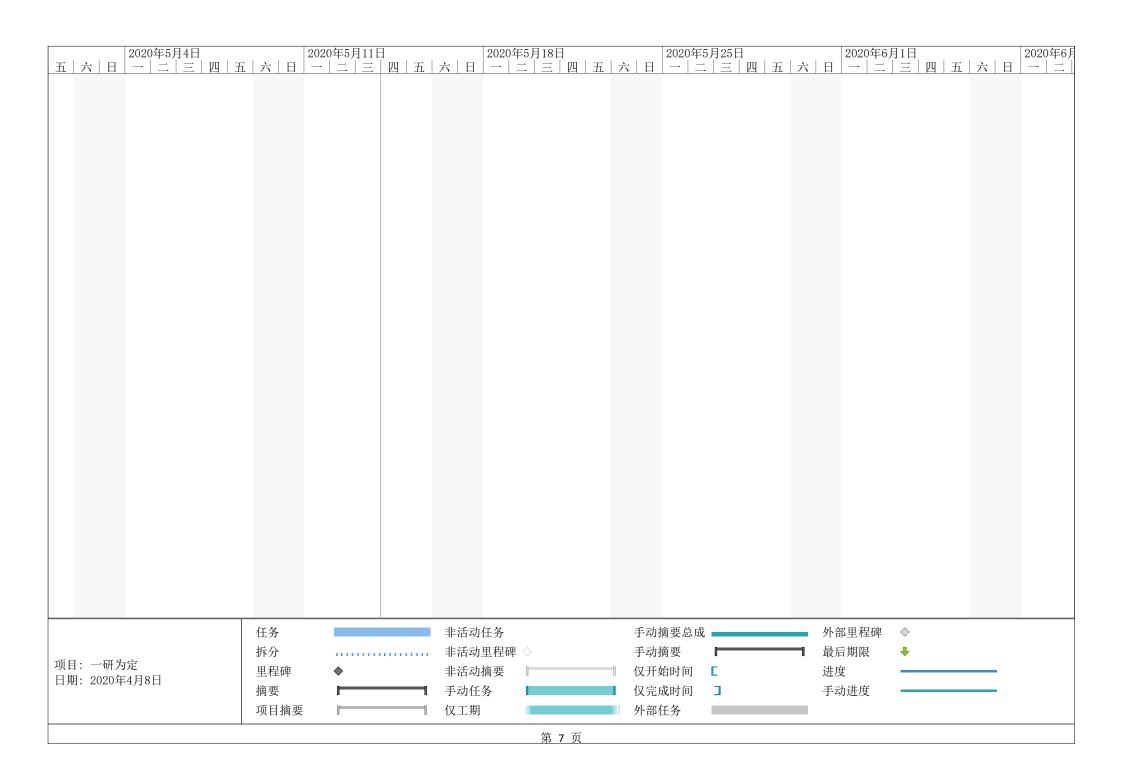

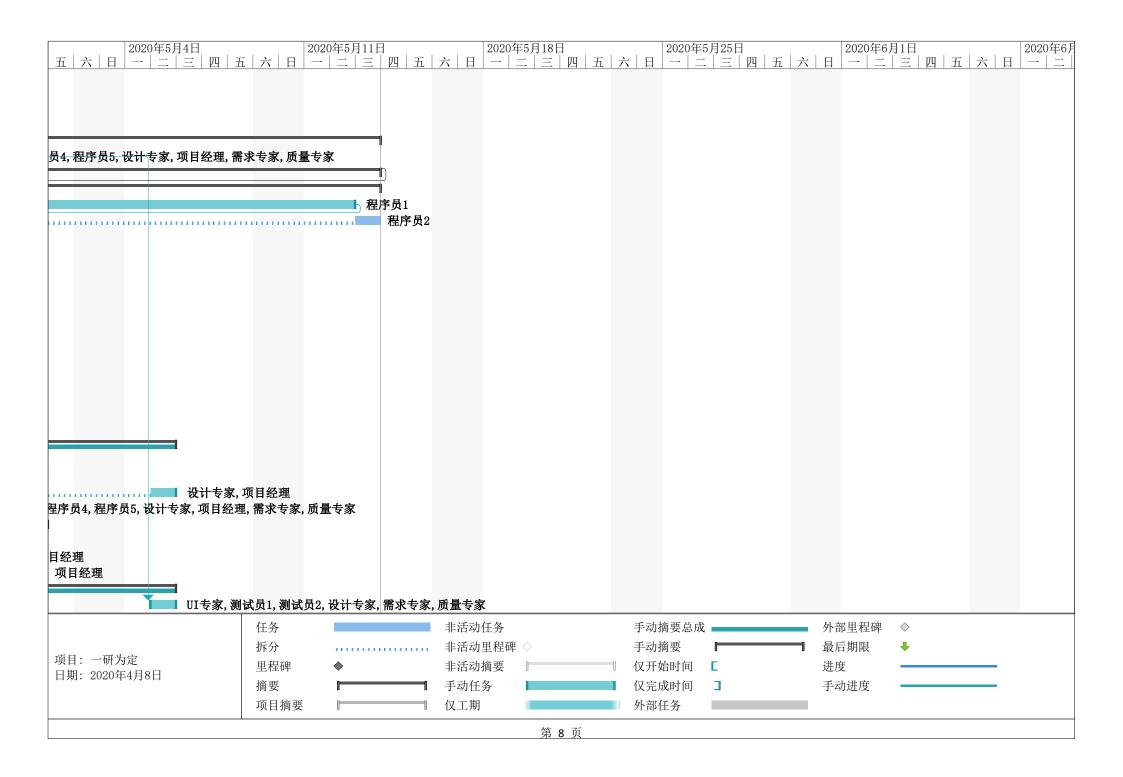

2020年5月4日 五 六 日 一 二 三 四 五	$\begin{vmatrix} 202 \\ + \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 \\ - \end{vmatrix}$	0年5月11日 二 三 四 五	2020年	F5月18日 二 三 四 五 <i>弁</i>	- 2020年	5月25日 - ニー皿 エー会	2020年6	月1日 三 四 五 六 日	2020年6月 一 二
· 员3, 程序员5, 设计专家, 项目经理, 需	. /	<u> </u>	/	<u> </u>	<u> </u>	<u>- 二 四 Д Л</u>	\		
员3,程序员4,程序员5,设计专家,项									
,产品经理,设计专家,项目经理,需求									
5									
		专家,项目经理,需求 , 产品经理, 设计专家,							
	1 专家, 恢 版及1,) 加红座, 仅月マ家,	炒日红坯, 而	マダ・川里マダ					
	任务		非活动任务		手动摘要总成	;	外部里程碑	♦	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要心成手动摘要		最后期限	•	
项目: 一研为定		•				-			
日期: 2020年4月8日	里程碑		非活动摘要	u U	仅开始时间	E	进度		
	摘要		手动任务		仅完成时间]	手动进度		
	项目摘要		仅工期		外部任务		l		
				第 9 页					
