


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	月16日	三	四	五	六
1		启动	7 个工作日	2020年3月19	2020年3月27日			¥8,840.00	¥3,890.00					
2		任命项目经理	1 个工作日	2020年3月19	2020年3月19日		产品经理	¥800.00	¥400.00					
3		组建核心团队	1 个工作日	2020年3月19	2020年3月20日		UI专家, 测试	¥3,800.00	¥850.00					
4		制定里程碑计划	1 个工作日	2020年3月19	2020年3月23日		产品经理, 项	¥1,120.00	¥720.00					
5		分析干系人	1 个工作日	2020年3月19	2020年3月24日		产品经理, 项	¥1,120.00	¥720.00					
6		制定项目章程	1 个工作日	2020年3月20	2020年3月25日	2, 3, 4, 5	产品经理, 项	¥1,120.00	¥720.00					
7		项目启动大会	2 个工作日	2020年3月23	2020年3月25日	6	产品经理, 项	¥880.00	¥480.00					
8		规划	23 个工作日	2020年3月24	2020年4月23日			¥7,200.00	¥7,200.00					
9		规划范围	5 个工作日	2020年3月24	2020年3月30日			¥1,920.00	¥1,920.00					
10		制定需求说明书	1 个工作日	2020年3月24	2020年3月26日	7	需求专家	¥240.00	¥240.00					
11		界面设计	1 个工作日	2020年3月25	2020年3月27日	10	UI专家, 设计	¥480.00	¥480.00					
12		详细设计说明书	1 个工作日	2020年3月25	2020年3月26日	10	设计专家	¥240.00	¥240.00					
13		范围说明书	1 个工作日	2020年3月25	2020年3月26日	10	项目经理	¥320.00	¥320.00					
14		创建WBS	1 个工作日	2020年3月26	2020年3月27日	11, 12, 13	项目经理	¥320.00	¥320.00					
15		形成范围基准	1 个工作日	2020年3月27	2020年3月30日	14	项目经理	¥320.00	¥320.00					
16		规划时间	17 个工作日	2020年3月30	2020年4月21日			¥1,920.00	¥1,920.00					
17		排列工作包顺序	2 个工作日	2020年3月31	2020年4月6日	15	项目经理	¥640.00	¥640.00					
18		估算资源	1 个工作日	2020年3月30	2020年4月1日	17	项目经理	¥320.00	¥320.00					
19		估算持续时间	1 个工作日	2020年3月31	2020年4月2日	18	项目经理	¥320.00	¥320.00					
20		制定进度计划	1 个工作日	2020年4月1日	2020年4月7日	19	项目经理	¥320.00	¥320.00					
21		形成进度基准	1 个工作日	2020年4月2日	2020年4月21日	20	项目经理	¥320.00	¥320.00					
22		规划成本	14 个工作日	2020年4月3日	2020年4月22日			¥640.00	¥640.00					
23		项目成本估算	0 个工作日	2020年4月3日	2020年4月3日	21	项目经理	¥0.00	¥0.00					
24		项目预算	1 个工作日	2020年4月6日	2020年4月9日	23	项目经理	¥320.00	¥320.00					
25		形成范围基准	1 个工作日	2020年4月7日	2020年4月22日	24	项目经理	¥320.00	¥320.00					
26		规划质量	4 个工作日	2020年3月30	2020年4月2日			¥480.00	¥480.00					
27		制定测试计划	1 个工作日	2020年3月30	2020年4月1日	15	质量专家	¥240.00	¥240.00					
28		制定测试用例	1 个工作日	2020年3月31	2020年4月2日	27	质量专家	¥240.00	¥240.00					
29		规划人力资源	7 个工作日	2020年3月31	2020年4月8日			¥640.00	¥640.00					
30		制定人力资源计划	1 个工作日	2020年3月31	2020年4月3日	18	项目经理	¥320.00	¥320.00					
31		制定人员配备管理计划	1 个工作日	2020年4月1日	2020年4月8日	30	项目经理	¥320.00	¥320.00					
32		规划沟通	12 个工作日	2020年4月2日	2020年4月17日			¥320.00	¥320.00					
33		制定沟通管理计划	1 个工作日	2020年4月2日	2020年4月17日	31	项目经理	¥320.00	¥320.00					
34		规划风险	5 个工作日	2020年4月8日	2020年4月14日			¥960.00	¥960.00					



项目：一研为定 估算资源 成本
日期：2020年4月29日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	月16日	三	四	五	六
35		识别风险	1 个工作日	2020年4月8日	2020年4月10日	16, 22, 26,	项目经理	¥320.00	¥320.00					
36		风险分析	1 个工作日	2020年4月9日	2020年4月13日	35	项目经理	¥320.00	¥320.00					
37		制定风险登记册	1 个工作日	2020年4月10日	2020年4月14日	36	项目经理	¥320.00	¥320.00					
38		规划整合	1 个工作日	2020年4月13日	2020年4月23日	37	项目经理	¥320.00	¥320.00					
39		执行与监控	22 个工作日	2020年4月14日	2020年5月13日			¥29,400.00	¥27,000.00					
40		组建项目团队	1 个工作日	2020年4月14日	2020年4月15日	8	UI专家, 测试	¥3,800.00	¥3,400.00					
41		项目执行	21 个工作日	2020年4月15日	2020年5月13日			¥7,760.00	¥7,760.00					
42		用户模块	21 个工作日	2020年4月15日	2020年5月13日			¥6,720.00	¥6,720.00					
43		注册登录	13 个工作日	2020年4月15日	2020年5月12日	40	程序员1	¥3,640.00	¥3,640.00					
44		浏览院校专业	1 个工作日	2020年4月15日	2020年5月13日	43	程序员2	¥280.00	¥280.00					
45		查询院校专业	1 个工作日	2020年4月16日	2020年4月20日	43	程序员2	¥280.00	¥280.00					
46		发表文章	1 个工作日	2020年4月17日	2020年4月21日	45	程序员3	¥280.00	¥280.00					
47		回复文章	1 个工作日	2020年4月17日	2020年4月20日	45	程序员3	¥280.00	¥280.00					
48		每日打卡	1 个工作日	2020年4月20日	2020年4月21日	47	程序员4	¥280.00	¥280.00					
49		添加学习任务	1 个工作日	2020年4月20日	2020年4月22日	47	程序员4	¥280.00	¥280.00					
50		考研自习室	1 个工作日	2020年4月23日	2020年4月27日	49	程序员4	¥280.00	¥280.00					
51		考研真题资料	1 个工作日	2020年4月21日	2020年4月23日	49	程序员5	¥280.00	¥280.00					
52		考研网课	1 个工作日	2020年4月21日	2020年4月27日	49	程序员5	¥280.00	¥280.00					
53		考研答疑	1 个工作日	2020年4月21日	2020年4月24日	49	程序员5	¥280.00	¥280.00					
54		个人中心	1 个工作日	2020年4月22日	2020年4月27日	53	程序员1	¥280.00	¥280.00					
55		管理员模块	6 个工作日	2020年4月15日	2020年4月22日			¥1,040.00	¥1,040.00					
56		数据分析	2 个工作日	2020年4月21日	2020年4月22日	40	需求专家	¥480.00	¥480.00					
57		信息资料收集	2 个工作日	2020年4月15日	2020年4月22日	40	程序员1	¥560.00	¥560.00					
58		项目监控	15 个工作日	2020年4月15日	2020年5月5日			¥6,200.00	¥5,400.00					
59		各项指标监控	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月16日	40	测试员1, 产品	¥1,280.00	¥880.00					
60		监控评审	2 个工作日	2020年4月16日	2020年4月20日	59	设计专家, 项	¥560.00	¥560.00					
61		变更评审	2 个工作日	2020年4月17日	2020年5月5日	60	设计专家, 项	¥560.00	¥560.00					
62		例会	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月16日	40	UI专家, 测试	¥3,800.00	¥3,400.00					
63		管理干系人	12 个工作日	2020年4月15日	2020年4月30日			¥960.00	¥960.00					
64		发布项目信息	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月27日	40	项目经理	¥320.00	¥320.00					
65		报告监控指标	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月29日	40	项目经理	¥320.00	¥320.00					
66		干系人沟通	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月30日	40	项目经理	¥320.00	¥320.00					
67		团队建设	15 个工作日	2020年4月15日	2020年5月5日			¥8,600.00	¥7,800.00					
68		培训	1 个工作日	2020年5月5日	2020年5月5日	40	UI专家, 测试	¥1,280.00	¥1,280.00					

项目：一研为定 估算资源 成本
日期：2020年4月29日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间




外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	月16日	三	四	五	六
69			娱乐活动	2 个工作日	2020年4月15	2020年4月17	E40	UI专家, 测试	¥3,520.00	¥3,120.00					
70			沟通	2 个工作日	2020年4月15	2020年4月17	E40	UI专家, 测试	¥3,800.00	¥3,400.00					
71			项目验收	1 个工作日	2020年4月27	2020年4月28	E41	UI专家, 产品	¥2,080.00	¥1,680.00					
72			收尾	12 个工作日	2020年4月28	2020年5月13	E		¥4,320.00	¥3,520.00					
73			项目终检	1 个工作日	2020年4月28	2020年5月6	71	UI专家, 产品	¥2,080.00	¥1,680.00					
74			项目内部收尾	1 个工作日	2020年4月28	2020年5月7	71	UI专家, 测试	¥2,240.00	¥1,840.00					

项目：一研为定 估算资源 成本
日期：2020年4月29日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务

仅工期










手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务













外部里程碑


最后期限


进度


手动进度










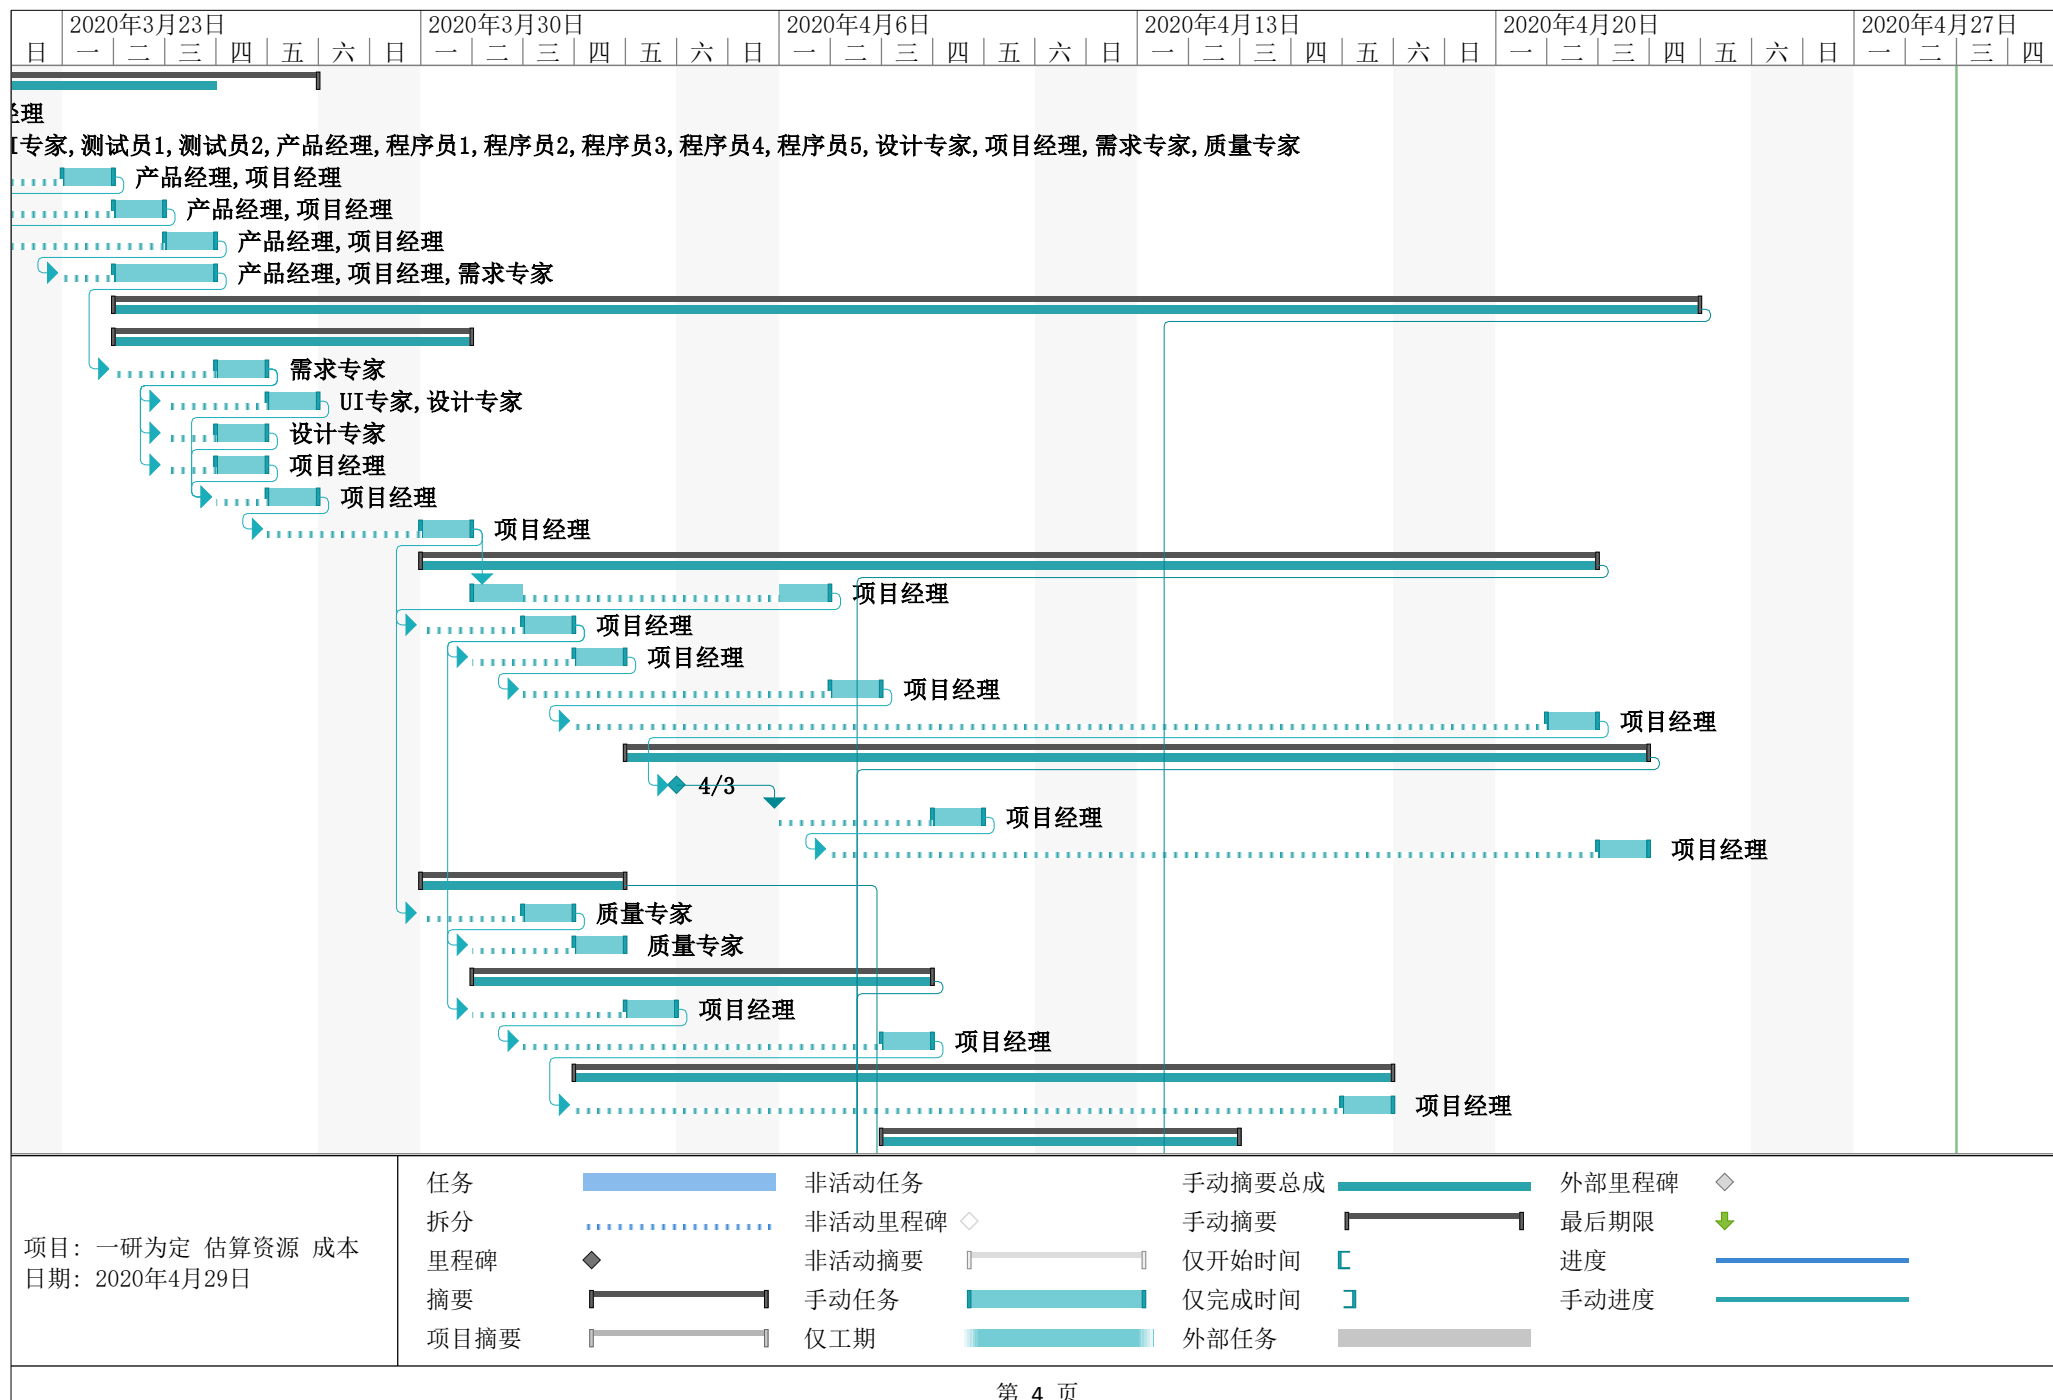

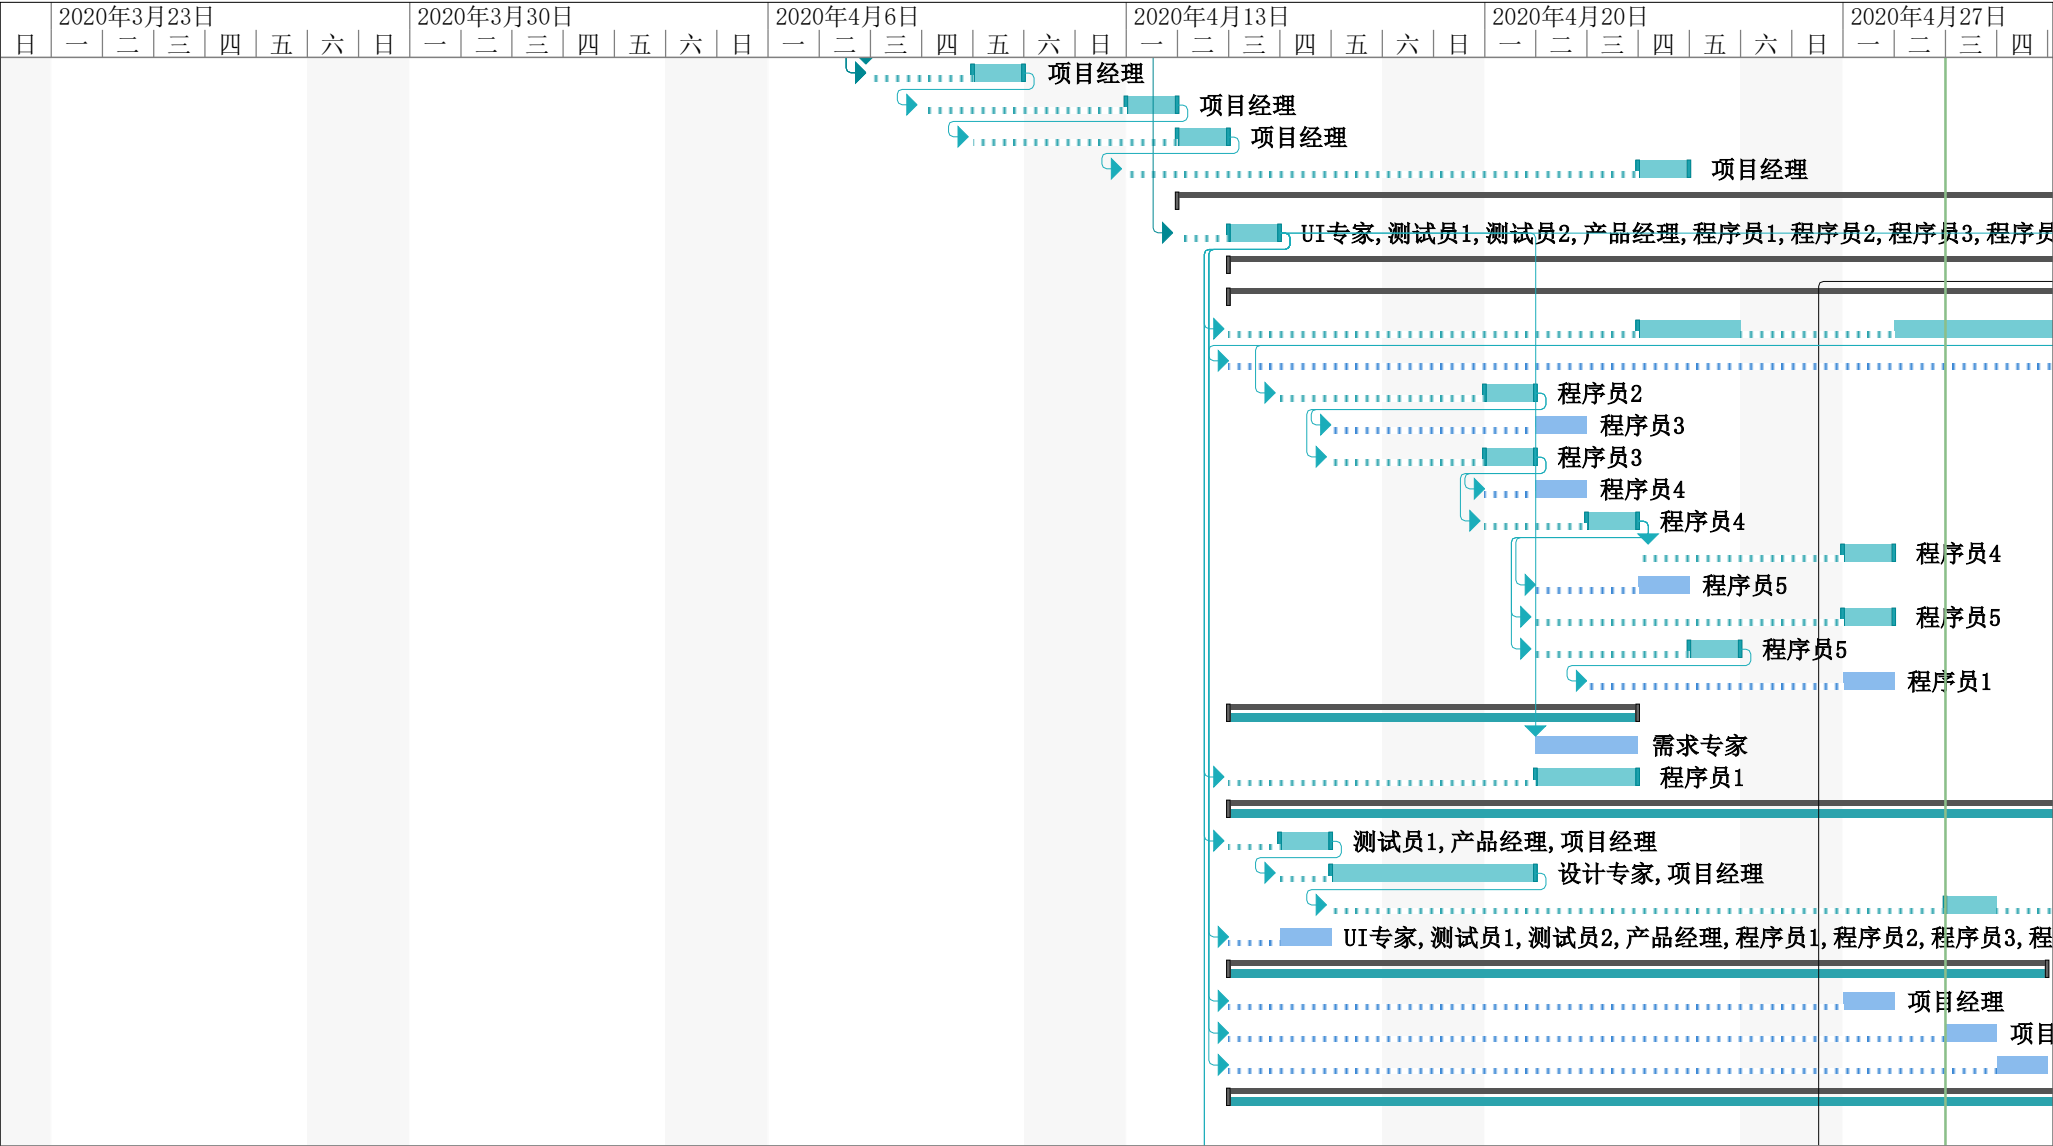






















项目：一研为定 估算资源 成本 日期：2020年4月29日	任务		非活动任务	手动摘要总成		外部里程碑		
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

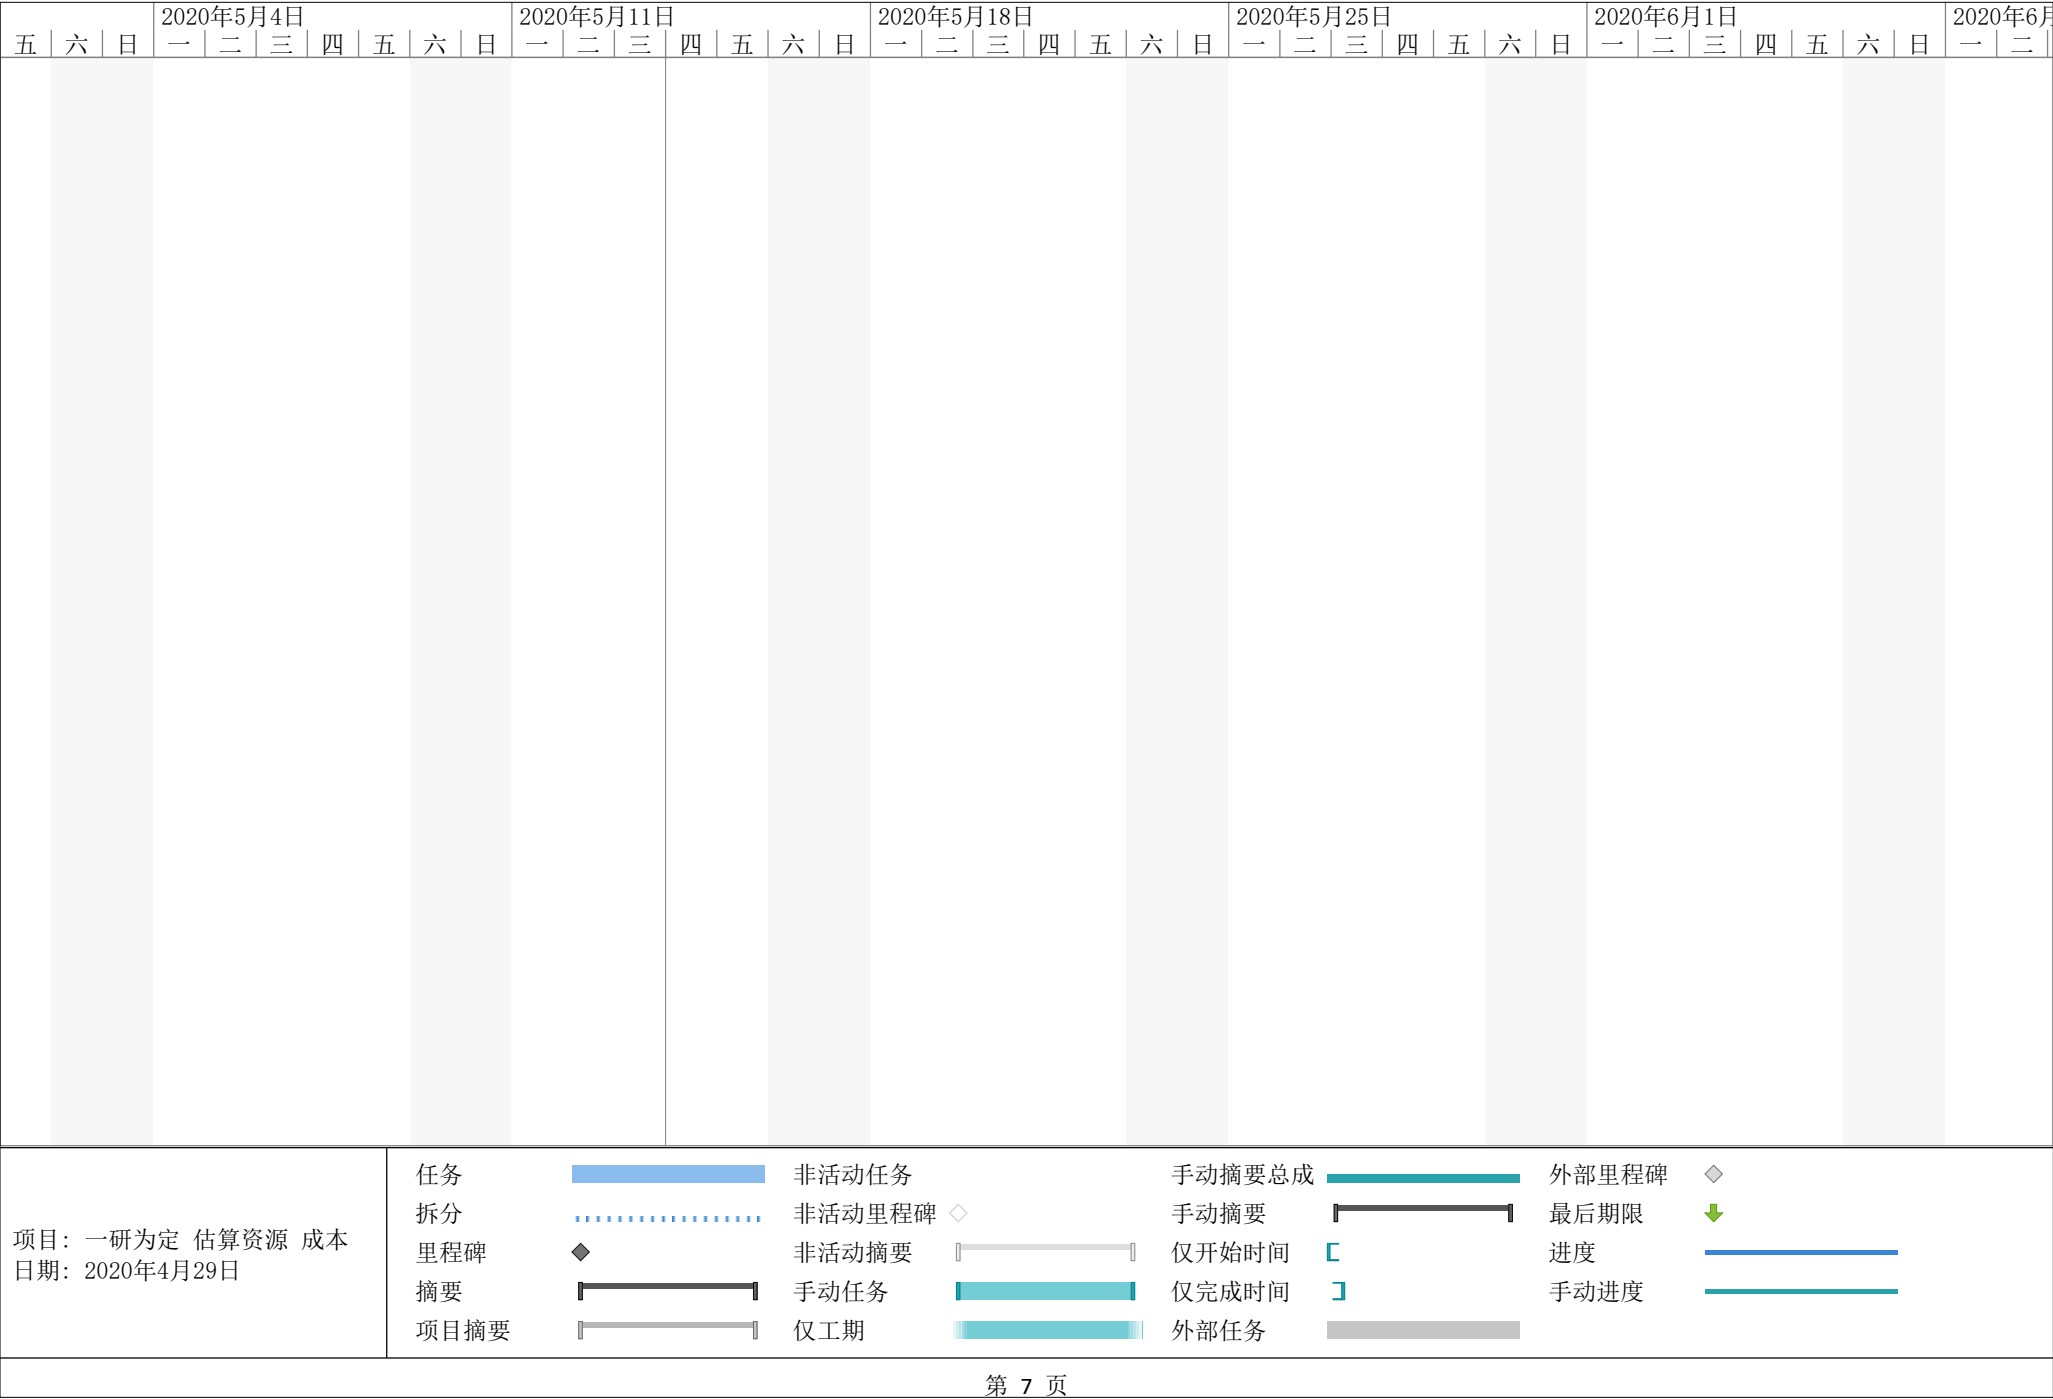

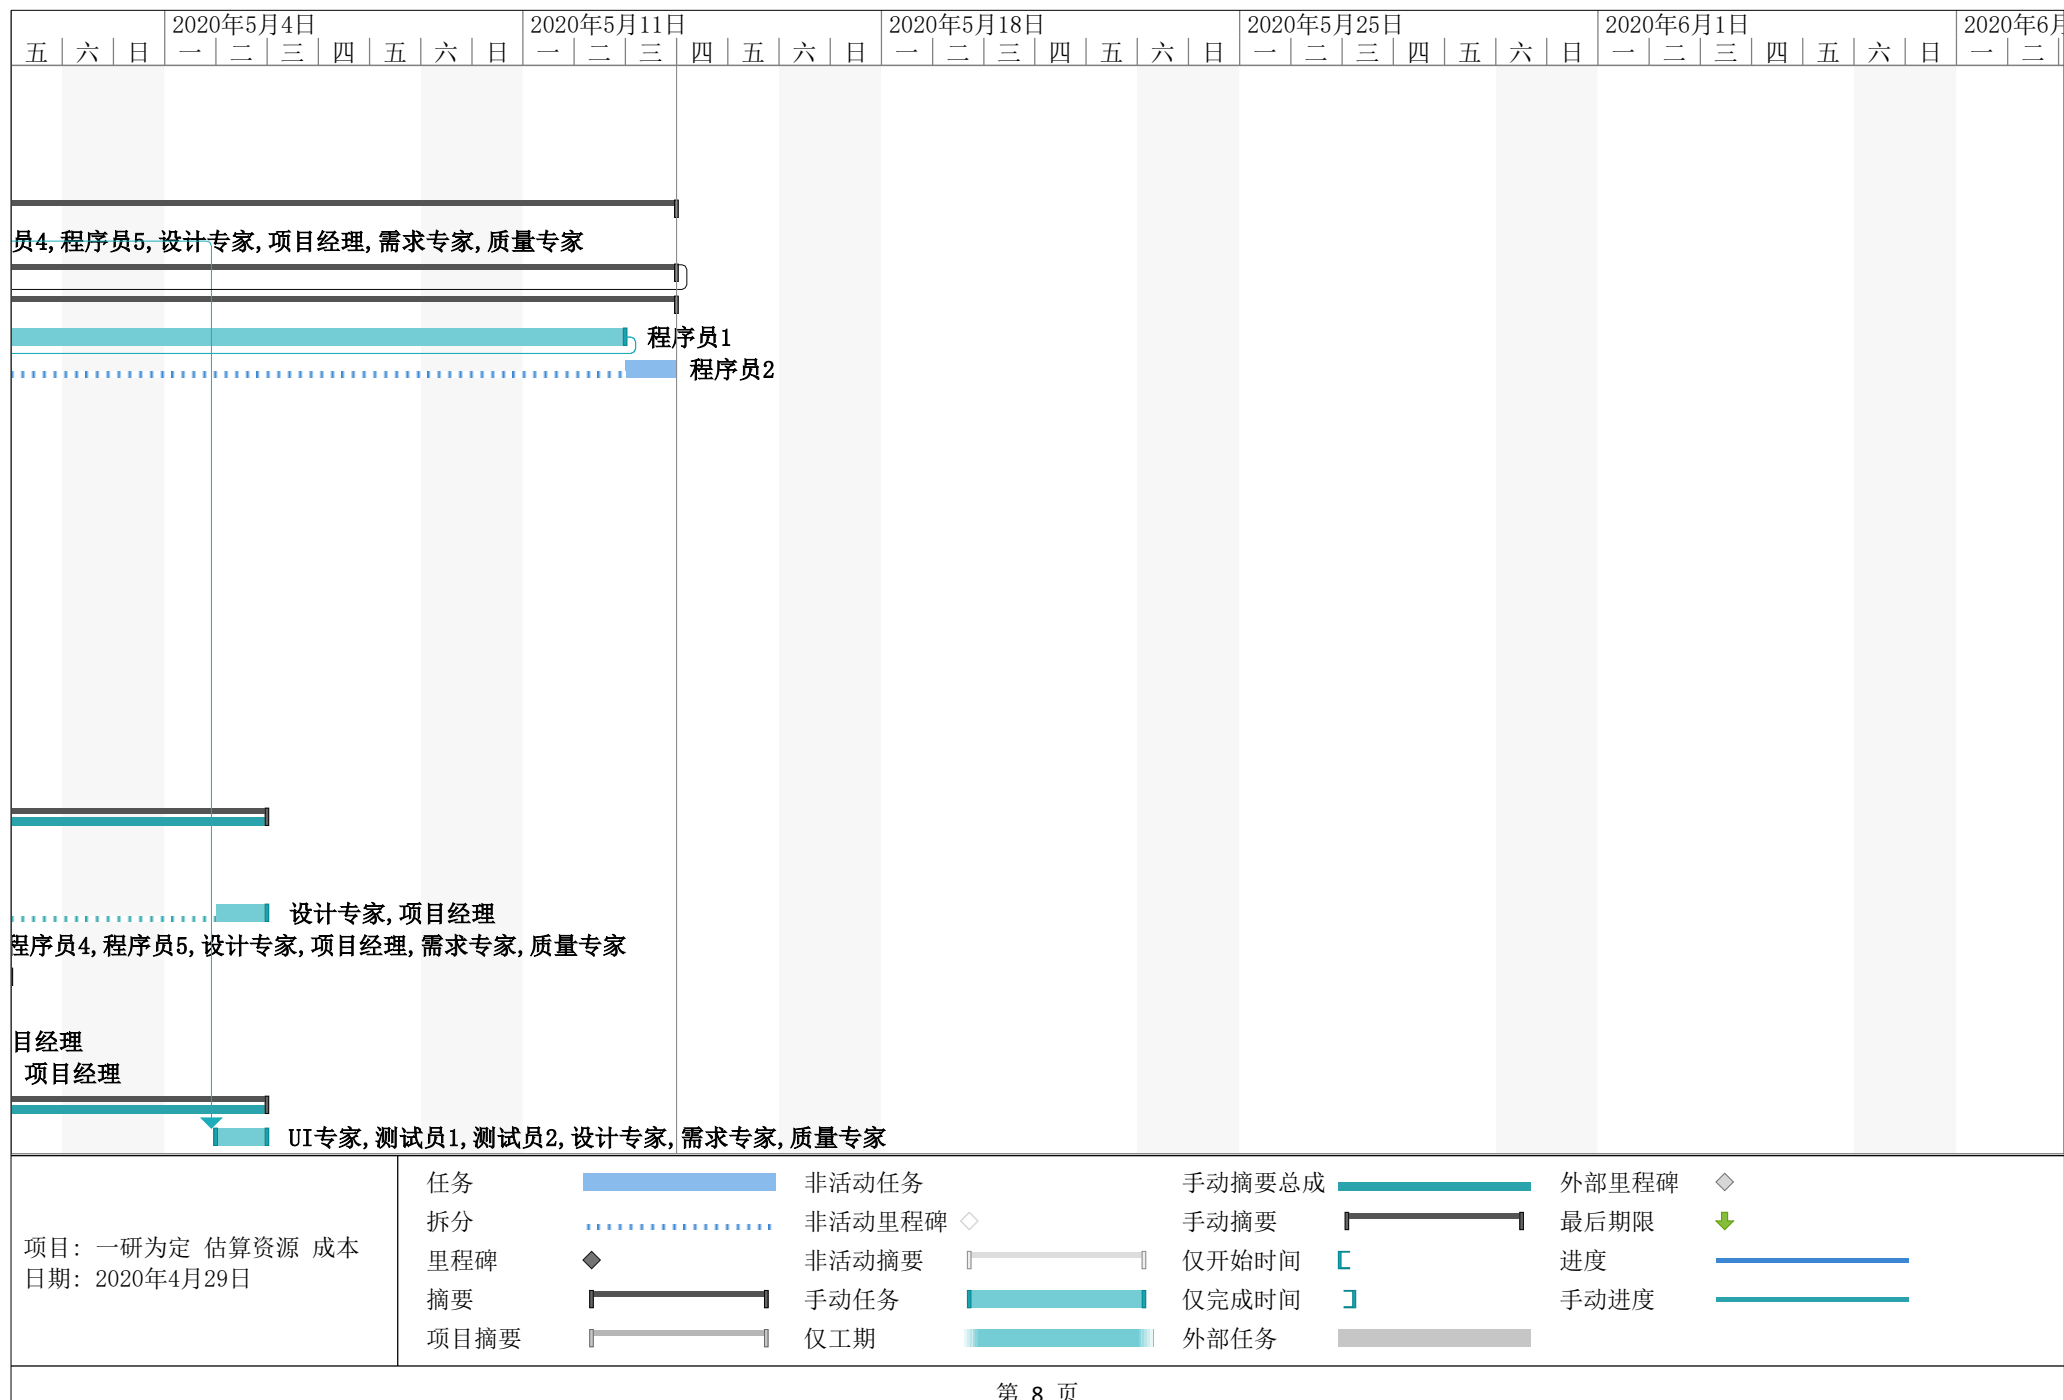



项目：一研为定 估算资源 成本
日期：2020年4月29日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度
