

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	3月16日							2020年3月23日			
									三	四	五	六	日	一	二	三	四		
1	✓	🚀	启动	6 个工作日	2020年3月19	2020年3月26													
2	✓	🚀	任命项目经理	1 个工作日	2020年3月19	2020年3月19		产品经理											
3	✓	🚀	组建核心团队	1 个工作日	2020年3月19	2020年3月19		UI专家, 测试员1, 测试员2,											
4	✓	🚀	制定里程碑计划	1 个工作日	2020年3月19	2020年3月19		产品经理, 项目经理											
5	✓	🚀	分析干系人	1 个工作日	2020年3月19	2020年3月19		产品经理, 项目经理											
6	✓	🚀	制定项目章程	1 个工作日	2020年3月20	2020年3月20	2, 3, 4, 5	产品经理, 项目经理											
7	✓	🚀	项目启动大会	1 个工作日	2020年3月23	2020年3月23	6	产品经理, 项目经理, 需求专											
8	✓	🚀	规划	15 个工作日	2020年3月24	2020年4月13													
9	✓	🚀	规划范围	4 个工作日	2020年3月24	2020年3月27													
10	✓	🚀	制定需求说明书	1 个工作日	2020年3月24	2020年3月24		需求专家											
11	✓	🚀	界面设计	1 个工作日	2020年3月25	2020年3月25	10	UI专家, 设计专家											
12	✓	🚀	详细设计说明书	1 个工作日	2020年3月25	2020年3月25	10	设计专家											
13	✓	🚀	范围说明书	1 个工作日	2020年3月25	2020年3月25	10	项目经理											
14	✓	🚀	创建WBS	1 个工作日	2020年3月26	2020年3月26	11, 12, 13	项目经理											
15	✓	🚀	形成范围基准	1 个工作日	2020年3月27	2020年3月27	14	项目经理											
16	✓	🚀	规划时间	4 个工作日	2020年3月28	2020年4月2													
17	✓	🚀	排列工作包顺序	1 个工作日	2020年3月28	2020年3月28	15	项目经理											
18	✓	🚀	估算资源	1 个工作日	2020年3月30	2020年3月30	17	项目经理											
19	✓	🚀	估算持续时间	1 个工作日	2020年3月31	2020年3月31	18	项目经理											
20	✓	🚀	制定进度计划	1 个工作日	2020年4月1	2020年4月1	19	项目经理											
21	✓	🚀	形成进度基准	1 个工作日	2020年4月2	2020年4月2	20	项目经理											
22	✓	🚀	规划成本	3 个工作日	2020年4月3	2020年4月7													
23	✓	🚀	项目成本估算	0 个工作日	2020年4月3	2020年4月3	21	项目经理											
24	✓	🚀	项目预算	1 个工作日	2020年4月6	2020年4月6	23	项目经理											
25	✓	🚀	形成范围基准	1 个工作日	2020年4月7	2020年4月7	24	项目经理											
26	✓	🚀	规划质量	2 个工作日	2020年3月30	2020年3月31													
27	✓	🚀	制定测试计划	1 个工作日	2020年3月30	2020年3月30	15	质量专家											
28	✓	🚀	制定测试用例	1 个工作日	2020年3月31	2020年3月31	27	质量专家											
29	✓	🚀	规划人力资源	2 个工作日	2020年3月31	2020年4月1													
30	✓	🚀	制定人力资源计划	1 个工作日	2020年3月31	2020年3月31	18	项目经理											
31	✓	🚀	制定人员配备管理计划	1 个工作日	2020年4月1	2020年4月1	30	项目经理											
32	✓	🚀	规划沟通	1 个工作日	2020年4月2	2020年4月2													
33	✓	🚀	制定沟通管理计划	1 个工作日	2020年4月2	2020年4月2	31	项目经理											
34	✓	🚀	规划风险	4 个工作日	2020年4月8	2020年4月13													
项目：3.1—研为定WBS 日期：2020年4月7日			任务		非活动任务		手动摘要		总成本		外部里程碑								
			拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限										
			里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度										
			摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度										
			项目摘要		仅工期		外部任务												

第 1 页

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	3月16日					2020年3月23日			
									三	四	五	六	日	一	二	三	四
35	✓		识别风险	1 个工作日	2020年4月8	2020年4月8	16, 22, 26, 29	项目经理									
36	✓		风险分析	1 个工作日	2020年4月9	2020年4月9	35	项目经理									
37	✓		制定风险登记册	1 个工作日	2020年4月10	2020年4月10	36	项目经理									
38	✓		规划整合	1 个工作日	2020年4月13	2020年4月13	37	项目经理									
39	✓		执行与监控	1 个工作日	2020年4月14	2020年4月14											
40	✓		组建项目团队	1 个工作日	2020年4月14	2020年4月14	8	UI专家, 测试员1, 测试员2,									
41	✓		项目执行	6 个工作日	2020年4月15	2020年4月22											
42	✓		用户模块	6 个工作日	2020年4月15	2020年4月22											
43	✓		注册登录	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	程序员1									
44	✓		浏览院校专业	1 个工作日	2020年4月16	2020年4月16	43	程序员2									
45	✓		查询院校专业	1 个工作日	2020年4月16	2020年4月16	43	程序员2									
46	✓		发表文章	1 个工作日	2020年4月17	2020年4月17	45	程序员3									
47	✓		回复文章	1 个工作日	2020年4月17	2020年4月17	45	程序员3									
48	✓		每日打卡	1 个工作日	2020年4月20	2020年4月20	47	程序员4									
49	✓		添加学习任务	1 个工作日	2020年4月20	2020年4月20	47	程序员4									
50	✓		考研自习室	1 个工作日	2020年4月21	2020年4月21	49	程序员5									
51	✓		考研真题资料	1 个工作日	2020年4月21	2020年4月21	49	程序员5									
52	✓		考研网课	1 个工作日	2020年4月21	2020年4月21	49	程序员5									
53	✓		考研答疑	1 个工作日	2020年4月21	2020年4月21	49	程序员5									
54	✓		个人中心	1 个工作日	2020年4月22	2020年4月22	53	程序员1									
55	✓		管理员模块	2 个工作日	2020年4月15	2020年4月16											
56	✓		数据分析	2 个工作日	2020年4月15	2020年4月16	40	程序员1									
57	✓		信息资料收集	2 个工作日	2020年4月15	2020年4月16	40	程序员1									
58	✓		项目监控	3 个工作日	2020年4月15	2020年4月17											
59	✓		各项指标监控	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	测试员1, 产品经理, 项目经									
60	✓		监控评审	1 个工作日	2020年4月16	2020年4月16	59	设计专家, 项目经理									
61	✓		变更评审	1 个工作日	2020年4月17	2020年4月17	60	设计专家, 项目经理									
62	✓		例会	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	UI专家, 测试员1, 测试员2,									
63	✓		管理干系人	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15											
64	✓		发布项目信息	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	项目经理									
65	✓		报告监控指标	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	项目经理									
66	✓		干系人沟通	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	项目经理									
67	✓		团队建设	2 个工作日	2020年4月15	2020年4月16											
68	✓		培训	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	UI专家, 测试员1, 测试员2,									

项目：3.1一研为定WBS
日期：2020年4月7日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	3月16日						2020年3月23日			
									三	四	五	六	日	一	二	三	四	
69			娱乐活动	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	UI专家, 测试员1, 测试员2,										
70			沟通	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	UI专家, 测试员1, 测试员2,										
71			项目验收	1 个工作日	2020年4月27	2020年4月27	41	UI专家, 产品经理, 设计专家										
72			收尾	1 个工作日	2020年4月28	2020年4月28												
73			项目终检	1 个工作日	2020年4月28	2020年4月28	71	UI专家, 产品经理, 设计专家										
74			项目内部收尾	1 个工作日	2020年4月28	2020年4月28	71	UI专家, 测试员1, 产品经理										

项目：3.1一研为定WBS

日期：2020年4月7日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务

外部里程碑


最后期限

进度

手动进度

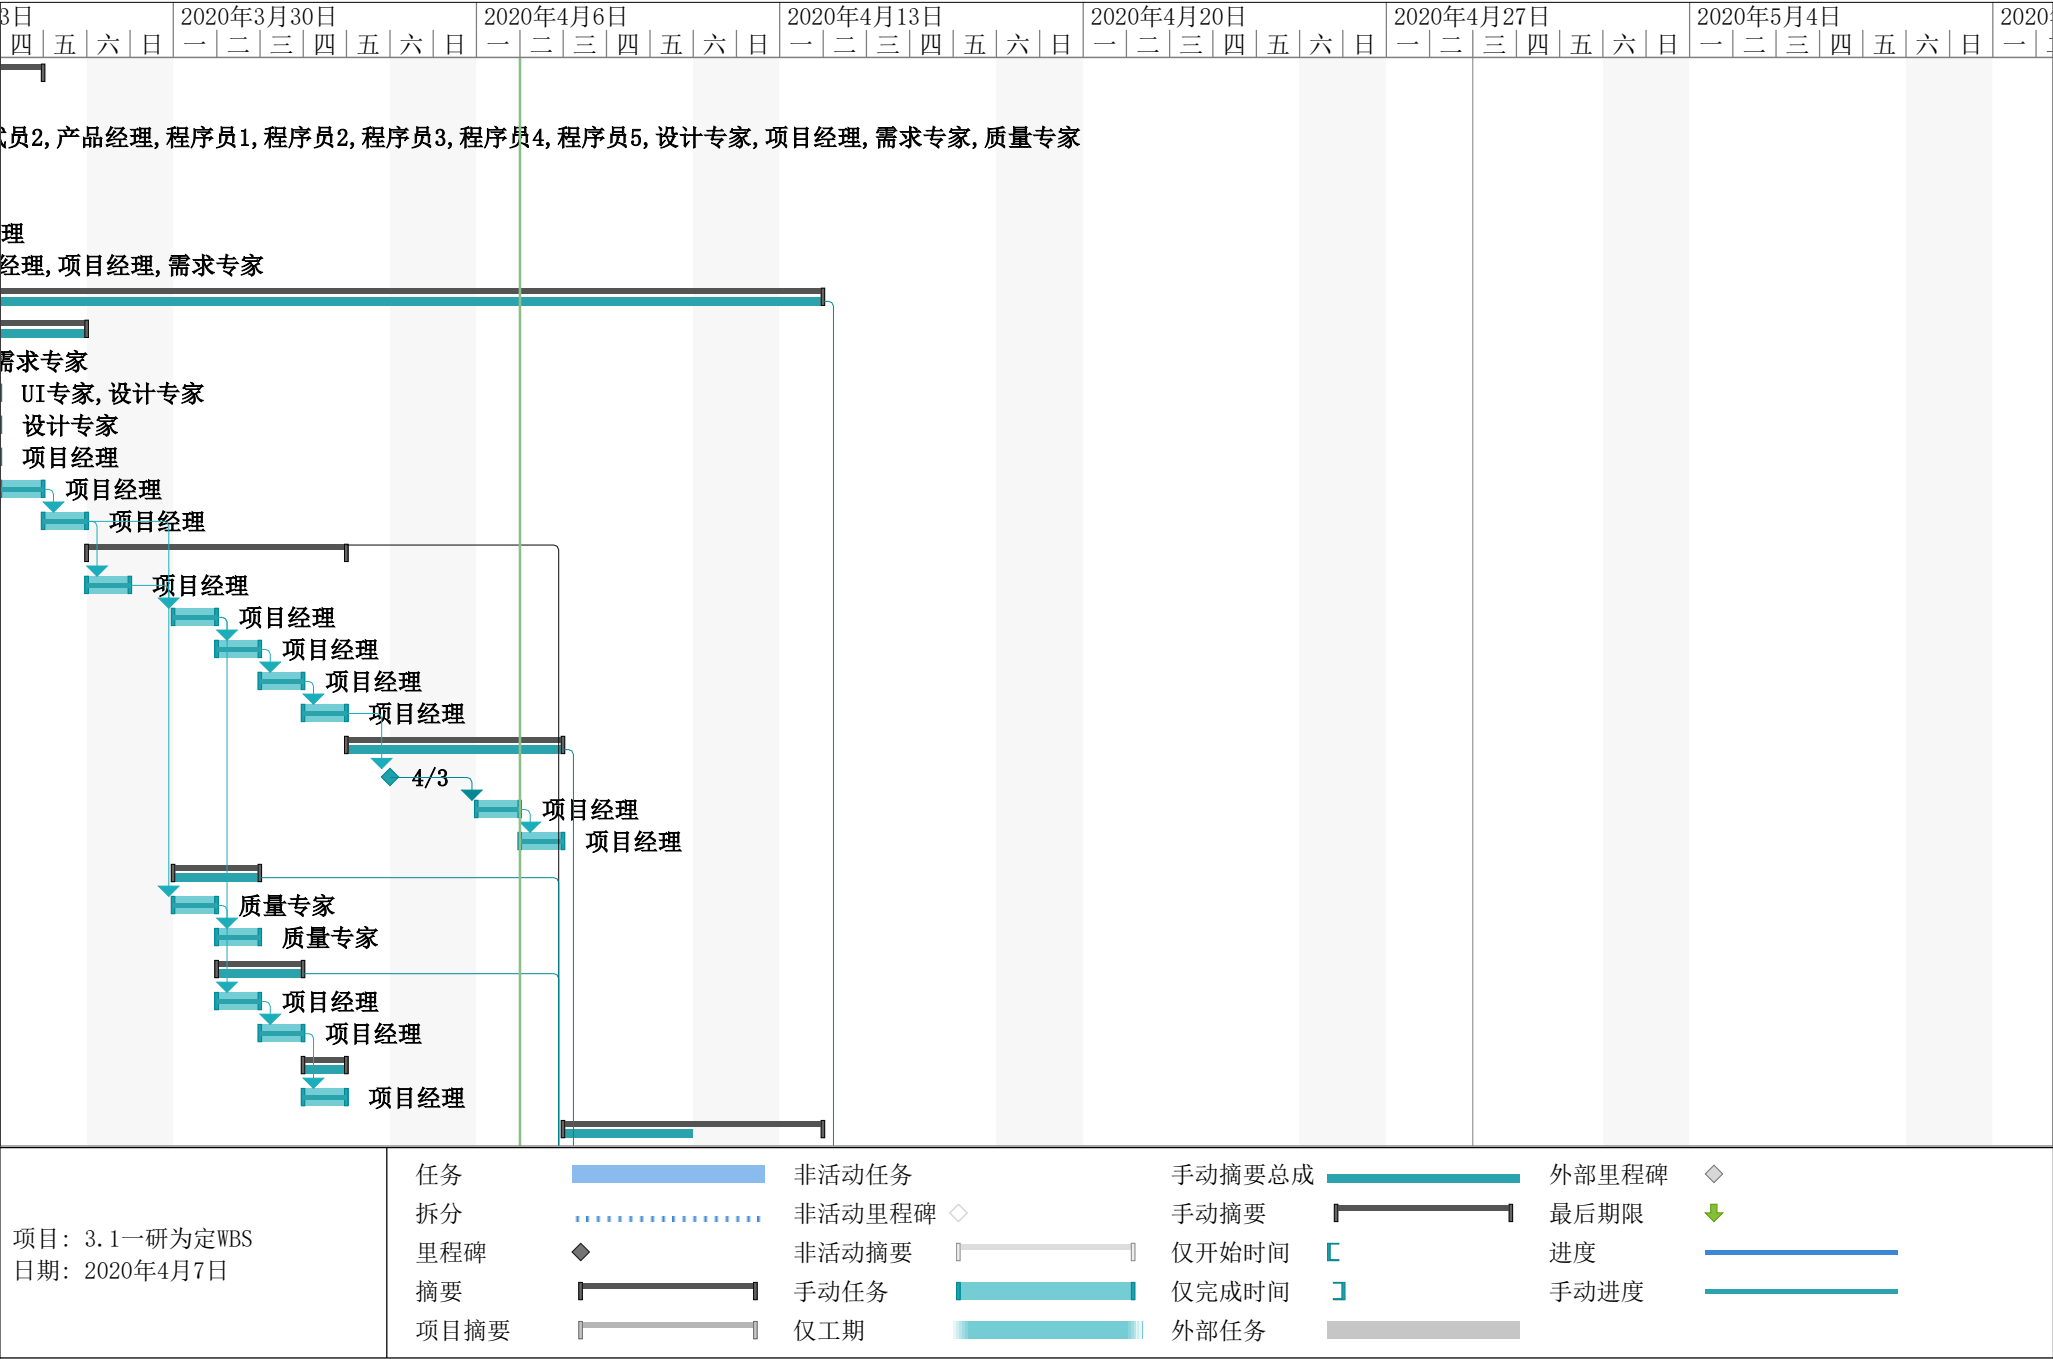





项目：3.1一研为定WBS 日期：2020年4月7日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			
