




| 标识号 | 0 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 月16日 三 四 五 | 2020年3月23日 六 日 一 二 三 四 五 : | | | | | | | |
|-----|--------------------------|----------|---------|----------|--------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 35 | <u>~</u> | → | 识别风险 | 1 个工作日 | 2020年4月 | 1812020年4月8 | 3 F 16, 22, 26, 29 | 项目经理 | | | | | | | | | |
| 36 | V | * | 风险分析 | | | 9[2020年4月9 | | 项目经理 | | | | | | | | | |
| 37 | V | * | 制定风险登记册 | | | 102020年4月1 | | 项目经理 | | | | | | | | | |
| 38 | V | * | 规划整合 | | | 132020年4月1 | | 项目经理 | | | | | | | | | |
| 39 | V | - | 执行与监控 | | | 142020年4月2 | | >1,1,1,1 == == | | | | | | | | | |
| 40 | √ | * | 组建项目团队 | | | 142020年4月1 | | UI专家,测试员1 | | | | | | | | | |
| 41 | √ | * | 项目执行 | 6 个工作日 | 2020年4月 | 152020年4月2 | 22 | | | | | | | | | | |
| 42 | √ | * | 用户模块 | 6 个工作日 | 2020年4月 | 152020年4月2 | 22 | | | | | | | | | | |
| 43 | √ | * | 注册登录 | 1 个工作日 | 2020年4月 | 152020年4月1 | .540 | 程序员1 | | | | | | | | | |
| 44 | √ | * | 浏览院校专业 | 1 个工作日 | 2020年4月 | 162020年4月1 | .643 | 程序员2 | | | | | | | | | |
| 45 | √ | * | 查询院校专业 | 1 个工作日 | 2020年4月 | 162020年4月1 | 643 | 程序员2 | | | | | | | | | |
| 46 | √ | * | 发表文章 | 1 个工作日 | 2020年4月 | 172020年4月1 | 745 | 程序员3 | | | | | | | | | |
| 47 | √ | * | 回复文章 | | | 172020年4月1 | | 程序员3 | | | | | | | | | |
| 48 | √ | * | 每日打卡 | | | 202020年4月2 | | 程序员4 | | | | | | | | | |
| 49 | √ | * | 添加学习任务 | 1 个工作日 | 2020年4月 | 202020年4月2 | 2047 | 程序员4 | | | | | | | | | |
| 50 | √ | * | 考研自习室 | 1 个工作日 | 2020年4月 | 212020年4月2 | 2149 | 程序员5 | | | | | | | | | |
| 51 | √ | * | 考研真题资料 | 1 个工作日 | 2020年4月 | 212020年4月2 | 2149 | 程序员5 | | | | | | | | | |
| 52 | √ | * | 考研网课 | 1 个工作日 | 2020年4月 | 212020年4月2 | 2149 | 程序员5 | | | | | | | | | |
| 53 | √ | * | 考研答疑 | 1 个工作日 | 2020年4月 | 212020年4月2 | 2149 | 程序员5 | | | | | | | | | |
| 54 | √ | * | 个人中心 | 1 个工作日 | 2020年4月 |] 22 2020年4月2 | 22 53 | 程序员1 | | | | | | | | | |
| 55 | ✓ | * | 管理员模块 | | | 月152020年4月1 | | | | | | | | | | | |
| 56 | ✓ | * | 数据分析 | 2 个工作日 | 2020年4月 |] 15 2020年4月1 | 640 | 程序员1 | | | | | | | | | |
| 57 | ✓ | * | 信息资料收集 | 2 个工作日 | 2020年4月 |] 15 2020年4月1 | 640 | 程序员1 | | | | | | | | | |
| 58 | √ | * | 项目监控 | | | 月152020年4月1 | | | | | | | | | | | |
| 59 | ✓ | * | 各项指标监控 | 1 个工作日 | 2020年4月 |] 15 2020年4月1 | 540 | 测试员1,产品经 | | | | | | | | | |
| 60 | √ | * | 监控评审 | 1 个工作日 | 2020年4月 |] 162020年4月1 | 659 | 设计专家,项目组 | | | | | | | | | |
| 61 | ✓ | * | 变更评审 | 1 个工作日 | 2020年4月 |]172020年4月1 | 760 | 设计专家,项目组 | | | | | | | | | |
| 62 | ✓ | * | 例会 | 1 个工作日 | 2020年4月 |] 15 2020年4月1 | 540 | UI专家,测试员1 | | | | | | | | | |
| 63 | ✓ | * | 管理干系人 | | | 月152020年4月1 | | | | | | | | | | | |
| 64 | ✓ | * | 发布项目信息 | 1 个工作日 | 2020年4月 |]152020年4月1 | 540 | 项目经理 | | | | | | | | | |
| 65 | √ | * | 报告监控指标 | 1 个工作日 | 2020年4月 |]152020年4月1 | 540 | 项目经理 | | | | | | | | | |
| 66 | ✓ | * | 干系人沟通 | | |] 15 2020年4月1 | | 项目经理 | | | | | | | | | |
| 67 | ✓ | * | 团队建设 | | | 月152020年4月1 | | | | | | | | | | | |
| 68 | ✓ | * | 培训 | 1 个工作日 | 2020年4月 |]152020年4月1 | 540 | UI专家,测试员1 | | | | | | | | | |
| | | | 任务 | | 非活动任务 | | 手动摘要总成 | Ž | 外部里程碑 | \Diamond | | | | | | | |
| | | | 拆分 | | 非活动里程 | 碑 ◇ | 手动摘要 | | 最后期限 | • | | | | | | | |
| | 项目:一研为定 日期: 2020年4月1日 | | 里程碑 | ♦ | 非活动摘要 | | 1 仅开始时间 | С | 进度 | | | | | | | | |
| 日期: | | | 摘要 | | 手动任务 | | ■ 仅完成时间 |] | 手动进度 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 丁纵匹反 | | | | | | | | |
| | | | 项目摘要 | | 仅工期 | | 外部任务 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 第 2 页 | | | | | | | | | | | | |

| 标识号 | _ | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 月16日 | 2020年3月23日 |
|-----|--------------|------|--------|--------|------------|----------|-------------|----------|----------------|-----------------------------------|
| | v | | | | | | | | 三 四 3 | 五 六 日 一 二 三 四 五 六 |
| 69 | \checkmark | * | 娱乐活动 | 1 个工作日 | 1 2020年4月1 | 52020年4月 | 1540 | UI专家,测试员 | 1 | |
| 70 | ✓ | * | 沟通 | 1 个工作日 | 1 2020年4月1 | 52020年4月 | 1540 | UI专家,测试员 | 1 | |
| 71 | ✓ | * | 项目验收 | 1 个工作日 | 1 2020年4月2 | 72020年4月 | 2741 | UI专家,产品经 | U | |
| 72 | ✓ | * | 收尾 | 1 个工作日 | 1 2020年4月2 | 82020年4月 | 1 28 | | | |
| 73 | ✓ | * | 项目终检 | 1 个工作日 | 1 2020年4月2 | 82020年4月 | 2871 | UI专家,产品经 | <mark>편</mark> | |
| 74 | ✓ | * | 项目内部收尾 | 1 个工作日 | 1 2020年4月2 | 82020年4月 | 2871 | UI专家,测试员 | 1 | |
| | | | | | | | | | | |



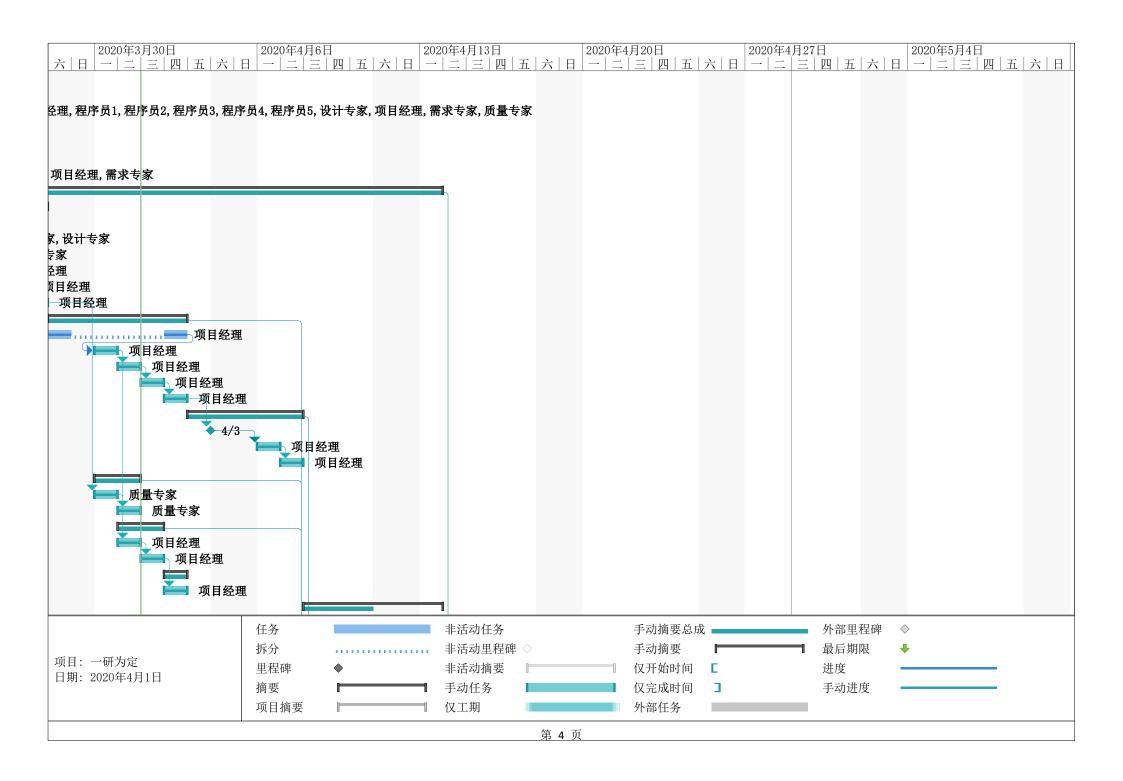

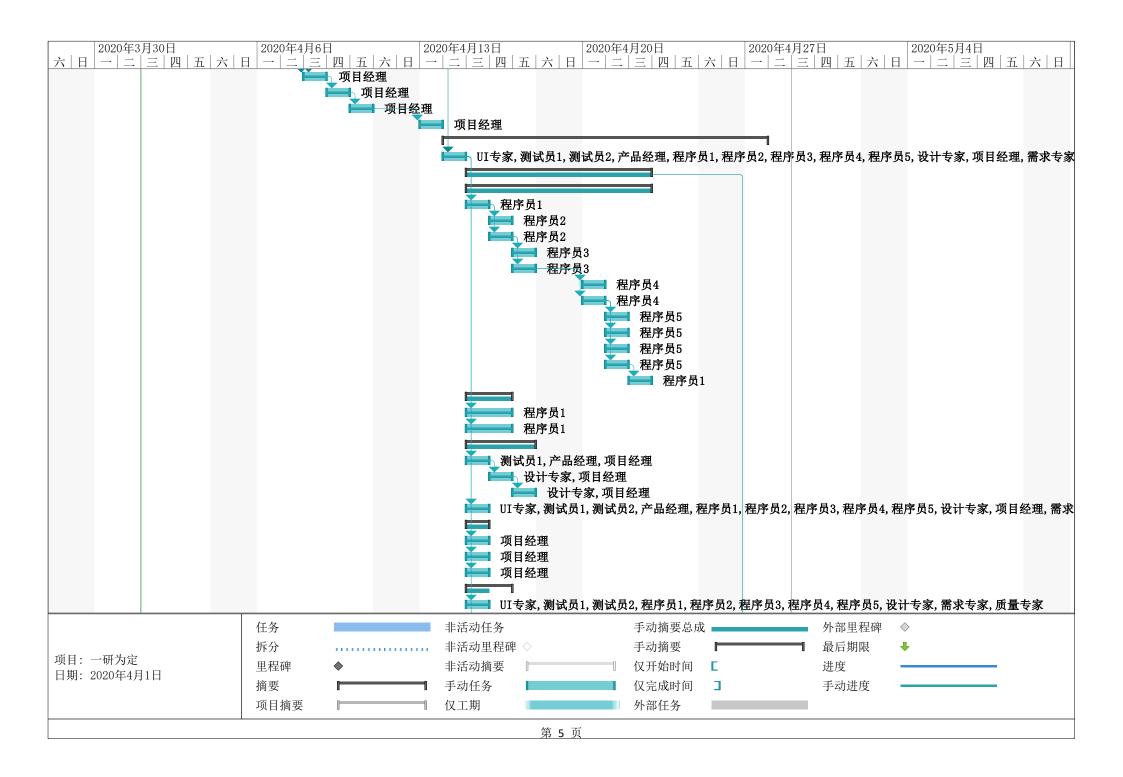

| 任务 | 六日 | 2020年3 一 二 | 月30日 三 四 | 五. ; | 六 日 | 2020年4月 | 6日 三 四 | 五一六 | 日 - | 20年4月1 | 四 五 ■ UI专 | 1,测试员 | 月20日 三 四 五 2,产品经理, 2 ,产品经理, | 程序员1 | , 程序员2, , 程序员2, | 三 匹 ,程序员 ,程序员 [专家,产 | | 日 一 5, 设计专 1, 程序员 设计专家 理, 设计 | [5, 设计专 , 项目经 ³ 专家, 项[| 四 经理,需 世,需求 1 | 求专家, 经理, 专家, 质 需求专家 | 质水量 表,质 |
|----|----|-----------------|-------------|------|-----|-----------------|------------|-----|-----|-------------|--------------|-------|--|------|--------------------|--------------------------------|------|--|---|--|---|---------|
| 拆分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拆分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拆分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拆分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11日 | | | 乔分 里程碑 商要 | | | | 非活动。非活动,手动任 | 里程碑〈 簡要 〔 | | 手动摘要 仅开始时间 仅完成时间 | | | 一 | 是后期限 | | | _ | | |
