




标识号	A	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	方置任务	资源名称	月16日		2020年3月23日 二 三 四 五 六
35	V	*	识别风险	1 个工作日	2020年4月8	8 [2020年4月8 [<mark>1</mark>	6 22 26 29			<u> </u>	
1	~		风险分析			912020年4月913		项目经理			
37	V	3	制定风险登记册			102020年4月10 <mark>3</mark>		项目经理			
38	1		规划整合			132020年4月13 <mark>3</mark>		项目经理			
39	1		执行与监控	10 个工作日	12020年4月	142020年4月27	<u> </u>	-VIII			
40	V	*	组建项目团队			142020年4月14 <mark>8</mark>		UI专家,测试员1			
41	~		项目执行			152020年4月22					
42	~		用户模块			152020年4月22					
43	V	<u> </u>	注册登录			152020年4月15 <mark>4</mark>	0	程序员1			
44	V	→	浏览院校专业			162020年4月164		程序员2			
45	V	→	查询院校专业			162020年4月164		程序员2			
46	V	→	发表文章			172020年4月17 <mark>4</mark>		程序员3			
47	V	→	回复文章			172020年4月174		程序员3			
48	V	→	每日打卡			202020年4月204		程序员4			
49	V	→	添加学习任务			202020年4月20 <mark>4</mark>		程序员4			
50	V	→	考研自习室			212020年4月21 <mark>4</mark>		程序员5			
51	V	→	考研真题资料			212020年4月21 <mark>4</mark>		程序员5			
52	V	→	考研网课			212020年4月214		程序员5			
53	V	→	考研答疑			212020年4月214		程序员5			
54	V	→	个人中心			222020年4月22		程序员1			
55	V		管理员模块			152020年4月16		12/1 //2			
56	V	→	数据分析			152020年4月164	0	程序员1			
57	1	→	信息资料收集			152020年4月164		程序员1			
58	V	→	项目监控			152020年4月17		12/1/2/2			
59	V	→	各项指标监控			152020年4月15 <mark>4</mark>	0	测试员1,产品经			
60	1	→	监控评审			162020年4月16 <mark>5</mark>		设计专家,项目组			
61	1	→	变更评审			172020年4月17 <mark>6</mark>		设计专家,项目组			
62	1	→	例会			152020年4月15 <mark>4</mark>		UI专家,测试员1			
63	V	→	管理干系人			152020年4月15		(>3) (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
64	~	*	发布项目信息			152020年4月154	0	项目经理			
65	~	*	报告监控指标			152020年4月154		项目经理			
66	1	*	干系人沟通			152020年4月15		项目经理			
67	1	→	团队建设			152020年4月16		71722			
68	1	→	培训			152020年4月15 <mark>4</mark>	0	UI专家,测试员1			
		(gr 7	任务	, —, ,	非活动任务	1 -/ 4 20	手动摘要总成		外部里程碑	\langle	
			拆分		非活动里程碑	1 🛆	手动摘要		最后期限	•	
项目:一研为定.mpp		开为定.mpp				- V		-		•	
1	日期: 2020年4月1日		里程碑	♦	非活动摘要	U	仅开始时间	С	进度		
			摘要		手动任务		仅完成时间	3	手动进度		
			项目摘要		仅工期		外部任务				
	第 2 页										

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	月16日	2020年3月23日
•								三 四 五	. 六 日 一 二 三 四 五 六
69 🗸	*	娱乐活动	1 个工作日	2020年4月	152020年4月	15 <mark>40</mark>	UI专家,测试员1		
70 🗸	*	沟通	1 个工作日	2020年4月	152020年4月	15 <mark>40</mark>	UI专家,测试员1		
71 🗸	*	项目验收	1 个工作日	2020年4月	272020年4月	27 <mark>41</mark>	UI专家,产品经理		
72	*	收尾	1 个工作日	2020年4月	282020年4月	28			
73	*	项目终检	1 个工作日	2020年4月	282020年4月	2871	UI专家,产品经理		
74 🗸	*	项目内部收尾	1 个工作日	2020年4月	282020年4月	2871	UI专家,测试员1		



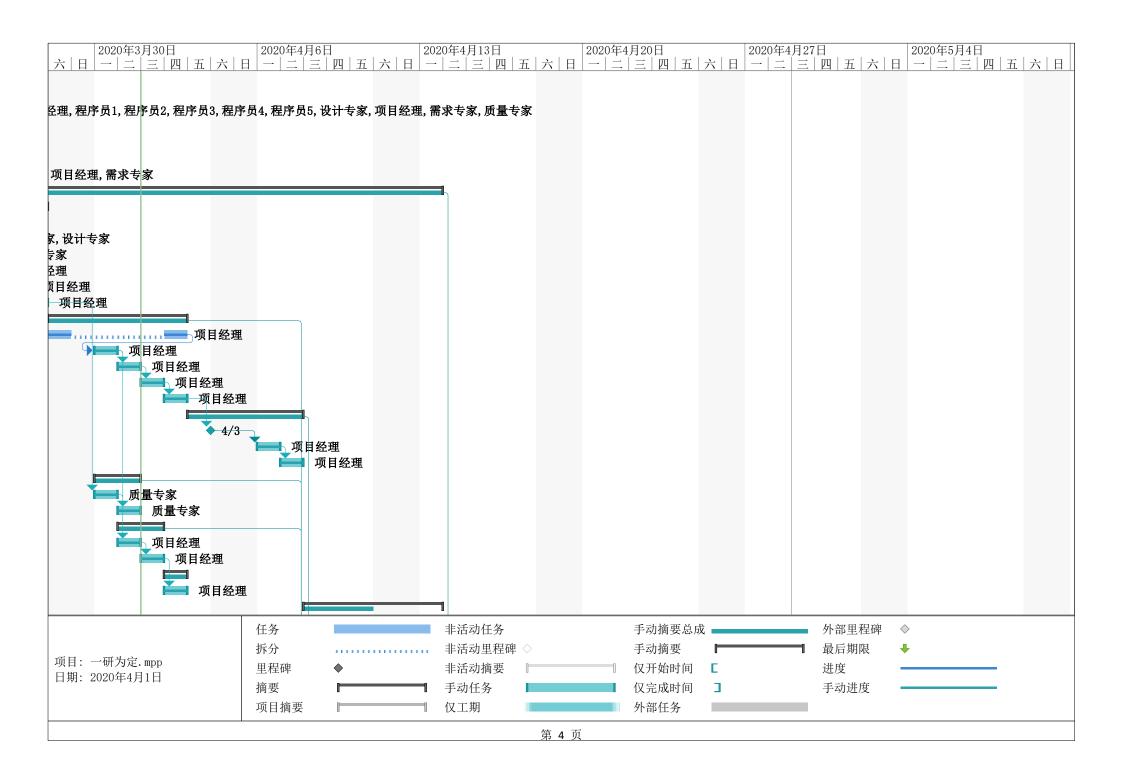

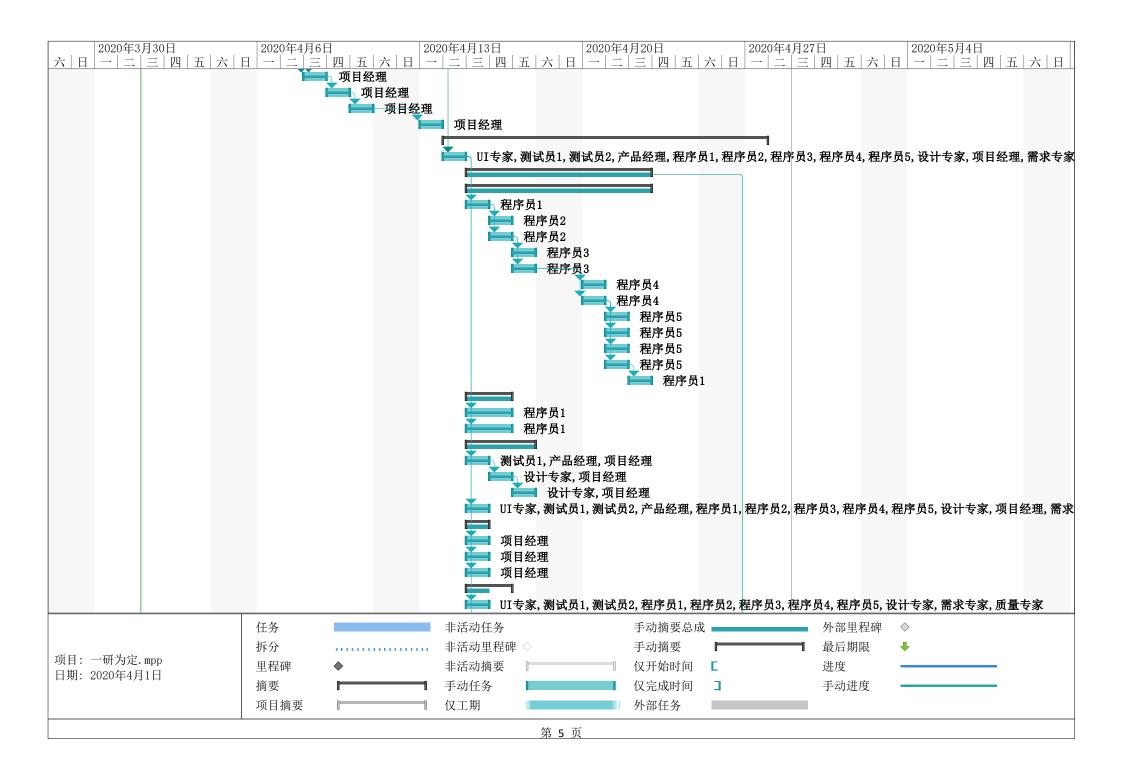

2020年3月30日 六 日 一 二 三 四 五 六	2020年4月6	日 20 	20年4月13日 - 二 三 四 五	2020年 六 日 一 一.	4月20日 三 四 五	2020年 六 日 一 -	54月27日 <u>1 三 四 五 六 </u>	2020年5月4日 日 一 二 三 四 五	六 日
			UI专家	5,测试员1,测试员	↓ ₹2,产品经理,和	呈序员1,程序员	2,程序员3,程序员5,	设计专家,项目经理,需求	大专家,质量
			■ UI专家	,测试员1,测试员	12,产品经理,和			程序员5,设计专家,项目	
						T T	JI专家,产品经理,设	计专家,项目经理,需求专	家,质量专
							■ ■ 111专家 产品经银	!, 设计专家, 项目经理, 需	建水去家 质
								产品经理,设计专家,项	
	任务		非活动任务		手动摘要总成	;	外部里程碑	♦	
	拆分		非活动里程碑 ◇		手动摘要心成手动摘要		最后期限	•	
项目:一研为定.mpp	里程碑	♦	非活动摘要 『	п	了奶酒安 仅开始时间	C	进度		
日期: 2020年4月1日	主住阵 摘要	<u> </u>	手动任务	U	仅完成时间	3	手动进度		
	^{摘安} 项目摘要		 仅工期 ■		仅元成时间 外部任务	_	丁纵匹戾		
		U U			21、即任労				
				第 6 页					
