

示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	16日 三 四 五 六
1	*	启动	7 个工作日	2020年3月	192020年3月27日			¥8, 840. 00	¥3, 890. 00	
2	*	任命项目经理			192020年3月19日		产品经理	¥800.00	¥400.00	
3	*	组建核心团队	1 个工作日	2020年3月	192020年3月20日		UI专家,测试	¥3,800.00	¥850.00	
4	*	制定里程碑计划	1 个工作日	2020年3月	192020年3月23日		产品经理,项		¥720.00	
5	*	分析干系人	1 个工作日	2020年3月	192020年3月24日		产品经理,项		¥720.00	
6	*	制定项目章程	1 个工作日	2020年3月2	202020年3月25日	2, 3, 4, 5	产品经理,项	¥1, 120.00	¥720.00	9
7	*	项目启动大会	2 个工作日	2020年3月2	232020年3月25日	6	产品经理,项	¥880.00	¥480.00	
8	*	规划	23 个工作	2020年3月2	242020年4月23日			¥7, 200. 00	¥7, 200. 00	
9	*	规划范围			242020年3月30日			¥1, 920. 00	¥1, 920. 00	
10	*	制定需求说明书			242020年3月26日		需求专家	¥240.00	¥240.00	
11	*	界面设计			252020年3月27日		UI专家,设计	¥480.00	¥480.00	
12	*	详细设计说明书			252020年3月26日		设计专家	¥240.00	¥240.00	
13	*	范围说明书			252020年3月26日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
14	*	创建WBS			262020年3月27日			¥320.00	¥320.00	
15	*	形成范围基准			272020年3月30日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
16	*	规划时间			3(2020年4月21日			¥1, 920. 00	¥1, 920. 00	
17	*	排列工作包顺序			312020年4月6日		项目经理	¥640.00	¥640.00	
18	*	估算资源			302020年4月1日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
19	*	估算持续时间			312020年4月2日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
20	*	制定进度计划			1[2020年4月7日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
21	*	形成进度基准			2[2020年4月21日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
22	*	规划成本			3 2020年4月22日			¥640.00	¥640.00	
	√ 🖈	项目成本估算			3[2020年4月3日		项目经理	¥0.00	¥0.00	
24	*	项目预算			6[2020年4月9日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
25	*	形成范围基准			7[2020年4月22日	24	项目经理	¥320.00	¥320.00	
26	*	规划质量			3(2020年4月2日		Z = 1. 2.	¥480.00	¥480.00	
27	*	制定测试计划			302020年4月1日		质量专家	¥240.00	¥240.00	
28	*	制定测试用例			312020年4月2日	27	质量专家	¥240.00	¥240.00	
29	*	规划人力资源			312020年4月8日	1.0	로드 II /J 로메	¥640. 00	¥640. 00	
30	*	制定人力资源计划			312020年4月3日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
31	*	制定人员配备管理计					项目经理	¥320.00	¥320.00	
32	*	规划沟通			2 2020年4月17日		로프 II /J 로메	¥320. 00	¥320. 00	
33	*	制定沟通管理计划			212020年4月17日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
34	*	规划风险	5 个工作日	2020年4月8	8 2020年4月14日			¥960.00	¥960.00	
		任务		非活动任务		手动摘	要总成 🚤 💮	外部里程	聲 ◇	
		I= /\		非活动里程码	埤 ◇	手动摘	要	最后期限		
项目: -	一研为定 估算资	原 成本 単程碑 ◆		非活动摘要		【 仅开始		进度	-	
日期: 2	2020年4月29日				И					
		摘要		手动任务		▼ 仅完成日		手动进度		
		项目摘要 🏲		仅工期		外部任务	务			
					第 1 页					

标识号	任务模式	任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	月16日 三 四 五 六
35	*	识别风	脸	1 个丁作日	2020年4月8	[2020年4月10	F16 22 26	项目经理	¥320.00	¥320.00	
36	<u> </u>	风险分				[2020年4月13		项目经理	¥320.00		
37	<u> </u>		险登记册			02020年4月14		项目经理	¥320.00		
38		规划整合				32020年4月23		项目经理	¥320.00		
39	=	执行与监控				42020年5月13		·X124	¥29, 400. 00		
40	*	组建项目				42020年4月15		UI专家,测词			
41	=	项目执行				[2020年5月13		01 4 31, 1/11	¥7, 760. 00		
42	-	用户模				£2020年5月13			¥6, 720. 00		
43	<u>→</u>		登录			52020年5月12		程序员1	¥3, 640. 00		
44	-		院校专业			52020年5月13	*	程序员2	¥280.00		
45	*		院校专业			62020年4月20		程序员2	¥280.00		
46	-		文章			72020年4月21		程序员3	¥280.00		
47	*		文章			72020年4月20		程序员3	¥280.00		
48	- A		打卡			02020年4月21		程序员4	¥280.00		
49	*		学习任务			02020年4月22		程序员4	¥280.00		
50	*		自习室			32020年4月27		程序员4	¥280.00		
51	-		真题资料			12020年4月23		程序员5	¥280.00		
52	*		网课			12020年4月27		程序员5	¥280.00		
53	*		答疑			12020年4月24		程序员5	¥280.00		
54	-		中心			22020年4月27		程序员1	¥280.00		
55	*	管理员				52020年4月22		, , , , ,	¥1, 040. 00		
56	-		分析			12020年4月22		需求专家	¥480.00		
57	*		资料收集			52020年4月22		程序员1	¥560.00		
58	*	项目监控				[2020年5月5]		, , , , ,	¥6, 200. 00		
59	*		标监控			52020年4月16		测试员1,产			
60	*	监控评				62020年4月20		设计专家, 项			
61	*	变更评				72020年5月5日		设计专家, 项			
62	-5	例会				52020年4月16		UI专家,测试			
63	*	管理干系	人			52020年4月30			¥960.00		
64	-	发布项				52020年4月27		项目经理	¥320.00		
65	-	报告监				52020年4月29		项目经理	¥320.00		
66	-	干系人				52020年4月30		项目经理	¥320.00		
67	*	团队建设				[2020年5月5]			¥8, 600. 00		
68	*	培训				2020年5月5日		UI专家,测记			
	(# · ·		任务	, , , , , ,	非活动任务		手动摘要				
						ir ^					
面目.	一研为定 估算资	酒 武士			非活动里程码	₽ <>	手动摘要		最后期限	₹ •	
	- 切乃足 伯异页: 2020年4月29日		里程碑	>	非活动摘要		一 仅开始时	付 □	进度		
口7切・4	2020平4月23日	‡	摘要 [手动任务		一 仅完成时	付间 □	手动进展	度	
			项目摘要 「		仅工期		外部任务				
				_	J						
						第 2 页					


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	月16日
	•									三 四 五 テ
69	*	娱乐活动	2 个工作	日 2020年4月	152020年4月17	=40	UI专家,测试	¥3,520.00	¥3, 120.00	
70	*	沟通	2 个工作	日 2020年4月	152020年4月17	=40	UI专家,测试	¥3,800.00	¥3, 400.00	
71	*	项目验收	1 个工作	日 2020年4月:	272020年4月28日	- 41	UI专家,产品	¥2,080.00	¥1,680.00	
72	*	收尾	12 个工作	E 2020年4月	282020年5月13	E		¥4, 320. 00	¥3, 520. 00	
73	-5	项目终检	1 个工作	日 2020年4月:	282020年5月6日	71	UI专家,产品	¥2,080.00	¥1,680.00	
74	<u>_</u>	项目内部收尾	1 个工作	日 2020年4月:	282020年5月7日	71	UI专家,测试	¥2, 240, 00	¥1, 840, 00	


任务 非活动任务 手动摘要总成 🕳 外部里程碑 \Diamond 拆分 手动摘要 最后期限 非活动里程碑 ◇ 项目: 一研为定 估算资源 成本 仅开始时间 [里程碑 非活动摘要 进度 日期: 2020年4月29日 仅完成时间 摘要 手动任务 手动进度 项目摘要 仅工期 外部任务 第 3 页

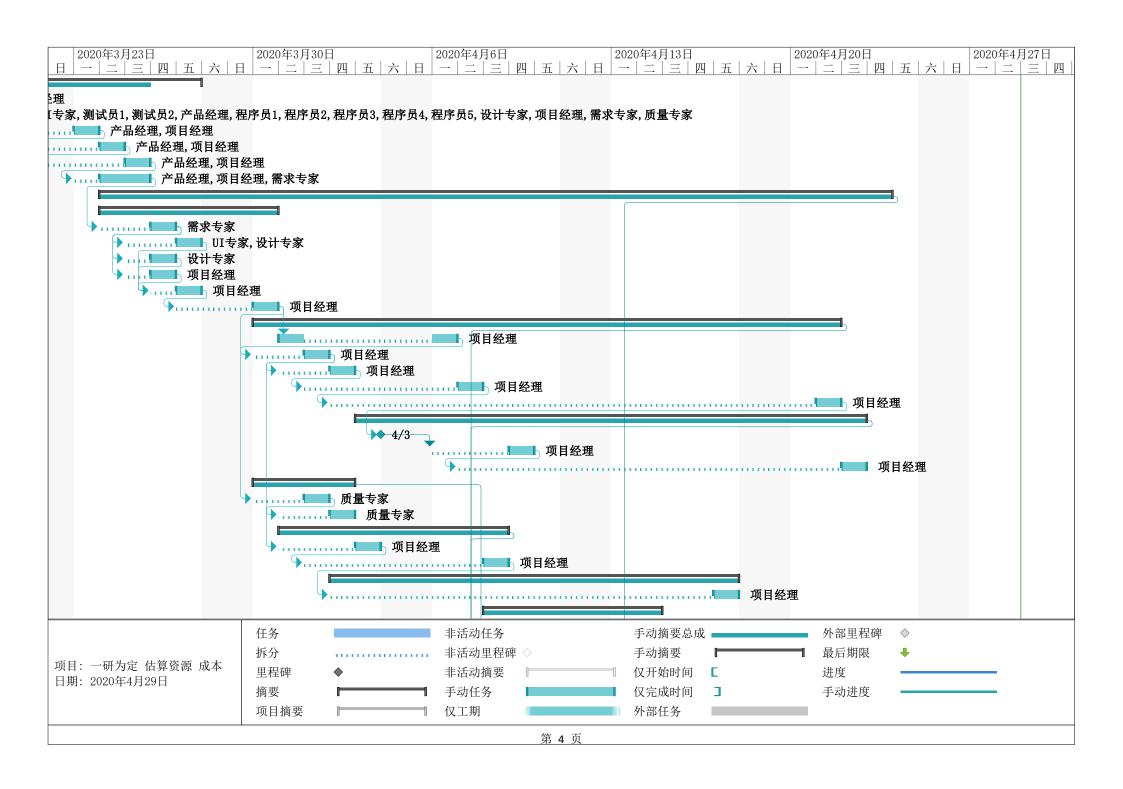

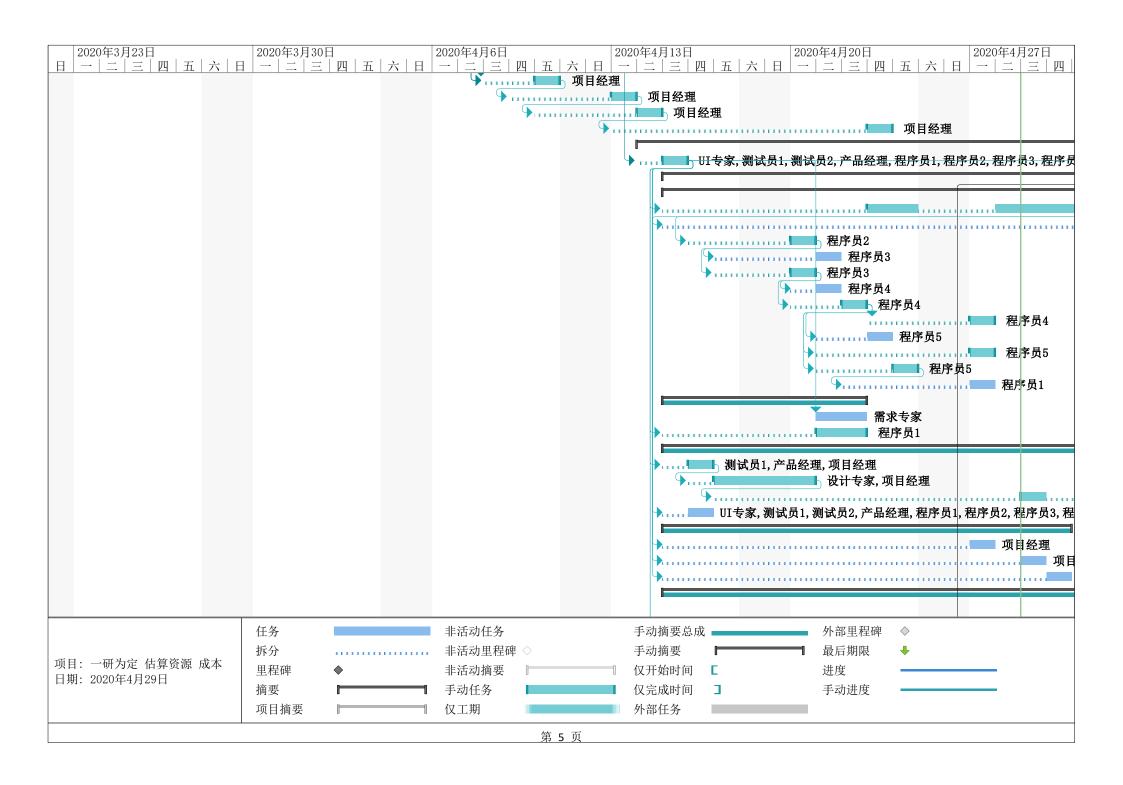



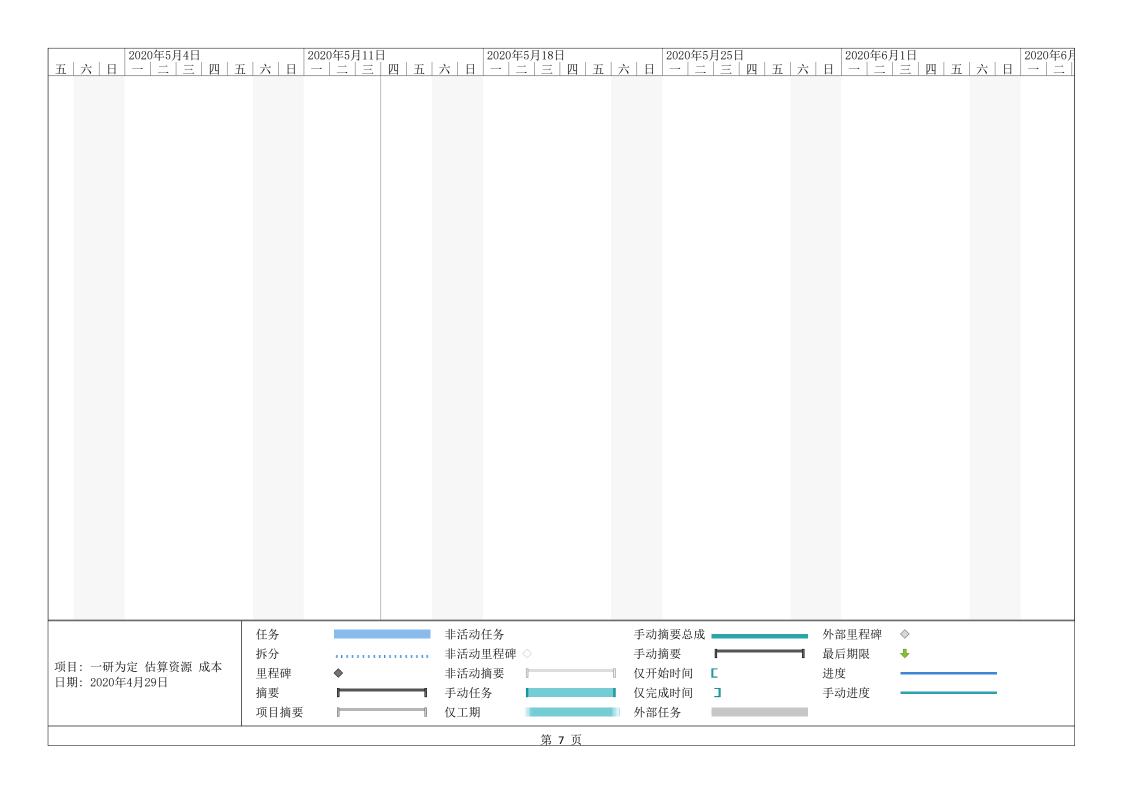

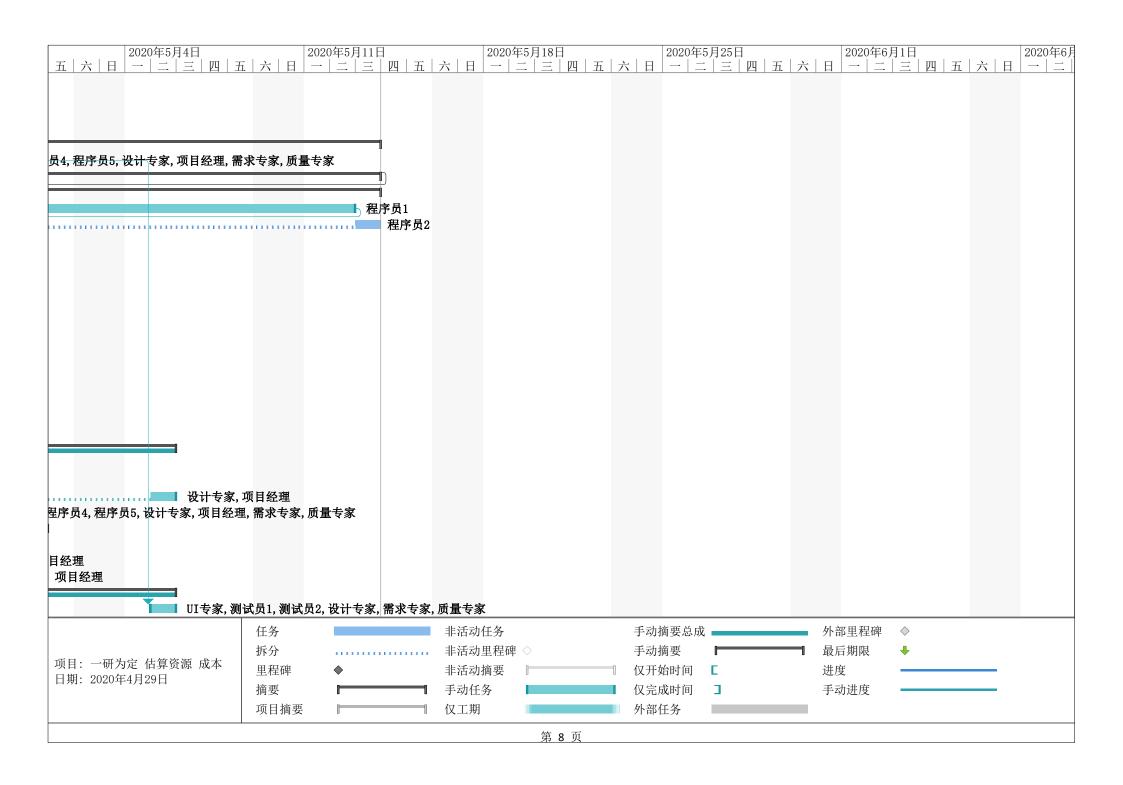

5员3,程序员5,设计专家,项目经理,得员3,程序员4,程序员5,设计专家,项 员3,程序员4,程序员5,设计专家,项 ,产品经理,设计专家,项目经理,需对	五 六 日 一 需求专家,质量专 目经理,需求专家 支专家,质量专家 、产品经理,设计	3,质量专家	六 日 一 <u>-</u> <u>-</u> - - - - - - - - -		2020年: 日	5月25日 . 三 四 五	六 日 一 二	月1日 三 四 五	六日	2020年6月 一 二
U	1 マ 多 , 税 ()	火口红壁,而 水:	マネ・川里 マネ						
	任务		非活动任务		手动摘要总成		■ 外部里程碑			
项目:一研为定 估算资源 成本 日期: 2020年4月29日	拆分 拆分 里程碑 摘要	•	非活动里程碑 非活动摘要 手动任务	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	手动摘要 仅开始时间 仅完成时间	C .	■ 最后期限 进度 手动进度	•		
	项目摘要		仅工期	第9页	外部任务		J -77,72.1X			
