


标识号	A	任务模式	任务名称	工期	开始时间 完成时间	前置任务	资源名称	成本	3月16日 三 四 五 フ
1	<u>~</u>	*	启动	6 个工作日	2020年3月192020年3月2	E		¥9, 320. 00	
2	V	*	任命项目经理		2020年3月192020年3月19		产品经理	¥800.00	产
3	√	*	组建核心团队		2020年3月192020年3月19		UI专家,测试员1,测试员2,		UI-
4	✓	*	制定里程碑计划	1 个工作日	2020年3月192020年3月19	9	产品经理,项目经理	¥1, 120.00	产,
5	✓	*	分析干系人	1 个工作日	2020年3月192020年3月19	9	产品经理,项目经理	¥1, 120.00	j e ,
6	✓	*	制定项目章程	1 个工作日	2020年3月202020年3月20	2, 3, 4, 5	产品经理,项目经理	¥1, 120.00	
7	✓	*	项目启动大会	1 个工作日	2020年3月232020年3月23	36	产品经理,项目经理,需求专	¥1, 360.00	
8	✓	*	规划		2020年3月242020年4月1			¥6, 880. 00	
9	✓	*	规划范围	4 个工作日	2020年3月242020年3月2	7		¥1, 920. 00	
10	\checkmark	*	制定需求说明书	1 个工作日	2020年3月242020年3月24	17	需求专家	¥240.00	
11	✓	*	界面设计	1 个工作日	2020年3月252020年3月25	510	UI专家,设计专家	¥480.00	
12	\checkmark	*	详细设计说明书		2020年3月252020年3月25		设计专家	¥240.00	
13	✓	*	范围说明书		2020年3月252020年3月25		项目经理	¥320.00	
	✓	*	创建WBS		2020年3月262020年3月26		项目经理	¥320.00	
15	\checkmark	*	形成范围基准		2020年3月272020年3月27		项目经理	¥320.00	
16	\checkmark	4	规划时间		2020年3月282020年4月2			¥1,600.00	
17	\checkmark	*	排列工作包顺序		2020年3月282020年3月28		项目经理	¥320.00	
18	\checkmark	*	估算资源		2020年3月302020年3月30		项目经理	¥320.00	
	\checkmark	*	估算持续时间		2020年3月312020年3月3		项目经理	¥320.00	
20	\checkmark	*	制定进度计划		2020年4月1[2020年4月1		项目经理	¥320.00	
21	\checkmark	*	形成进度基准		2020年4月2[2020年4月2		项目经理	¥320.00	
	✓	*	规划成本		2020年4月3 2020年4月7			¥640.00	
23	\checkmark	*	项目成本估算		2020年4月3[2020年4月3		项目经理	¥0.00	
24	\checkmark	*	项目预算		2020年4月6[2020年4月6		项目经理	¥320.00	
25	\checkmark	*	形成范围基准		2020年4月7[2020年4月7		项目经理	¥320.00	
26	√	*	规划质量		2020年3月3(2020年3月3			¥480.00	
27	✓	*	制定测试计划		2020年3月302020年3月30		质量专家	¥240.00	
28	√	*	制定测试用例		2020年3月312020年3月3		质量专家	¥240.00	
29	√	*	规划人力资源		2020年3月312020年4月1			¥640.00	
30	✓	*	制定人力资源计划		2020年3月312020年3月3		项目经理	¥320.00	
31	\checkmark	*			2020年4月1 2020年4月1		项目经理	¥320.00	
32	\checkmark	*	规划沟通		2020年4月2 2020年4月2			¥320.00	
33	\checkmark	*	制定沟通管理计划		2020年4月2[2020年4月2		项目经理	¥320.00	
34	\checkmark	*	规划风险	4 个工作日	2020年4月8 2020年4月1	<u> </u>		¥960.00	
			任务		非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑	\Diamond	
					非活动里程碑 ◇	手动摘要	最后期限	•	
项目:	3.1-	一研为定WBS						▼	
		年4月7日	里程碑 ◆		非活动摘要	1 仅开始时间	进度		
		. ,	摘要		手动任务	■ 仅完成时间	手动进度		
			项目摘要 🖳		仅工期	外部任务			

示识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	J	成本		3月16日 三 四 五
35	$\overline{\checkmark}$	*	识别风险	1 个工作日	2020年4月	8 2020年4月	8[16, 22, 26	, 29 项目经理			¥320.00	
36	√	*	风险分析			9[2020年4月		项目经理			¥320.00	
37	√	*	制定风险登记册			102020年4月		项目经理			¥320.00	
38	√	*	规划整合	1 个工作日	2020年4月	132020年4月	1337	项目经理			¥320.00	
39	√	*	执行与监控	1 个工作日	2020年4月	142020年4月	14				¥27, 520. 00	
40	✓	*	组建项目团队	1 个工作日	2020年4月	142020年4月	148	UI专家,测试员	1,测试员2,		¥3,800.00	
41	✓	*	项目执行	6 个工作日	2020年4月	152020年4月	22				¥4, 480. 00	
42	✓	*	用户模块			152020年4月					¥3, 360. 00	
43	✓	*	注册登录			152020年4月		程序员1			¥280.00	
44	✓_	*	浏览院校专业			162020年4月		程序员2			¥280.00	
45	✓_	*	查询院校专业			162020年4月		程序员2			¥280.00	
46	✓_	*	发表文章			172020年4月		程序员3			¥280.00	
47	✓	*	回复文章			172020年4月		程序员3			¥280.00	
48	✓_	*	每日打卡			2020年4月		程序员4			¥280.00	
49	√	*	添加学习任务			202020年4月		程序员4			¥280.00	
50	√	*	考研自习室			212020年4月		程序员5			¥280.00	
51	√	*	考研真题资料			212020年4月		程序员5			¥280.00	
52	√	*	考研网课			212020年4月		程序员5			¥280.00	
53	√	*	考研答疑			212020年4月		程序员5			¥280.00	
54	√	*	个人中心			222020年4月		程序员1			¥280.00	
55	✓	*	管理员模块			152020年4月					¥1, 120. 00	
56	✓	*	数据分析			152020年4月		程序员1			¥560.00	
57	✓	*	信息资料收集			152020年4月		程序员1			¥560.00	
58	✓	*	项目监控			152020年4月					¥6, 200. 00	
59	√	*	各项指标监控			152020年4月		测试员1,产品组			¥1, 280.00	
60	√	*	监控评审			162020年4月		设计专家,项目			¥560.00	
61	√	*	变更评审			172020年4月		设计专家,项目			¥560.00	
62	√	*	例会			152020年4月		UI专家,测试员	1, 测试员2,		¥3, 800.00	
63	√_	*	管理干系人			152020年4月					¥960.00	
64	✓_	*	发布项目信息			152020年4月		项目经理			¥320.00	
65	✓_	*	报告监控指标			152020年4月		项目经理			¥320.00	
	✓_	*	干系人沟通			152020年4月		项目经理			¥320.00	
67	√	*	团队建设			152020年4月					¥10, 000. 00	
68	<u> </u>	*	培训	1 个工作日		152020年4月		UI专家,测试员			¥2, 680. 00	
			任务		非活动任务			j要总成	7	\Diamond		
番目	0 1	TT4产wpc	拆分		非活动里程码	俾 ◇	手动摘	i要 length in the second in th	最后期限	•		
		一研为定WBS	里程碑	♦	非活动摘要		1 仅开始	时间	进度			
口期:	2020	年4月7日	摘要	<u> </u>	手动任务		仅完成	时间]	手动进度			
			项目摘要		仅工期		外部任					
						第 2 页						

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本		3月16日
U)									三 四 五 フ
69 🗸	*	娱乐活动	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月	1540	UI专家,测试员1,测试	员2,	¥3, 520.00	
70 🗸	*	沟通	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月	1540	UI专家,测试员1,测试	员2,	¥3,800.00	
71 🗸	*	项目验收	1 个工作日	2020年4月27	2020年4月	2741	UI专家,产品经理,设计	十专家	¥2,080.00	
72 🗸	*	收尾	1 个工作日	2020年4月28	2020年4月	28			¥4, 320. 00	
73	*	项目终检	1 个工作日	2020年4月28	2020年4月	2871	UI专家,产品经理,设计	十专家	¥2,080.00	
74 🗸	*	项目内部收尾	1 个工作日	2020年4月28	2020年4月	2871	UI专家,测试员1,产品	经理	¥2, 240.00	



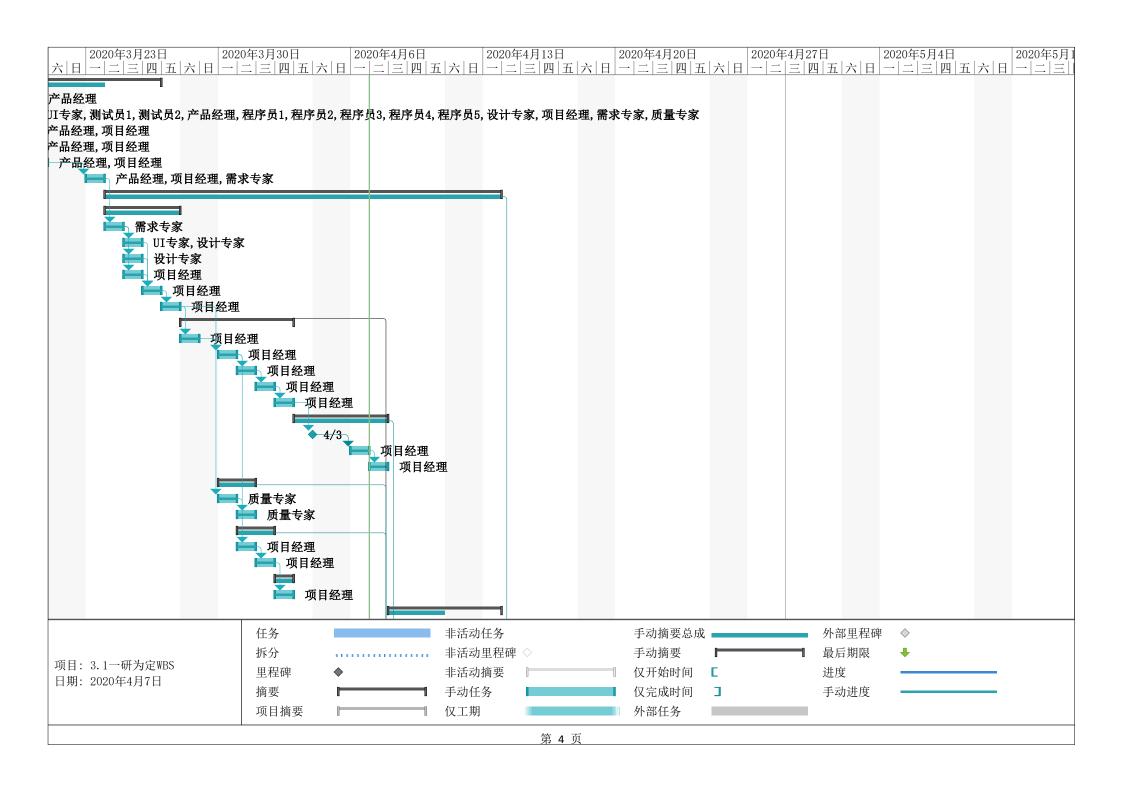

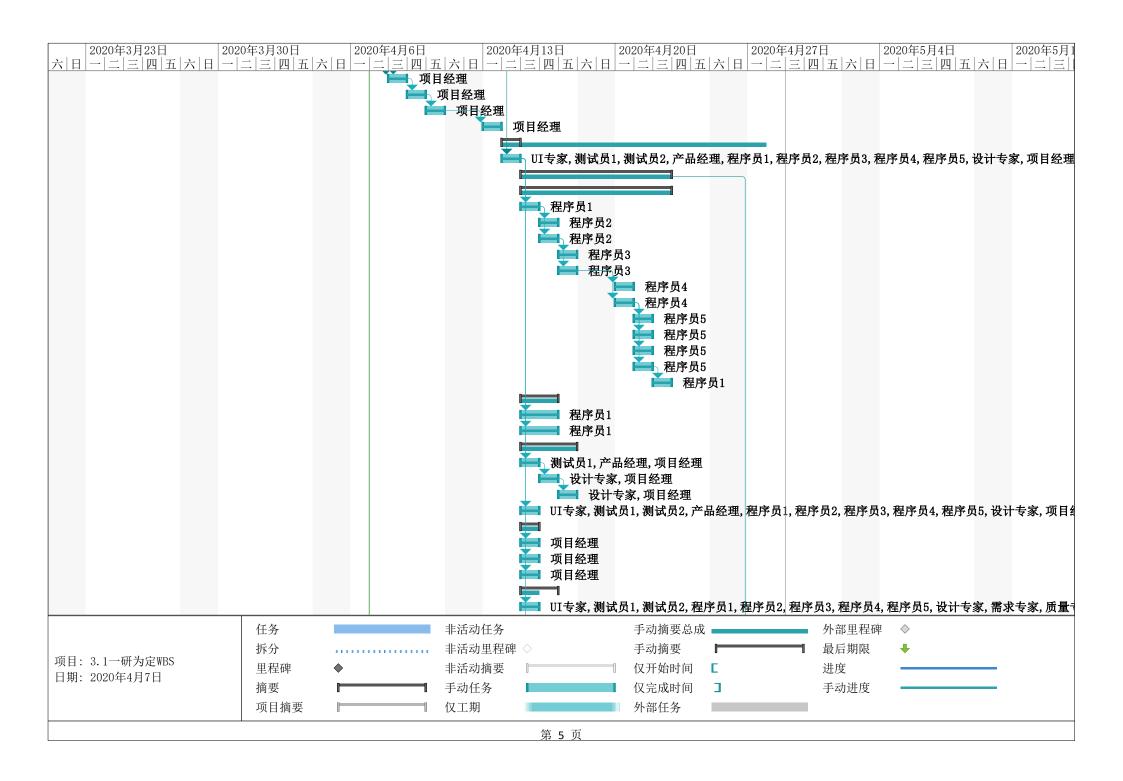

2020年3月23日 六 日 - 二 三 四 五 六 日	2020年3月30日	2020年4月6日	2020年4月	13日 20	020年4月20日	20	020年4月27	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$	020年5月4日	2020年5月1
	<u> </u>			四 五 八 □ □ UI专家,测试员		品经理,程	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _	<u> </u>		_// □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
				UI专家,测试员	1,测试员2,产	品经理,程	序员1,程序	员2,程序员3,	程序员4,程序员	5,设计专家,项目组
							UI专家,	产品经理,设	计专家,项目经理	1,需求专家,质量专
							₩	宏 产品必押	设计专家 而日	经理,需求专家,质
										完建, 而水 ₹家, ∭ ₹家, 项目经理, 需求
										,
	任务		非活动任务		手动摘要总成	ž		外部里程碑	\Diamond	
	拆分		非活动里程碑 ◇		手动摘要			最后期限	•	
项目: 3.1一研为定WBS	里程碑	♦	非活动摘要		仅开始时间	Е		进度		
日期: 2020年4月7日	摘要		手动任务		仅完成时间	3		手动进度		
	项目摘要		仅工期		外部任务					
				第 6 页						
