

标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	3月1	6日   2020 四   五   六   日   一   :
1	~	*	启动	4 个丁作日	2020年3月	192020年3月2	24		¥10.	280. 00	<u> </u>
2	<b>V</b>	<b>*</b>	任命项目经理			192020年3月1		产品经理		800.00	产品经理
3	<b>√</b>	<b>→</b>	组建核心团队			192020年3月1		UI专家,测试员1		800.00	UI专家,测试员
4	<b>√</b>	*	制定里程碑计划			192020年3月1		产品经理,项目组		120.00	产品经理,项目
5	<b>√</b>	<u>→</u>	分析干系人			192020年3月1		产品经理,项目组	¥1,	120.00	产品经理,项目
6	<b>√</b>	*	制定项目章程			202020年3月2		产品经理,项目组	¥1,	120.00	产品经理,1
7	<b>√</b>	*	项目启动大会			232020年3月2		产品经理,项目组	¥2,	320.00	
8	<b>√</b>	*	规划			242020年4月1		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		<mark>200. 00</mark>	
9	<b>√</b>	*	规划范围			242020年3月2				920.00	
10	<b>√</b>	*	制定需求说明书			242020年3月2		需求专家		240.00	<b>→</b>
11	<b>√</b>	*	界面设计			252020年3月2		UI专家,设计专家		480.00	
12	<b>√</b>	*	详细设计说明书			252020年3月2		设计专家		240.00	
13	<b>√</b>	*	范围说明书			252020年3月2		项目经理		320 <b>.</b> 00	
14	<b>√</b>	*	创建WBS	1 个工作日	2020年3月	262020年3月2	2611, 12, 13	项目经理		320 <b>.</b> 00	
15	<b>√</b>	*	形成范围基准	1 个工作日	2020年3月	272020年3月2	2714	项目经理	¥	320.00	
16	<b>√</b>	*	规划时间			282020年4月2			¥1,	920.00	
17	<b>√</b>	-	排列工作包顺序			282020年4月2		项目经理	¥	640.00	
18	<b>√</b>	*	估算资源			302020年3月3		项目经理		320.00	
19	<b>√</b>	*	估算持续时间			312020年3月3		项目经理	¥	320.00	
20	<b>√</b>	*	制定进度计划			1 2020年4月1		项目经理	¥	320.00	
21	✓	*	形成进度基准			212020年4月2		项目经理	¥	320.00	
22	<b>√</b>	*	规划成本	3 个工作日	2020年4月	312020年4月7	7		¥	640. 00	
23	<b>√</b>	*	项目成本估算	0 个工作日	2020年4月	3 2020年4月3	3E21	项目经理		¥0.00	
24	✓	*	项目预算	1 个工作日	2020年4月	6   2020年4月6	i E 23	项目经理		320.00	
25	<b>√</b>	*	形成范围基准			7 [2020年4月7		项目经理		320.00	
26	✓	*	规划质量			302020年3月3			¥	480. 00	
27	✓	*	制定测试计划	1 个工作日	2020年3月	302020年3月3	3015	质量专家	¥	240.00	
28	✓	*	制定测试用例	1 个工作日	2020年3月	312020年3月3	3127	质量专家	¥	240.00	
29	✓	*	规划人力资源	2 个工作日	2020年3月	312020年4月1			¥	640. 00	
30	✓	*	制定人力资源计划	1 个工作日	2020年3月	312020年3月3	3118	项目经理		320.00	
31	✓	*	制定人员配备管理计划			1[2020年4月1		项目经理	¥	320.00	
32	✓	*	规划沟通			2 2020年4月2			¥	320. 00	
33	✓	*	制定沟通管理计划			212020年4月2		项目经理	¥	320.00	
34	$\checkmark$	*	规划风险	4 个工作日	2020年4月	8   2020年4月	[3		¥	960.00	
			任务		非活动任务		手动摘要总成	ì	外部里程碑	<b>♦</b>	
			拆分		非活动里程码	車 ◇	手动摘要		最后期限	<b>+</b>	
项目:	一研为	7定	里程碑 ◆		非活动摘要		<b>Q开始时间</b>	Ε	进度		
日期:	2020年	三4月7日				И					<del></del>
			摘要		手动任务		仅完成时间	3	手动进度		
			项目摘要		仅工期		外部任务				
			1			第 1 页					

标识号	Ð	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	3月	16日   四   五   六	2020
35	V	<b>*</b>	识别风险	1 个丁作日	2020年4月	8F2020年4月8	F16, 22, 26, 29	项目经理		¥320.00	F3   TT   \ \	\
36	1	-	风险分析			912020年4月9		项目经理		¥320.00		
37	1	-	制定风险登记册			102020年4月1		项目经理		¥320.00		
38	1	-	规划整合			132020年4月1		项目经理		¥320.00		
39	1		执行与监控			142020年4月2		- MAZIZ		520.00		
40	1	<b>→</b>	组建项目团队			142020年4月1		UI专家,测试员1		,800.00		
41	1	<b>→</b>	项目执行			152020年4月2		( 3.5 ( 0.7 ( ) ) ( )		480.00		
42	<b>V</b>	*	用户模块			152020年4月2				360.00		
43	<b>V</b>	*	注册登录			152020年4月1		程序员1		¥280.00		
44	<b>V</b>	*	浏览院校专业			152020年4月1		程序员2		¥280.00		
45	<b>√</b>	*	查询院校专业			162020年4月1		程序员2		¥280.00		
46	<b>√</b>	*	发表文章			172020年4月1		程序员3		¥280.00		
47	✓	*	回复文章	1 个工作日	2020年4月	172020年4月1	745	程序员3		¥280.00		
48	✓	*	每日打卡	1 个工作日	2020年4月	202020年4月2	047	程序员4		¥280.00		
49	✓	*	添加学习任务	1 个工作日	2020年4月	202020年4月2	047	程序员4		¥280.00		
50	✓	*	考研自习室	1 个工作日	2020年4月	212020年4月2	149	程序员5		¥280.00		
51	✓	*	考研真题资料	1 个工作日	2020年4月	212020年4月2	149	程序员5		¥280.00		
52	✓	*	考研网课	1 个工作日	2020年4月	212020年4月2	149	程序员5		¥280.00		
53	✓	*	考研答疑	1 个工作日	2020年4月	212020年4月2	149	程序员5		¥280.00		
54	✓	*	个人中心	1 个工作日	2020年4月	222020年4月2	253	程序员1		¥280.00		
55	✓	*	管理员模块	2 个工作日	2020年4月	152020年4月1	$\epsilon$		¥1	, 120. 00		
56	✓	*	数据分析	2 个工作日	2020年4月	152020年4月1	640	程序员1		¥560.00		
57	✓	*	信息资料收集	2 个工作日	2020年4月	152020年4月1	640	程序员1		¥560.00		
58	✓	*	项目监控	3 个工作日	2020年4月	152020年4月1	7		¥6	, 200. 00		
59	✓	*	各项指标监控	1 个工作日	2020年4月	152020年4月1	540	测试员1,产品经	¥1	, 280. 00		
60	$\checkmark$	*	监控评审	1 个工作日	2020年4月	162020年4月1	6 5 9	设计专家,项目组		¥560.00		
61	$\checkmark$	*	变更评审	1 个工作日	2020年4月	172020年4月1	760	设计专家,项目组		¥560.00		
62	$\checkmark$	*	例会			152020年4月1		UI专家,测试员1	¥3	, 800. 00		
63	$\checkmark$	*	管理干系人			152020年4月1				¥960. 00		
64	$\checkmark$	*	发布项目信息			152020年4月1		项目经理		¥320.00		
65	$\checkmark$	*	报告监控指标			152020年4月1		项目经理		¥320.00		
66	$\checkmark$	*	干系人沟通			152020年4月1		项目经理		¥320.00		
67	$\checkmark$	*	团队建设			152020年4月1				,000.00		
68	$\checkmark$	*	培训	1 个工作日	2020年4月	152020年4月1	540	UI专家,测试员1	¥2	, 680. 00		
			任务		非活动任务		手动摘要总质	戏	外部里程碑	$\Diamond$		
			拆分		非活动里程码	卑 ◇	手动摘要		最后期限	•		
项目:			里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要		1 仅开始时间	С	进度			
日期:	202	0年4月7日		·		u						
			摘要	1	手动任务		<b>仅完成时间</b>	3	手动进度			
			项目摘要		仅工期		外部任务					
	第 2 页											

标识号	^	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	3月16日 2020
	U									三 四 五 六 日 一 :
69	<b>√</b>	*	娱乐活动	1 个工作日	2020年4月1	52020年4月	1540	UI专家,测试员1	¥3, 520. 00	<mark>)</mark>
70	$\checkmark$	*	沟通	1 个工作日	2020年4月1	52020年4月	1540	UI专家,测试员1	¥3, 800.00	)
71	<b>√</b>	*	项目验收	1 个工作日	2020年4月2	72020年4月	2741	UI专家,产品经理	¥2, 080. 00	<mark>)</mark>
72	✓	*	收尾	1 个工作日	2020年4月2	82020年4月	28		¥4, 320. 00	
73	✓	*	项目终检	1 个工作日	2020年4月2	82020年4月	2871	UI专家,产品经理	¥2, 080. 00	
74	<b>√</b>	*	项目内部收尾	1 个工作日	2020年4月2	82020年4月	2871	UI专家,测试员1	¥2, 240. 00	





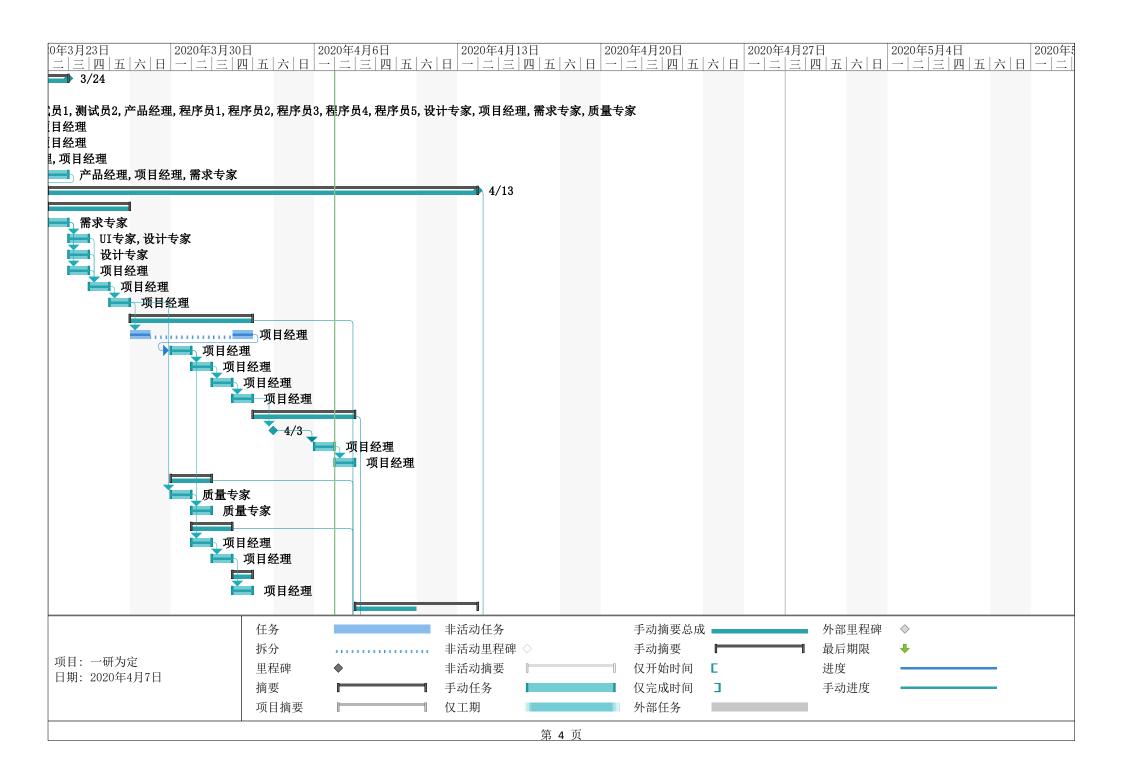

0年3月23日   2	2020年3月30日	2020年4月6日	2020年4月13日 2020	0年4月20日 2020年4月27	7日 2020年5月4日 2020年5
二 三 四 五 六 日	一 二 三 四 五 六 日	- 二 三 四 五 六	日   一   二   三   四   五   六   日   一	二 三 四 五 六 日 - 二 三	四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二
					2, 程序员3, 程序员5, 设计专家, 项目经理, 需求专家 2, 程序员3, 程序员4, 程序员5, 设计专家, 项目经理
			01 7 3N, 100 M, 10, 1		,产品经理,设计专家,项目经理,需求专家,质量专
				4/2	28
					专家, 产品经理, 设计专家, 项目经理, 需求专家, 质量
				UI	专家, 测试员1, 产品经理, 设计专家, 项目经理, 需求
	IT D		北江马打及	<b>工力按照节片</b>	N 対 H 和 和
	任务		非活动任务	手动摘要总成 ——————————	外部里程碑  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
   项目: 一研为定	拆分 里程碑	<b>♦</b>	非活动里程碑 ◇ 非活动摘要 『	手动摘要 <b>一</b>	最后期限 <b>→</b> 进度 <b>————</b>
日期: 2020年4月7日	第二章 生性性 描要	<b>—</b>	手动任务 ■ ■ ■	仅完成时间 ]	手动进度 ————
	- ブラ ガラ		仅工期	外部任务	) A)YT/X
	次日洞女	и И		71 时	
			第 6 页		
