

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年3月23日									
								三	四	五	六	日	一	二	三	四	
1		启动	7 个工作日	2020年3月19	2020年3月27												
2		任命项目经理	1 个工作日	2020年3月19	2020年3月19		产品经理										
3		组建核心团队	1 个工作日	2020年3月19	2020年3月20		UI专家, 测试员1										
4		制定里程碑计划	1 个工作日	2020年3月19	2020年3月23		产品经理, 项目经理										
5		分析干系人	1 个工作日	2020年3月19	2020年3月24		产品经理, 项目经理										
6		制定项目章程	1 个工作日	2020年3月20	2020年3月25	2, 3, 4, 5	产品经理, 项目经理										
7		项目启动大会	2 个工作日	2020年3月23	2020年3月25	6	产品经理, 项目经理										
8		规划	23 个工作日	2020年3月24	2020年4月23												
9		规划范围	5 个工作日	2020年3月24	2020年3月30												
10		制定需求说明书	1 个工作日	2020年3月24	2020年3月26	7	需求专家										
11		界面设计	1 个工作日	2020年3月25	2020年3月27	10	UI专家, 设计专家										
12		详细设计说明书	1 个工作日	2020年3月25	2020年3月26	10	设计专家										
13		范围说明书	1 个工作日	2020年3月25	2020年3月26	10	项目经理										
14		创建WBS	1 个工作日	2020年3月26	2020年3月27	11, 12, 13	项目经理										
15		形成范围基准	1 个工作日	2020年3月27	2020年3月30	14	项目经理										
16		规划时间	17 个工作日	2020年3月30	2020年4月21												
17		排列工作包顺序	2 个工作日	2020年3月31	2020年4月6	15	项目经理										
18		估算资源	1 个工作日	2020年3月30	2020年4月1	17	项目经理										
19		估算持续时间	1 个工作日	2020年3月31	2020年4月2	18	项目经理										
20		制定进度计划	1 个工作日	2020年4月1	2020年4月7	19	项目经理										
21		形成进度基准	1 个工作日	2020年4月2	2020年4月21	20	项目经理										
22		规划成本	14 个工作日	2020年4月3	2020年4月22												
23	✓	项目成本估算	0 个工作日	2020年4月3	2020年4月3	21	项目经理										
24		项目预算	1 个工作日	2020年4月6	2020年4月9	23	项目经理										
25		形成范围基准	1 个工作日	2020年4月7	2020年4月22	24	项目经理										
26		规划质量	4 个工作日	2020年3月30	2020年4月21												
27		制定测试计划	1 个工作日	2020年3月30	2020年4月1	15	质量专家										
28		制定测试用例	1 个工作日	2020年3月31	2020年4月2	27	质量专家										
29		规划人力资源	7 个工作日	2020年3月31	2020年4月8												
30		制定人力资源计划	1 个工作日	2020年3月31	2020年4月3	18	项目经理										
31		制定人员配备管理计划	1 个工作日	2020年4月1	2020年4月8	30	项目经理										
32		规划沟通	12 个工作日	2020年4月2	2020年4月17												
33		制定沟通管理计划	1 个工作日	2020年4月2	2020年4月17	31	项目经理										
34		规划风险	5 个工作日	2020年4月8	2020年4月14												

项目：一研为定

日期：2020年4月8日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务



















外部里程碑








最后期限

进度

手动进度

<

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	16日	三	四	五	六	日	2020年3月23日	一	二	三	四
35		识别风险	1 个工作日	2020年4月8日	2020年4月10日	16, 22, 26, 29	项目经理											
36		风险分析	1 个工作日	2020年4月9日	2020年4月13日	35	项目经理											
37		制定风险登记册	1 个工作日	2020年4月10日	2020年4月14日	36	项目经理											
38		规划整合	1 个工作日	2020年4月13日	2020年4月23日	37	项目经理											
39		执行与监控	22 个工作日	2020年4月14日	2020年5月13日													
40		组建项目团队	1 个工作日	2020年4月14日	2020年4月15日	8	UI专家, 测试员1											
41		项目执行	21 个工作日	2020年4月15日	2020年5月13日													
42		用户模块	21 个工作日	2020年4月15日	2020年5月13日													
43		注册登录	13 个工作日	2020年4月15日	2020年5月12日	40	程序员1											
44		浏览院校专业	1 个工作日	2020年4月15日	2020年5月13日	43	程序员2											
45		查询院校专业	1 个工作日	2020年4月16日	2020年4月20日	43	程序员2											
46		发表文章	1 个工作日	2020年4月17日	2020年4月21日	45	程序员3											
47		回复文章	1 个工作日	2020年4月17日	2020年4月20日	45	程序员3											
48		每日打卡	1 个工作日	2020年4月20日	2020年4月21日	47	程序员4											
49		添加学习任务	1 个工作日	2020年4月20日	2020年4月22日	47	程序员4											
50		考研自习室	1 个工作日	2020年4月23日	2020年4月27日	49	程序员4											
51		考研真题资料	1 个工作日	2020年4月21日	2020年4月23日	49	程序员5											
52		考研网课	1 个工作日	2020年4月21日	2020年4月27日	49	程序员5											
53		考研答疑	1 个工作日	2020年4月21日	2020年4月24日	49	程序员5											
54		个人中心	1 个工作日	2020年4月22日	2020年4月27日	53	程序员1											
55		管理员模块	6 个工作日	2020年4月15日	2020年4月22日													
56		数据分析	2 个工作日	2020年4月21日	2020年4月22日	40	需求专家											
57		信息资料收集	2 个工作日	2020年4月15日	2020年4月22日	40	程序员1											
58		项目监控	15 个工作日	2020年4月15日	2020年5月5日													
59		各项指标监控	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月16日	40	测试员1, 产品经理											
60		监控评审	2 个工作日	2020年4月16日	2020年4月20日	59	设计专家, 项目经理											
61		变更评审	2 个工作日	2020年4月17日	2020年5月5日	60	设计专家, 项目经理											
62		例会	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月16日	40	UI专家, 测试员1											
63		管理干系人	12 个工作日	2020年4月15日	2020年4月30日													
64		发布项目信息	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月27日	40	项目经理											
65		报告监控指标	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月29日	40	项目经理											
66		干系人沟通	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月30日	40	项目经理											
67		团队建设	15 个工作日	2020年4月15日	2020年5月5日													
68		培训	1 个工作日	2020年5月5日	2020年5月5日	40	UI专家, 测试员1											
项目：一研为定 日期：2020年4月8日		任务		非活动任务	手动摘要		外部里程碑											
		拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限										
		里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度										
		摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度										
		项目摘要		仅工期		外部任务												
第 2 页																		

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	16日	三	四	五	六	日	2020年3月23日	一	二	三	四
69			娱乐活动	2 个工作日	2020年4月15	2020年4月17	40	UI专家, 测试员1											
70			沟通	2 个工作日	2020年4月15	2020年4月17	40	UI专家, 测试员1											
71			项目验收	1 个工作日	2020年4月27	2020年4月28	41	UI专家, 产品经理											
72			收尾	8 个工作日	2020年4月28	2020年5月7													
73			项目终检	1 个工作日	2020年4月28	2020年5月6	71	UI专家, 产品经理											
74			项目内部收尾	3 个工作日	2020年4月28	2020年5月7	71	UI专家, 测试员1											

项目：一研为定

日期：2020年4月8日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务

仅工期










手动摘要


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务













外部里程碑


最后期限


进度


手动进度











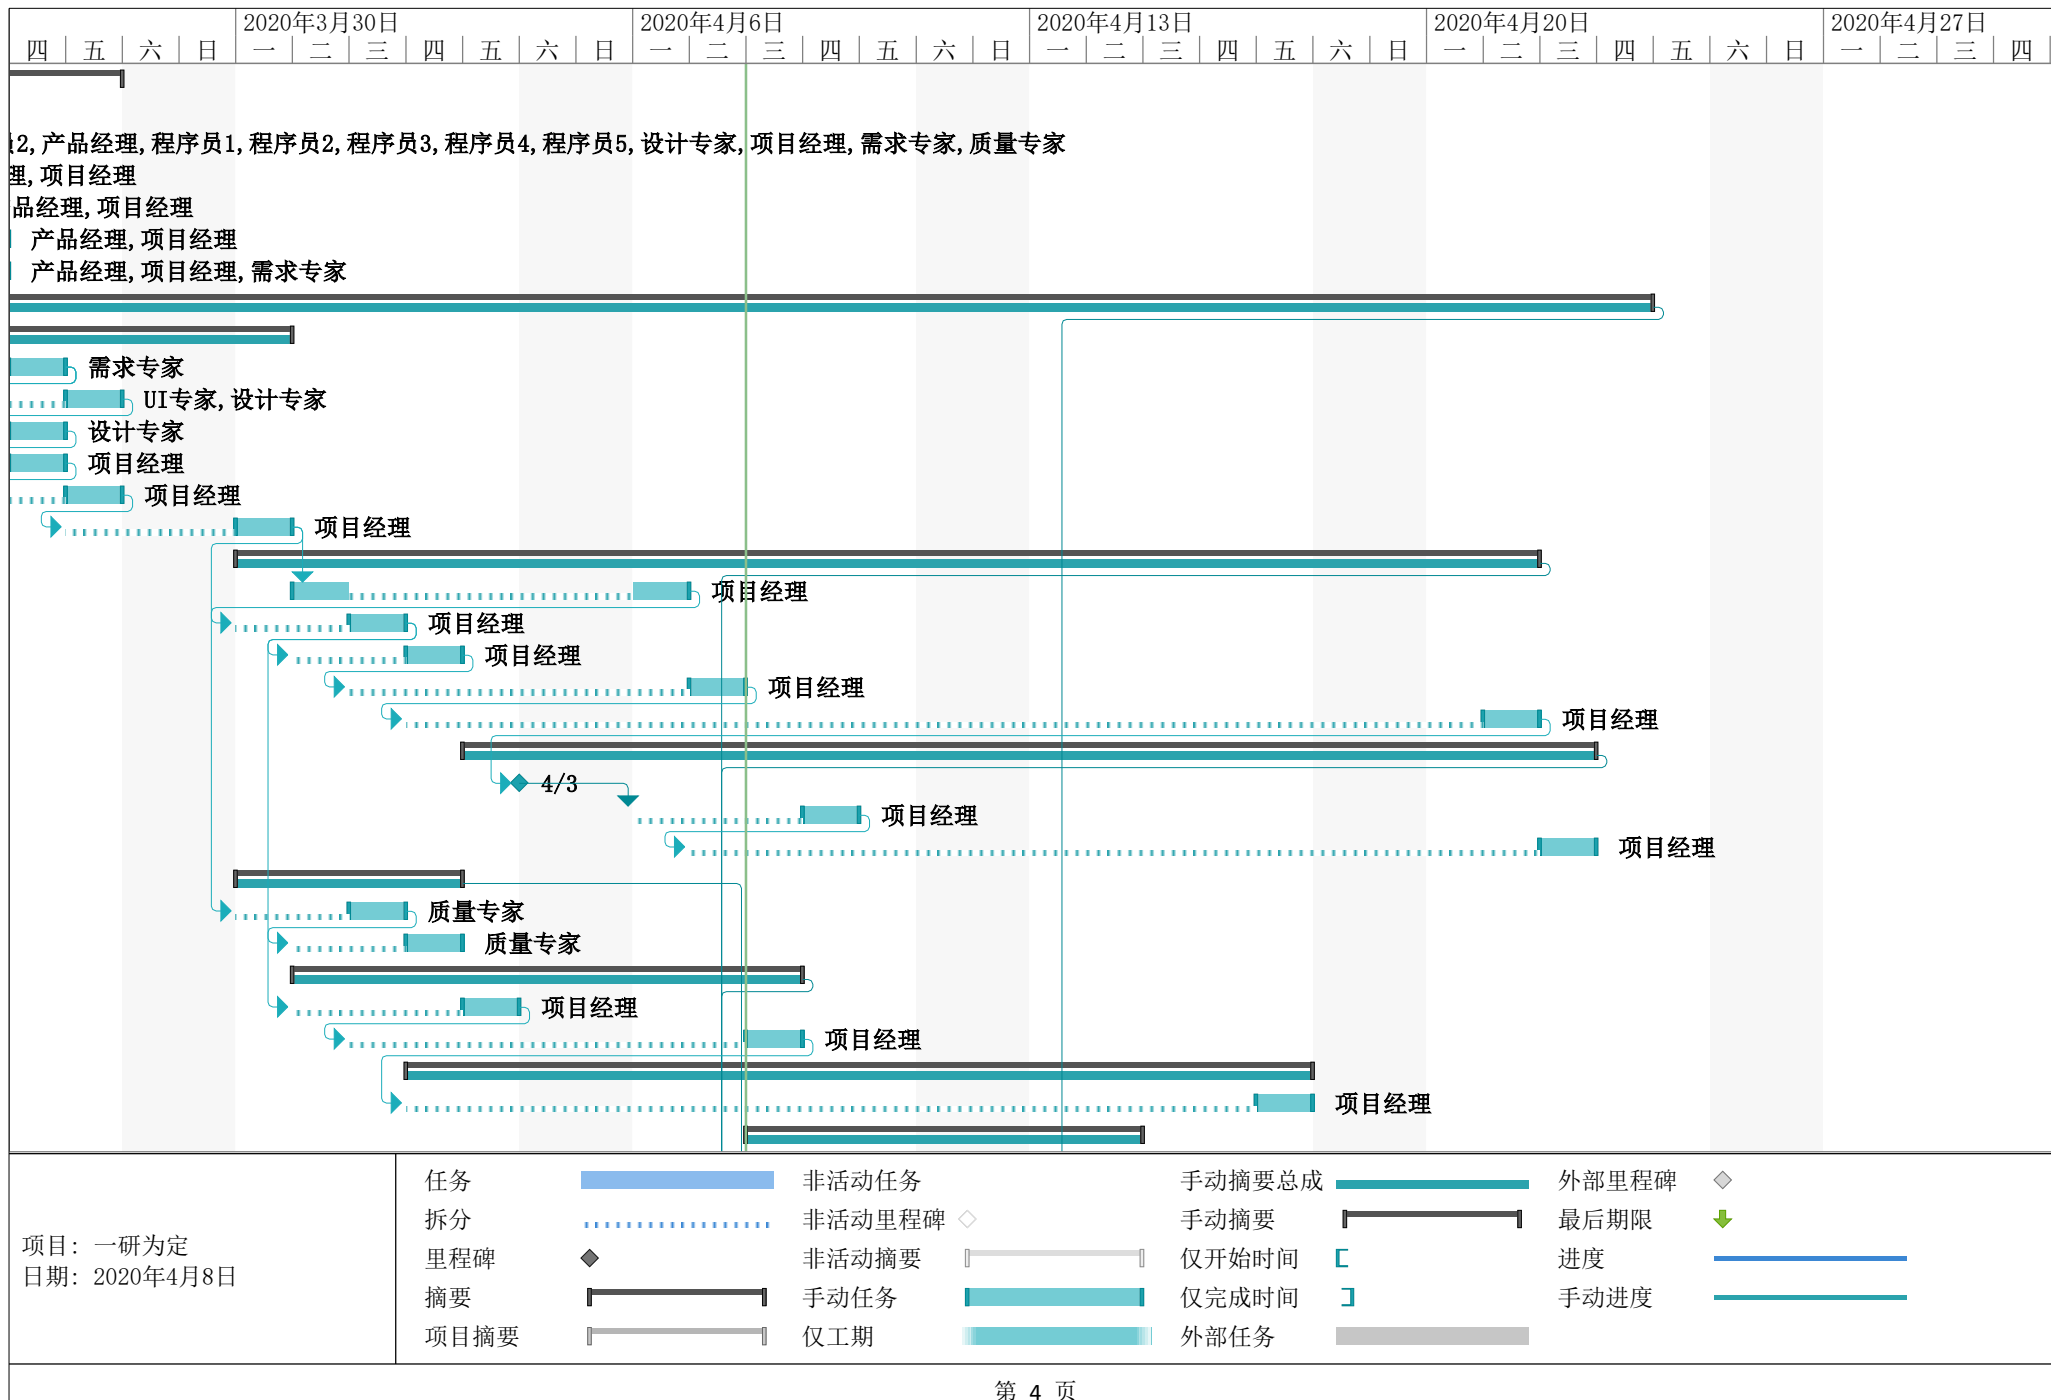


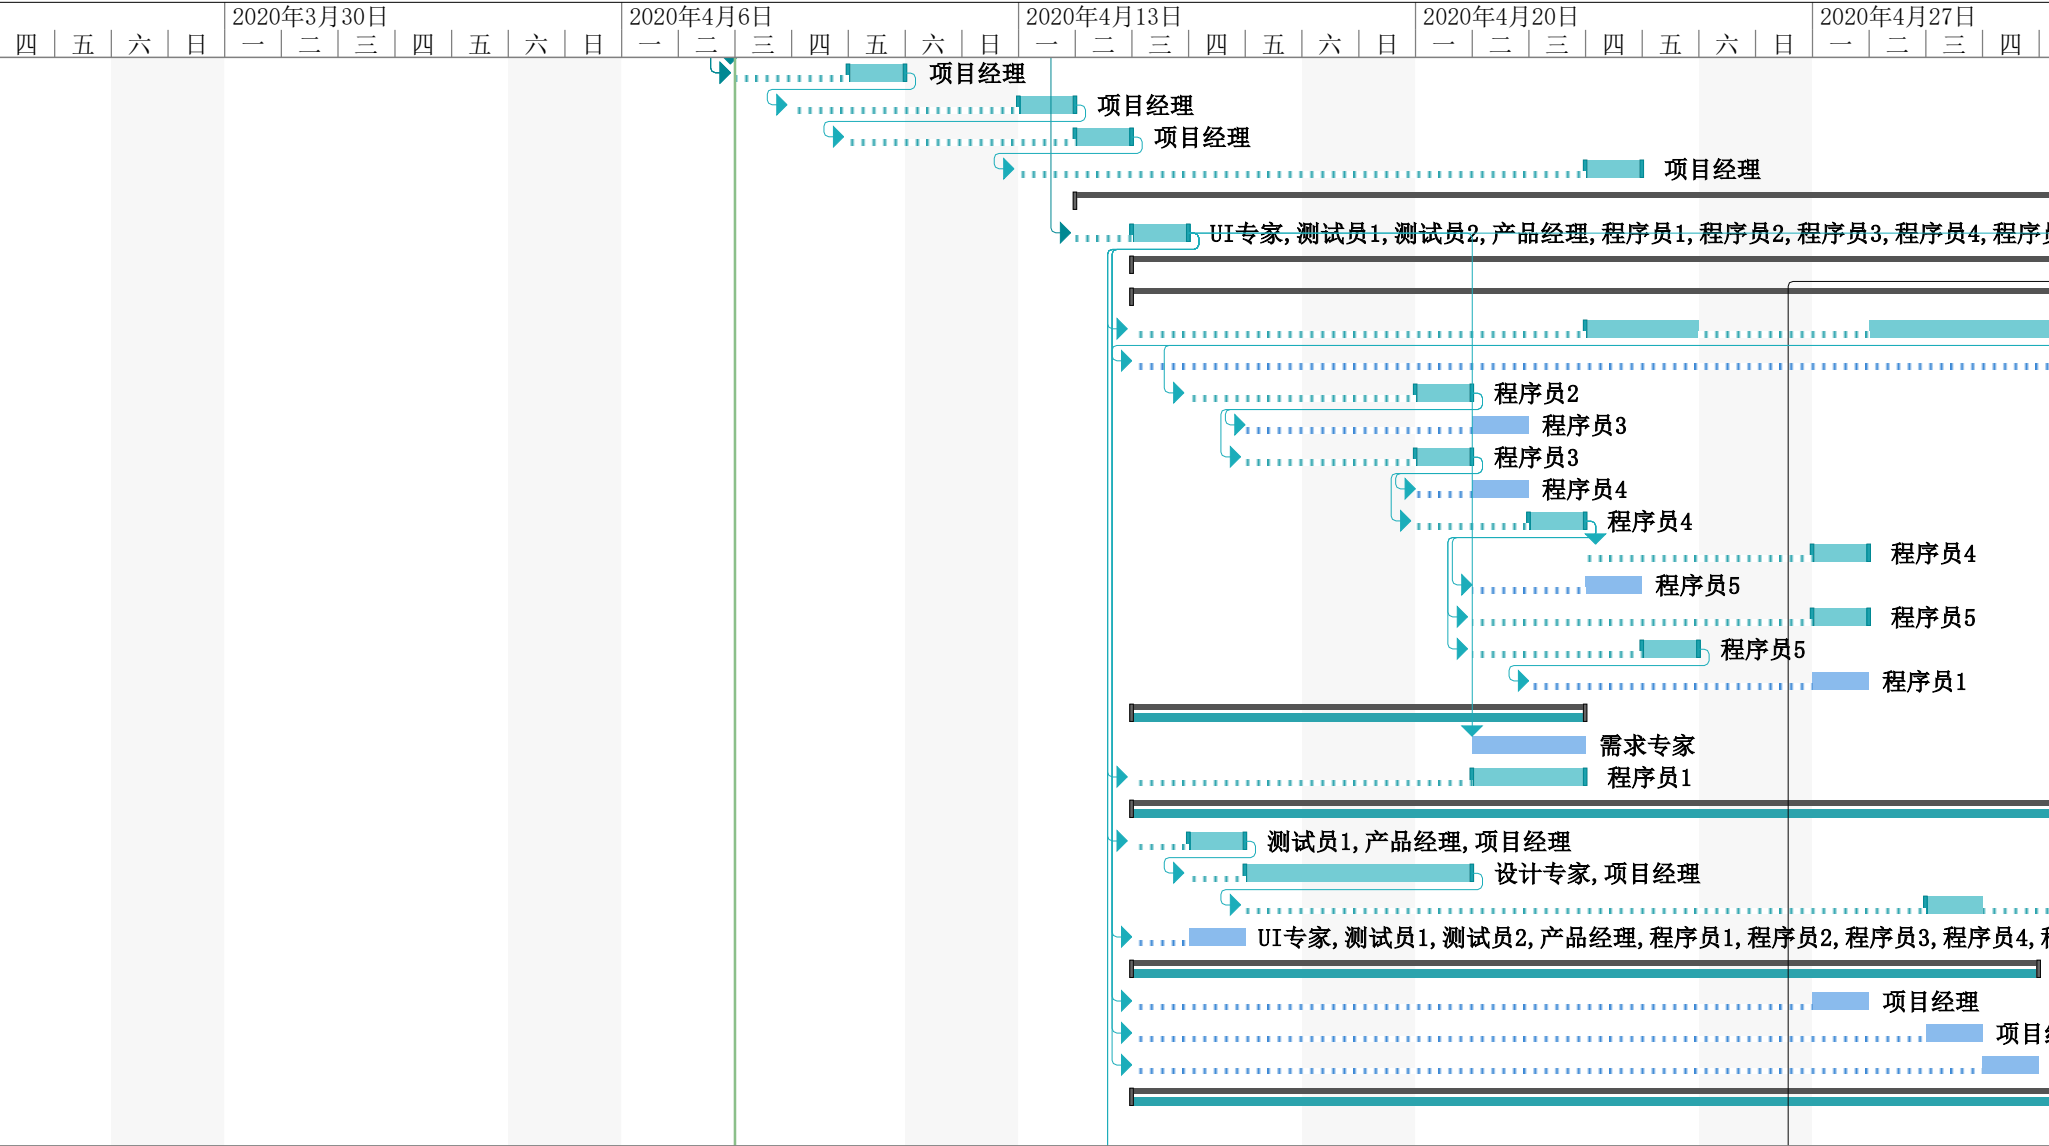


项目：一研为定 日期：2020年4月8日	任务		非活动任务	手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑	手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要	仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务	仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期	外部任务			

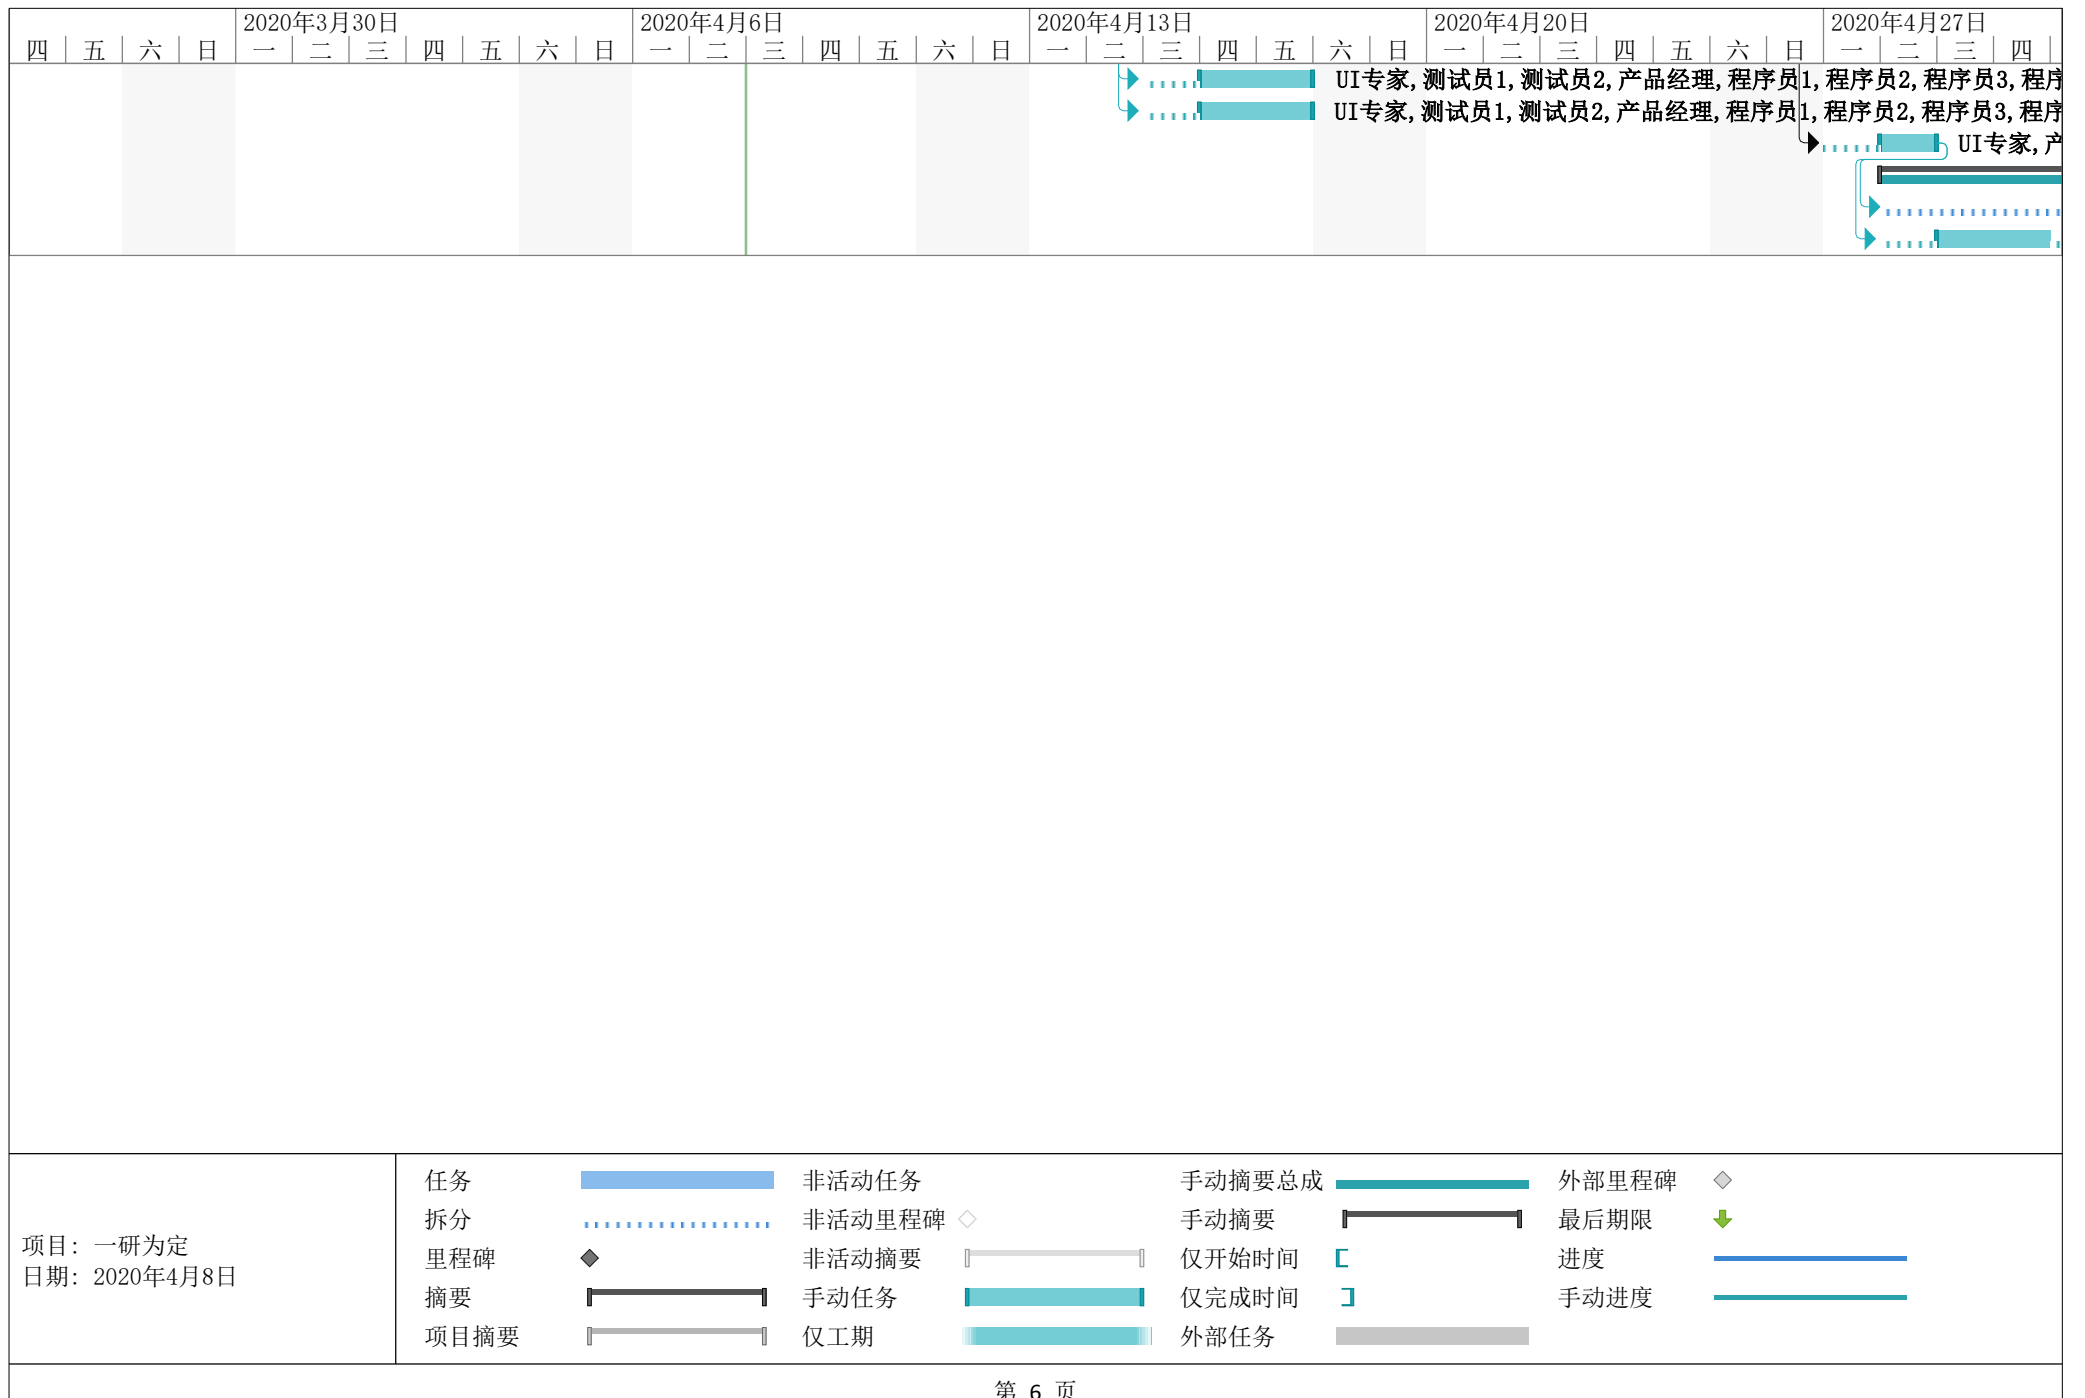

[illegible]

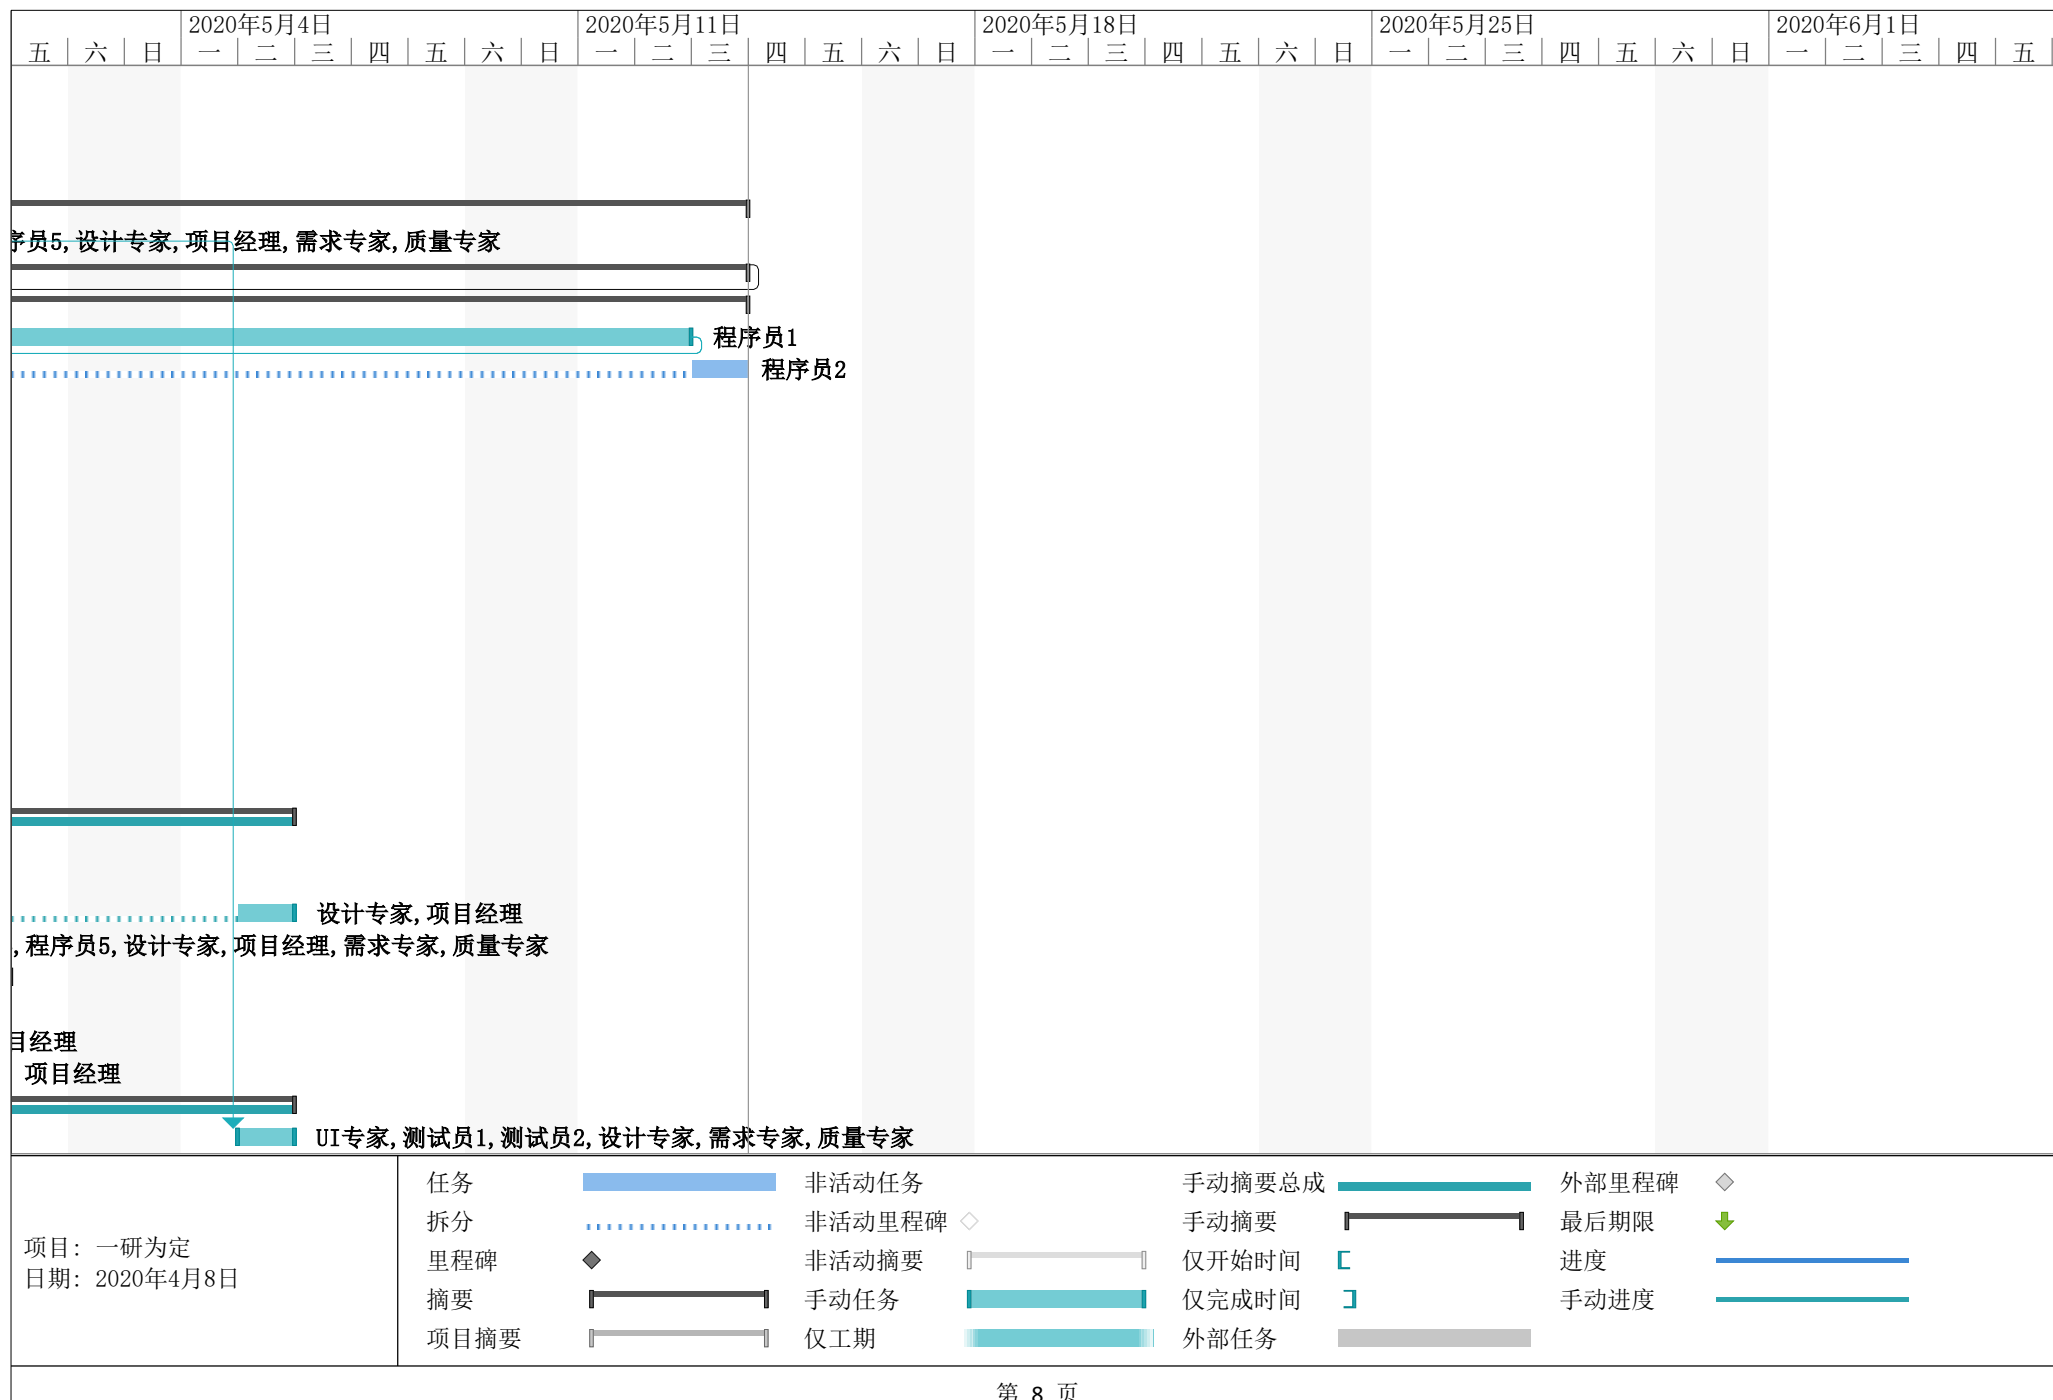





项目：一研为定  
日期：2020年4月8日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度
